




Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE EDUCACION		
Setor: EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Número da Operação: 2734/OC-PN	Atual: 70.000.000,00	Original BID: 70.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 70.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 88,00
Operação Relacionada: PN-T1083, RG-P1478	Saldo: 70.000.000,00	Cofinanciamento/País: 10.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 80.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 03-oct-2012 Validado pelo Representante do País: 05-oct-2012

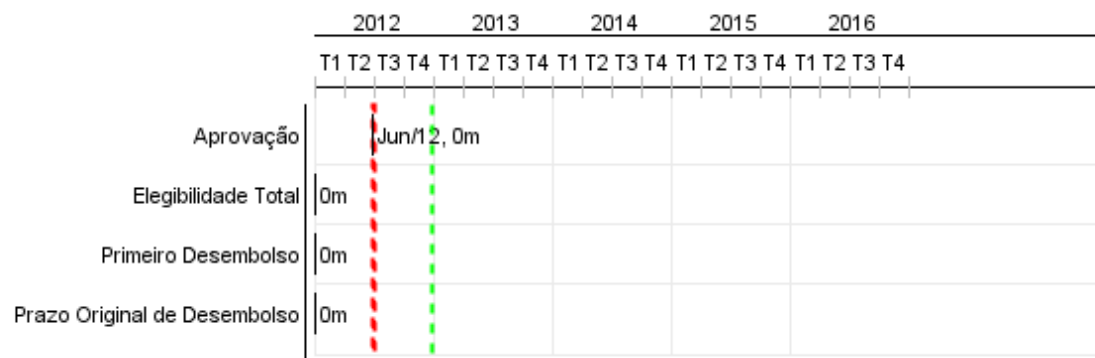

Progresso Acumulado até 2012

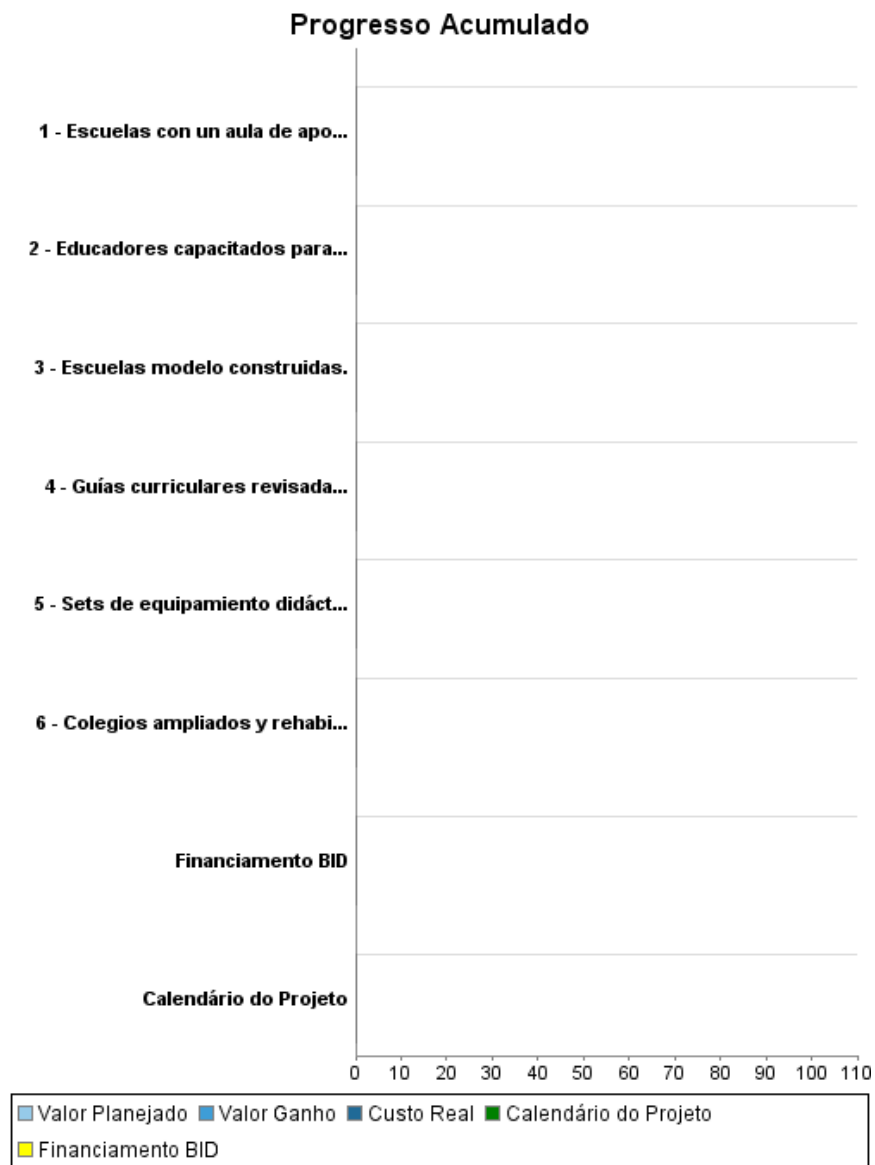

Resultados

Resultado: Melhoras y ampliación de los espacios escolares con infraestructura innovadora.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	2016	Final do Projeto
Alumnos beneficiados.	Estudiantes		2012	P A	36,000.00	2,000.00	38,000.00
Alumnos matriculados en las escuelas del proyecto.	Alumnos		2012	P A	8,000.00	2,000.00	10,000.00
Aulas de apoyo al aprendizaje en uso.	Aulas		2012	P A	45.00	47.00	47.00

Resultado: Creación de un ambiente escolar que fomente el uso de prácticas pedagógicas centradas en los estudiantes y participativas utilizando espacios escolares innovadores.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	2016	Final do Projeto
Escuelas utilizando el currículo basado en competencias	Escuelas		2012	P A	45.00	2.00	47.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Infraestrutura escolar inovadora									
Escuelas modelo construidas.	Escuelas				2,00				26.200.000,00
Colegios ampliados y rehabilitados.	Colegios				20,00				37.800.000,00
Escuelas con un aula de apoyo construida para atender las diferentes necesidades de aprendizaje .	Aulas				47,00				3.200.000,00
Componente 2: Actualización y validación curricular y de gestión escolar									
Guías curriculares revisadas y/o reformuladas de los niveles inicial, primario y medio.	Guías				25,00				3.512.700,00
Educadores capacitados para formar en las nuevas propuestas curriculares.	Docentes				574,00				3.305.040,00
Sets de equipamiento didáctico adquirido para uso de docentes y estudiantes.	Sets				110,00				3.182.260,00
Categoria 3: Administration									
Gastos administrativos	N/A								500.000,00
Categoria 4: Auditoria									
Desarrollo de Auditorías Anuales.	N/A								200.000,00
Categoria 5: Monitoreo									
Monitoreo.	N/A								75.000,00
Categoria 6: Imprevisto									
Imprevistos.	N/A								2.025.000,00
TOTAL									80.000.000,00
