





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION		
Secteur:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2734/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	70.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	
Opération(s) Connexe(s):	PN-T1083, RG-P1478	Solde:	70.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	70.000.000,00
		Courant BID:	70.000.000,00
		Pari Passu:	88,00
		Cofinancement/Pays:	10.000.000,00
		Estimation Initiale:	80.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 03-oct-2012 Validé par le Représentant: 05-oct-2012

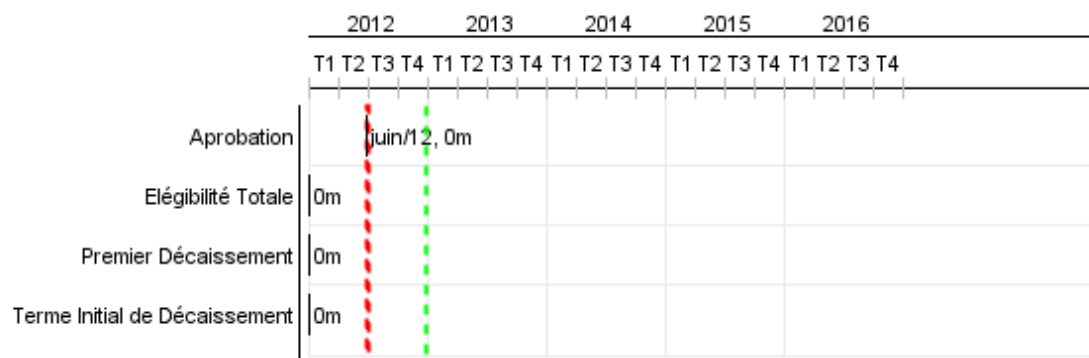

Progrès Cumulé à 2012

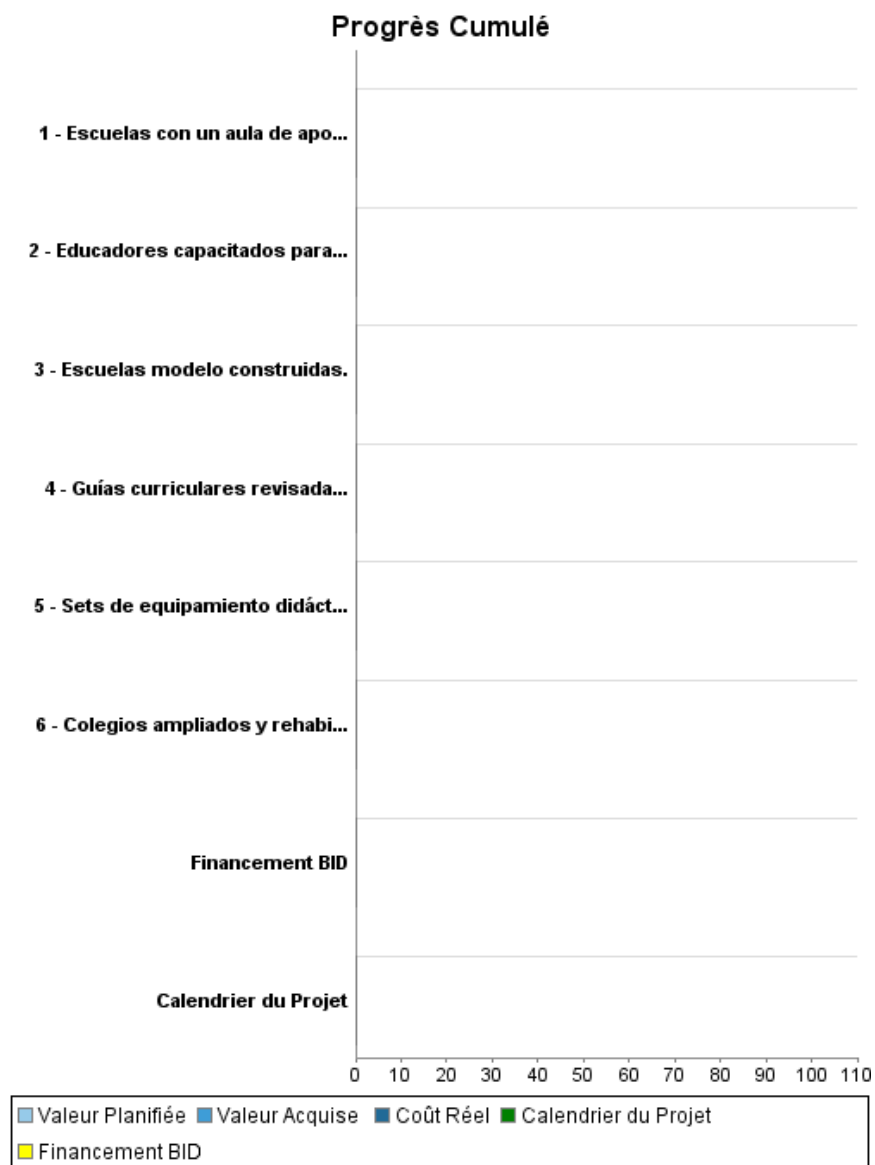

Résultats

Résultat: Mejoras y ampliación de los espacios escolares con infraestructura innovadora.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	2016	Fin du Projet
Alumnos beneficiados.	Estudiantes		2012	P A	36,000.00	2,000.00	38,000.00
Alumnos matriculados en las escuelas del proyecto.	Alumnos		2012	P A	8,000.00	2,000.00	10,000.00
Aulas de apoyo al aprendizaje en uso.	Aulas		2012	P A	45.00	47.00	47.00

Résultat: Creación de un ambiente escolar que fomente el uso de prácticas pedagógicas centradas en los estudiantes y participativas utilizando espacios escolares innovadores.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	2016	Fin du Projet
Escuelas utilizando el currículo basado en competencias	Escuelas		2012	P A	45.00	2.00	47.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1: Infraestructura escolar innovadora									
Escuelas modelo construidas.	Escuelas				2,00				26.200.000,00
Colegios ampliados y rehabilitados.	Colegios				20,00				37.800.000,00
Escuelas con un aula de apoyo construida para atender las diferentes necesidades de aprendizaje .	Aulas				47,00				3.200.000,00
Componente 2: Actualización y validación curricular y de gestión escolar									
Guías curriculares revisadas y/o reformuladas de los niveles inicial, primario y medio.	Guías				25,00				3.512.700,00
Educadores capacitados para formar en las nuevas propuestas curriculares.	Docentes				574,00				3.305.040,00
Sets de equipamiento didáctico adquirido para uso de docentes y estudiantes.	Sets				110,00				3.182.260,00
Categoría 3: Administration									
Gastos administrativos	N/A								500.000,00
Categoría 4: Auditoria									
Desarrollo de Auditorías Anuales.	N/A								200.000,00
Categoría 5: Monitoreo									
Monitoreo.	N/A								75.000,00
Categoría 6: Imprevisto									
Imprevistos.	N/A								2.025.000,00
TOTAL									80.000.000,00
