




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE EDUCACION		
Sector:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Número(s) de Préstamo:	2734/OC-PN	Monto Aprobado Actual: 70.000.000,00	BID Original: 70.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 70.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 88,00
Operación(es) Relacionada(s):	PN-T1083, RG-P1478	Saldo: 70.000.000,00	Co-financiamiento/País: 10.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 80.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 03-oct-2012 Validado por Representante de País: 05-oct-2012

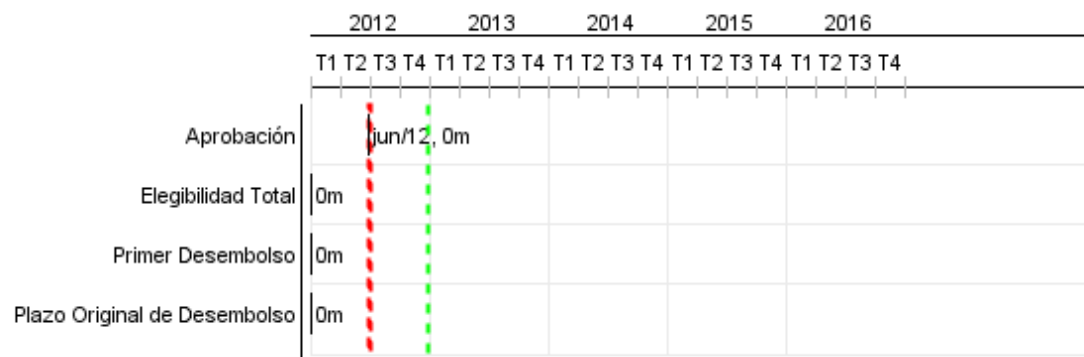

## Progreso Acumulado al 2012



## Resultados

**Resultado:** Mejoras y ampliación de los espacios escolares con infraestructura innovadora.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	2016	Fin de Proyecto
Alumnos beneficiados.	Estudiantes		2012	P A	36,000.00	2,000.00	38,000.00
Alumnos matriculados en las escuelas del proyecto.	Alumnos		2012	P A	8,000.00	2,000.00	10,000.00
Aulas de apoyo al aprendizaje en uso.	Aulas		2012	P A	45.00	47.00	47.00

**Resultado:** Creación de un ambiente escolar que fomente el uso de prácticas pedagógicas centradas en los estudiantes y participativas utilizando espacios escolares innovadores.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	2016	Fin de Proyecto
Escuelas utilizando el currículo basado en competencias	Escuelas		2012	P A	45.00	2.00	47.00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1: Infraestructura escolar innovadora</b>									
Escuelas modelo construidas.	Escuelas				2,00				26.200.000,00
Colegios ampliados y rehabilitados.	Colegios				20,00				37.800.000,00
Escuelas con un aula de apoyo construida para atender las diferentes necesidades de aprendizaje .	Aulas				47,00				3.200.000,00
<b>Componente 2: Actualización y validación curricular y de gestión escolar</b>									
Guías curriculares revisadas y/o reformuladas de los niveles inicial, primario y medio.	Guías				25,00				3.512.700,00
Educadores capacitados para formar en las nuevas propuestas curriculares.	Docentes				574,00				3.305.040,00
Sets de equipamiento didáctico adquirido para uso de docentes y estudiantes.	Sets				110,00				3.182.260,00
<b>Categoría 3: Administration</b>									
Gastos administrativos	N/A								500.000,00
<b>Categoría 4: Auditoría</b>									
Desarrollo de Auditorías Anuales.	N/A								200.000,00
<b>Categoría 5: Monitoreo</b>									
Monitoreo.	N/A								75.000,00
<b>Categoría 6: Imprevisto</b>									
Imprevistos.	N/A								2.025.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>80.000.000,00</b>
