





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION				
Sector:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION				
Loan Number(s):	2734/OC-PN	Current Approved Amount:	70.000.000,00	Original IDB:	70.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	70.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	88,00
Related Operation(s):	PN-T1083, RG-P1478	Balance:	70.000.000,00	Co-Financing/Country:	10.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	80.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 03-oct-2012 Validated by Country Representative: 05-oct-2012

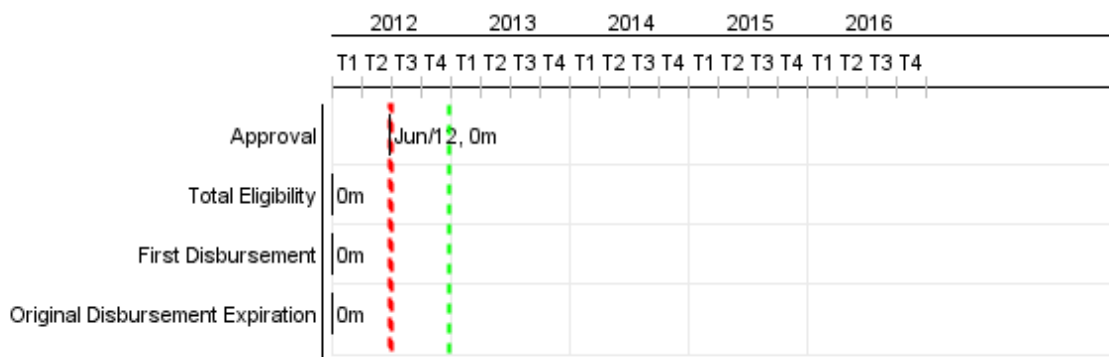

Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome: Mejoras y ampliación de los espacios escolares con infraestructura innovadora.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	End of project
Alumnos beneficiados.	Estudiantes		2012	P A	36,000.00	2,000.00	38,000.00
Alumnos matriculados en las escuelas del proyecto.	Alumnos		2012	P A	8,000.00	2,000.00	10,000.00
Aulas de apoyo al aprendizaje en uso.	Aulas		2012	P A	45.00	47.00	47.00

Outcome: Creación de un ambiente escolar que fomente el uso de prácticas pedagógicas centradas en los estudiantes y participativas utilizando espacios escolares innovadores.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	End of project
Escuelas utilizando el currículo basado en competencias	Escuelas		2012	P A	45.00	2.00	47.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Infraestructura escolar innovadora									
Escuelas modelo construidas.	Escuelas				2,00				26.200.000,00
Colegios ampliados y rehabilitados.	Colegios				20,00				37.800.000,00
Escuelas con un aula de apoyo construida para atender las diferentes necesidades de aprendizaje .	Aulas				47,00				3.200.000,00
Componente 2: Actualización y validación curricular y de gestión escolar									
Guías curriculares revisadas y/o reformuladas de los niveles inicial, primario y medio.	Guías				25,00				3.512.700,00
Educadores capacitados para formar en las nuevas propuestas curriculares.	Docentes				574,00				3.305.040,00
Sets de equipamiento didáctico adquirido para uso de docentes y estudiantes.	Sets				110,00				3.182.260,00
Categoría 3: Administration									
Gastos administrativos	N/A								500.000,00
Categoría 4: Auditoria									
Desarrollo de Auditorías Anuales.	N/A								200.000,00
Categoría 5: Monitoreo									
Monitoreo.	N/A								75.000,00
Categoría 6: Imprevisto									
Imprevistos.	N/A								2.025.000,00
TOTAL									80.000.000,00
