
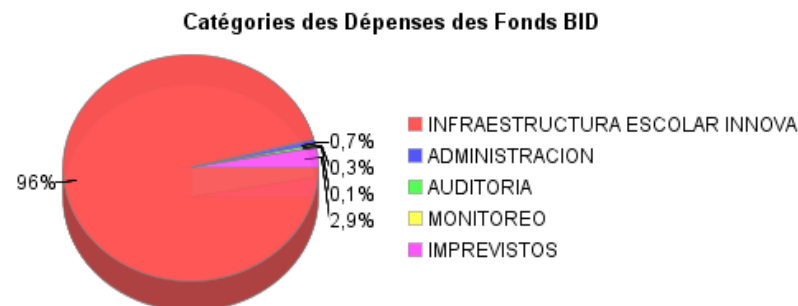
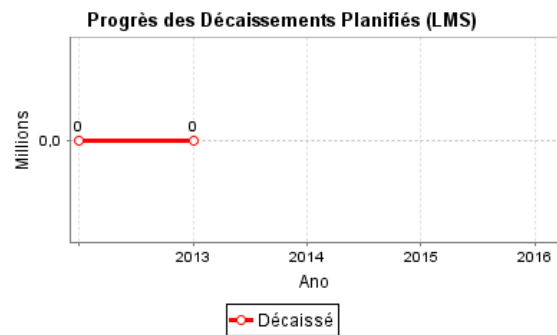



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION		
Secteur:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2734/OC-PN	Montant Courant Approuvé: 70.000.000,00	Initial BID: 70.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 70.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu: 88,00
Opération(s) Connexe(s):	PN-T1083, RG-P1478	Solde: 70.000.000,00	Cofinancement/Pays: 10.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 80.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 240

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 10-abr-2013 Validé par le Représentant: 11-abr-2013

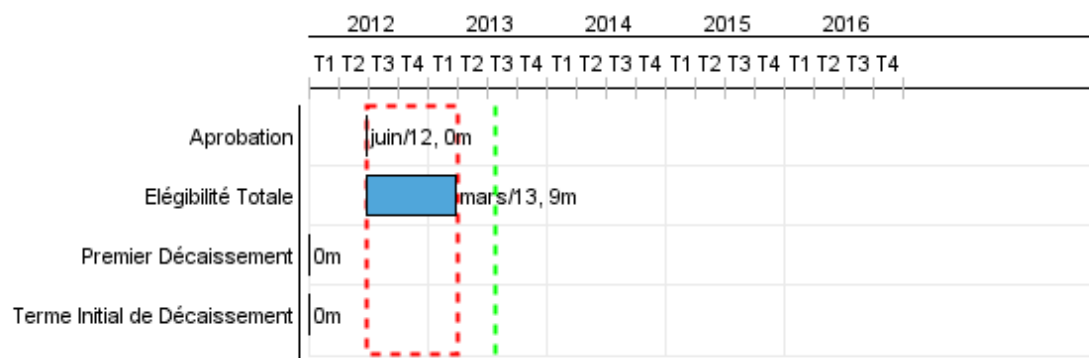

## Progrès Cumulé à 2012

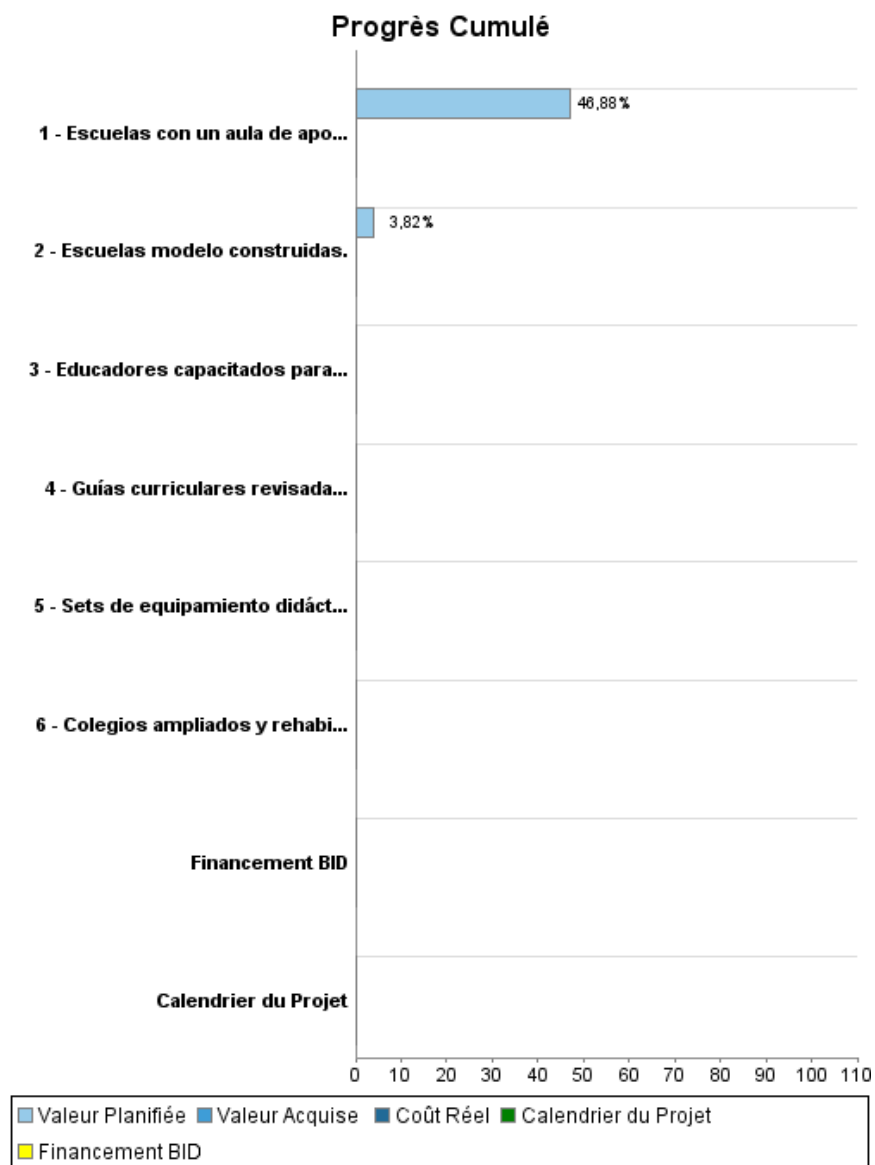

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Mejoras y ampliación de los espacios escolares con infraestructura innovadora.
<b>Observações:</b>	Se verificara los resultados en base de los datos colectados a través de la evaluación del programa e informes de monitoreo entregados por MEDUCA.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	2016	Fin du Projet
Alumnos beneficiados.	Estudiantes		2012	P A	36.000,00	2.000,00	38.000,00
Alumnos matriculados en las escuelas del proyecto.	Alumnos		2012	P A	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Aulas de apoyo al aprendizaje en uso.	Aulas		2012	P A	45,00	47,00	47,00

<b>Résultat:</b>	Creación de un ambiente escolar que fomente el uso de prácticas pedagógicas centradas en los estudiantes y participativas utilizando espacios escolares innovadores.
<b>Observações:</b>	Se verificara los resultados en base de la evaluación del programa.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	2016	Fin du Projet
Escuelas utilizando el currículo basado en competencias	Escuelas		2012	P A	45,00	2,00	47,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Composante 1: Infraestructura escolar innovadora</b>									
Escuelas modelo construidas.	Escuelas				2,00				26.200.000,00
Colegios ampliados y rehabilitados.	Colegios				20,00				37.800.000,00
Escuelas con un aula de apoyo construida para atender las diferentes necesidades de aprendizaje .	Aulas				47,00				3.200.000,00
<b>Composante 2: Actualización y validación curricular y de gestión escolar</b>									
Guías curriculares revisadas y/o reformuladas de los niveles inicial, primario y medio.	Guías				25,00				3.512.700,00
Educadores capacitados para formar en las nuevas propuestas curriculares.	Docentes				574,00				3.305.040,00
Sets de equipamiento didáctico adquirido para uso de docentes y estudiantes.	Sets				110,00				3.182.260,00
<b>Categoría 3: Administration</b>									
Gastos administrativos	N/A								500.000,00
<b>Categoría 4: Auditoria</b>									
Desarrollo de Auditorías Anuales.	N/A								200.000,00
<b>Categoría 5: Monitoreo</b>									
Monitoreo.	N/A								75.000,00
<b>Categoría 6: Imprevisto</b>									
Imprevistos.	N/A								2.025.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>80.000.000,00</b>
