


PMR Public Report

Operation Number	ES-L1075	Chief of Operations Validation Date	10/10/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/10/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Productive Corridors Program	Loan Number	3170/OC-ES, 3170/OC-ES-1, 3170/OC-ES-2
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, MINISTERIO DE ECONOMIA	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	SOLIS AHUMADA, GALILEO HUMBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
ES-L1075	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	34,381,870.95	85.95%	5,618,129.05
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	34,381,870.95	85.95%	5,618,129.05

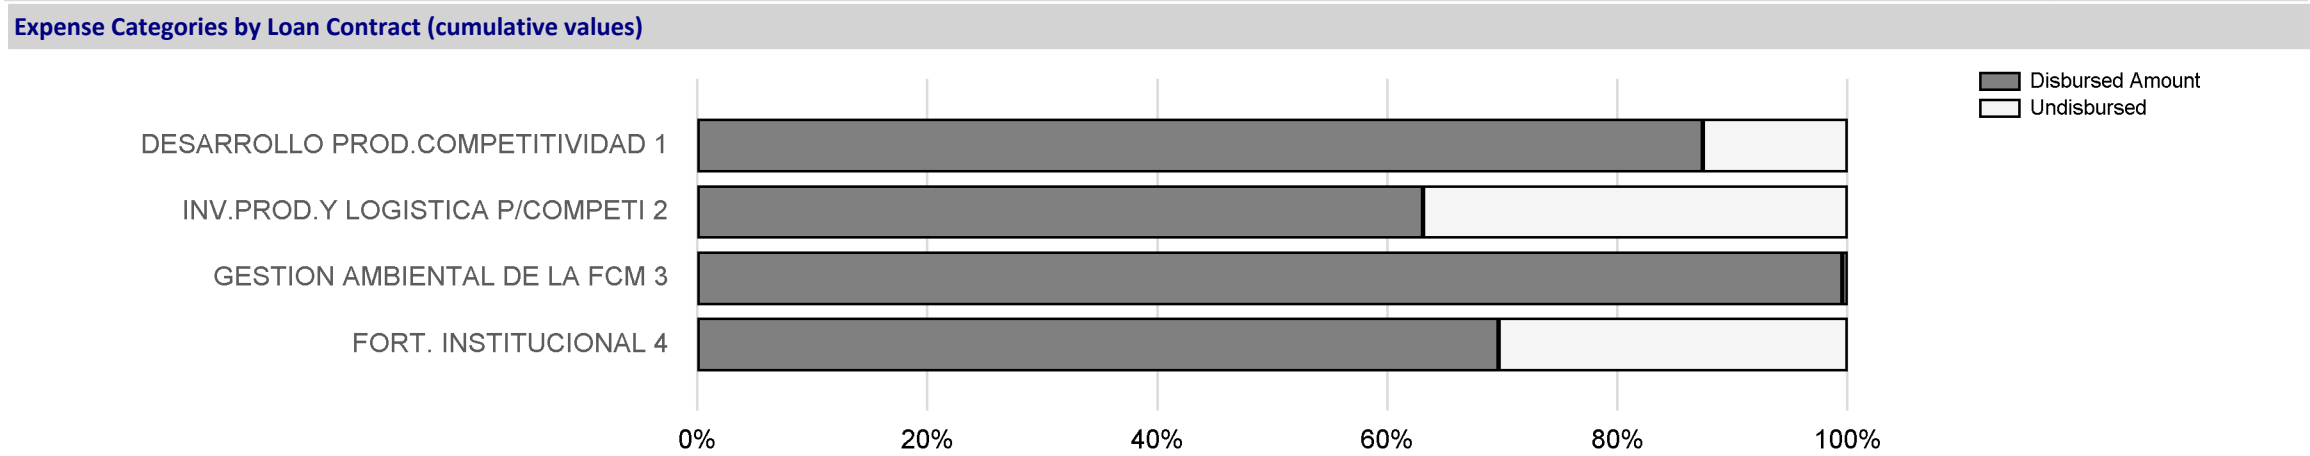

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejorar el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Cambio en la recaudación impositiva por las mayores ventas e ingresos de las empresas beneficiadas que vieron aumentada su productividad.	Indice	1	2013	2023	P	1.1
						A	-

Details

Means of Verification: Cuentas nacionales e Informe del Ministerio de Hecienda

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Aumento de la competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) ubicadas en las áreas de intervención del Programa

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
0.0	Nivel de ingresos de las empresas beneficiarias de cofinanciamientos parciales no reembolsables (o aportes no-rembolsables ANR) y de iniciativas de articulación	%	0	2013	P	10	-	-	20
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
0.1	Nivel de empleo de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0	2013	P	5	-	-	10
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
0.2	Productividad de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0	2013	P	5	-	-	10
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejora de la infraestructura productiva y logística para la competitividad

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.0	Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2013	P	.5	-	-	.4
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.1	Velocidad para los Usuarios de Automóviles	km/h	24.7	2013	P	30	-	-	50
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.2	Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5.93	2013	P	5.5	-	-	3.5
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.3	Velocidad para los Usuarios de Autobuses	km/h	22.7	2013	P	25	-	-	45
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.4	Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2013	P	3	-	-	2.15
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.5	Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	km/h	22.7	2013	P	25	-	-	45
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2021	2022	EOP 2023
1.6	Cantidad de productores y pescadores artesanales que utilizan nuevas infraestructuras productivas (muelles, centros de acopio, comercialización y sistemas de cadena de frio)			# productores	0	2013	P	200	-	-	400
							A	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas sobre la base de los registros de CENDEPESCA.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2021	2022	EOP 2023	
1.7	Tiempo adicional que se conservan los productos a una temperatura adecuada para evitar pérdidas.			Horas	0	2013	P	24	-	-	48
							A	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Bitácoras administrativas de uso de sistema de cadena de frío

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejora de la gestión ambiental de la Franja Costero Marina (FCM)

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
2.0	Percepción favorable de la gestión ambiental en la Franja Costero Marina	% de población	0	2013	P	50	-	-	66
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: Encuesta de percepción

Observations: No existe actualmente una medida de este indicador. Como parte del proceso de consulta ambiental y social se realizará una encuesta para medir la línea de base del indicador.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Contribuir al fortalecimiento del marco institucional y de políticas de apoyo al desarrollo productivo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
3.0	Inversión en políticas de apoyo al desarrollo productivo de las instituciones involucradas	Indice	1	2013	P	1.1	-	-	1.2
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: Registros de UCP y presupuestos de las instituciones involucradas.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo Productivo para la Competitividad de MIPYMES

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	# of enterprises	P	-	100	-	461,200
			P (a)	12	100	157,200	381,951.92
			A	11	25	102,913.53	327,665.45
1.02	MIPYMES individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización (Asistencias Técnicas y eventos de comercialización)	# of enterprises	P	-	1,100	-	2,250,240
			P (a)	326	1,100	467,403	1,717,025.1
			A	20	229	7,480.6	1,257,102.7
1.03	Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial	Grupos asociativos	P	-	30	-	237,500
			P (a)	-	30	-	240,603.98
			A	-	-	-	240,603.98
1.04	MIPYMES asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	# of enterprises	P	-	250	-	340,000
			P (a)	-	250	-	133,714.15
			A	-	34	-	133,714.15
1.05	Grupos Asociativos asistidos técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para acceso al mercado formal y la formalización	Grupos asociativos	P	-	25	-	150,000
			P (a)	-	25	-	31,200
			A	-	2	-	31,200
1.06	Emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas	Emprendedores	P	-	1,200	-	2,125,000
			P (a)	-	1,200	24,000	1,809,337.52
			A	-	656	18,000	1,803,337.52
1.07	Iniciativas productivas de emprendimiento financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	-	300	-	2,250,000
			P (a)	-	310	-	2,239,391.63
			A	-	310	-	2,239,391.63
1.08	Iniciativas productivas de emprendimiento lideradas por mujeres financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	-	150	-	1,125,000
			P (a)	-	184	-	1,166,142
			A	-	184	-	1,166,142
1.09	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Proyectos productivos	P	-	115	-	1,737,060
			P (a)	20	94	1,379,486	3,506,886.21
			A	17	91	405,338.84	2,532,739.05
1.10	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Iniciativas productivas	P	-	42	-	5,224,000
			P (a)	-	46	745,988	4,673,747.94
			A	-	46	56,948	3,984,707.94

Component Nbr. 2 Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Muelles de uso dual construidos/reconstruido	Muelles	P	-	4	-	4,750,000
			P (a)	2	2	5,000,273.55	5,000,273.55
			A	-	-	-	-
2.02	Centro de Acopio (CAS) construido	Centro de Acopio	P	-	1	-	1,200,000
			P (a)	1	1	2,247,109.46	2,247,109.46
			A	-	-	-	-
2.03	Vía Malecón de Ciudad Puerto de la Unión construida	km	P	-	0.6	-	1,100,000
			P (a)	-	0.6	-	567,595.23
			A	-	0.6	-	567,595.23
2.04	Camino Terciario UNS08S, Tramo Corsain-Las Playitas mejorado	km	P	-	6.8	-	3,850,000
			P (a)	-	6.8	-	4,486,343.92
			A	-	6.8	-	4,486,343.92
2.05	Camino Rural USU08S, Tramo Carretera CA02S (Desvió San Marcos Lempa)- Desvió el Zamoran reconstruido	km	P	-	9.8	-	10,500,000
			P (a)	-	9.8	-	8,212,317.33
			A	-	9.8	-	8,212,317.33

Component Nbr. 3 Gestión Ambiental de la Franja Costero-Marítima

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Mapa de zonificación ambiental del Golfo de Fonseca desarrollado	Mapa	P	-	1	-	254,000
			P (a)	-	1	-	223,502.72
			A	-	1	-	223,502.72
3.02	Pasantías en Zonificación Ambiental y Rehabilitación de costas realizadas	Pasantías	P	-	14	-	35,000
			P (a)	-	15	-	32,702.15
			A	-	15	-	32,702.15
3.03	Talleres/eventos de oficialización y socialización de propuesta de zonificación ambiental realizadas	Talleres/ eventos	P	-	5	-	13,500
			P (a)	-	5	850.3	10,274.62
			A	-	5	850.3	10,274.62
3.04	Estudio de caracterización, dinámica y lineamientos para manejo y rehabilitación de la costa de El Salvador desarrollado	estudio	P	-	1	-	80,400
			P (a)	-	1	-	120,045
			A	-	1	-	120,045
3.05	Funcionarios capacitados en Dinámica y rehabilitación de costas.	Funcionarios	P	-	25	-	14,000
			P (a)	-	33	-	15,123.55
			A	-	33	-	15,123.55
3.06	Equipo tecnológico y software especializado instalado	Equipo	P	-	1	-	103,100
			P (a)	-	1	3,626.96	98,351.96
			A	-	1	2,936	97,661

Component Nbr. 4 Fortalecimiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados	Manuales	P	-	9	-	311,000
			P (a)	-	9	-	170,548.72
			A	-	9	-	170,548.72
4.02	Herramientas para el monitoreo, seguimiento, evaluación y levantamiento de línea base diseñadas	Herramientas	P	-	4	-	253,000
			P (a)	1	3	216,448.34	321,991.87
			A	1	3	34,950	140,493.53
4.03	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Funcionarios	P	-	70	-	171,000
			P (a)	-	204	-	101,344.07
			A	-	204	-	101,344.07
4.04	Estrategia de Gestión de Riesgos diseñada	Estrategia	P	-	1	-	15,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
4.05	Asociaciones de Desarrollo Económico Local equipadas	Asociaciones	P	-	2	-	55,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
4.06	Laboratorio de control de calidad del agua y patología para pesca y acuicultura equipado	Laboratorio	P	-	1	-	45,000
			P (a)	-	2	-	144,133.24
			A	-	2	-	144,133.24
4.07	Plan anual de visibilización del Programa implementado	Plan	P	-	4	-	200,000
			P (a)	1	5	30,936	199,106.34
			A	-	4	13,893.48	182,063.82

Other Cost				
	Administracion (Evaluaciones de Impacto, Auditorías, Evaluaciones del Programa y UEP)	P		1,150,000
		P (a)	685,766.05	2,149,235.82
		A	202,374.4	1,665,844.17
Total Cost				
	Total Cost	P	0	40,000,000
		P (a)	10,959,087.66	40,000,000
		A	845,685.15	29,886,597.49

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Inactive		Planning
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Inactive		Technical Design
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	24.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Planning
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	27.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Inactive		Sustainability
	Response Actions		
	30.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
33	Inactive		Planning
	Response Actions		
	33.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	33.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Inactive		Technical Design
	Response Actions		
	36.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
39	Inactive		Planning
	Response Actions		
	39.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	39.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
42	Inactive		Planning
	Response Actions		
	42.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
43	Active		Planning
	Response Actions		
	43.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	43.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	43.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
44	Active		Planning
	Response Actions		
	44.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	44.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	44.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
45	Active		Planning
	Response Actions		
	45.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	45.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
