




Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Número da Operação:	2614/BL-BO	Atual:	35.000.000,00	Original BID:	35.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:		Corrente BID:	35.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:	83,00
Operação Relacionada:	BO-T1145	Saldo:	35.000.000,00	Cofinanciamento/País:	7.270.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	42.270.000,00
				Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 20-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 27-abr-2012

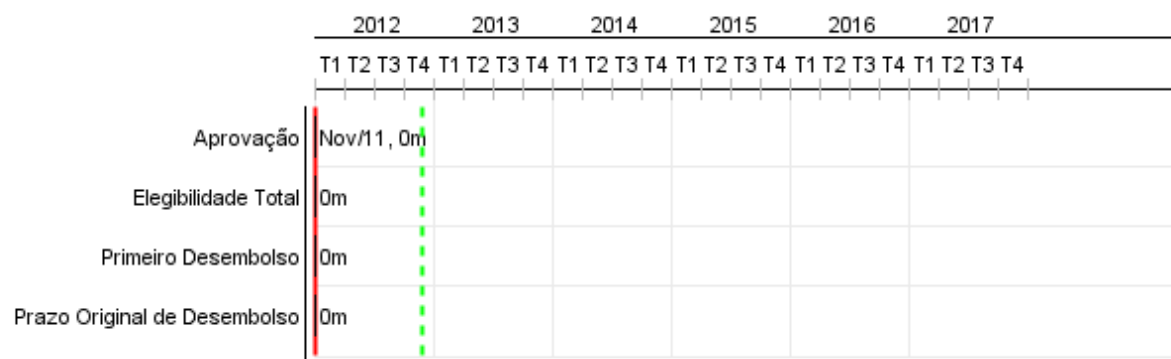

Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Cobertura de Parto Institucional	numero	20,000.00	2010	P A	35.000,00
Mujeres con complicaciones obstétricas referidas al nivel apropiado	Porcentaje	53.00	2010	P A	80,00
Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P A	80,00
Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P A	50,00
Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número		2011	P A	200,00
Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Numero	100.00	2011	P A	475,00
Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Personas		2012	P A	5.000,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi									
Personas del primer nivel capacitadas en promoción de la salud.	Personas				200,00				200.000,00
Materiales para promoción de la Salud preparados y distribuidos, para usar en capacitaciones con personal, y con las comunidades.	paquete				1,00				1.000.000,00
Ambulancias y camionetas adquiridas para sistema de referencia y retorno.	ambulancias				6,00				200.000,00
Centro regulador de urgencias medicas equipado.	Centro				1,00				300.000,00
Protocolos elaborados para sistema de referencia y retorno	protocolos desarrollados				3,00				200.000,00
Personas capacitadas en la aplicación de los protocolos para sistema de referencia y retorno .	personas				200,00				350.000,00
Sistema de Comunicación Departamental	1				1,00				500.000,00
Campañas, materiales, y spots radiales realizados en municipios y comunidades de Potosí	actividades				22,00				110.000,00
Inversiones en infraestructura y equipamiento									
Hospital de especialidades en Llallagua construido y equipado.	Hospital				1,00				15.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi refaccionados.	Establecimiento				50,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi ampliados.	Establecimiento				25,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi equipados.	Establecimiento				202,00				2.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi construidos.	Establecimiento				2,00				2.500.000,00
Construcción y equipamiento de hospital de segundo nivel en departamento de Potosí de acuerdo con criterios de selección establecidos	hospital				1,00				3.000.000,00
Otras inversiones a ser definidas en infraestructura y equipamiento	EESS				3,00				2.500.000,00
Administracion y Monitoreo									
Desarrollo del sistema de monitoreo para el proyecto.	systema				1,00				1.000.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BO-L1067 - Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi
2011 2º período com fechamento em (31-Mar-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 19/04/2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Areas clave fortalecidas mediante contratacion de expertos tecnicos.	personas				15,00				640.000,00
TOTAL									37.500.000,00
