
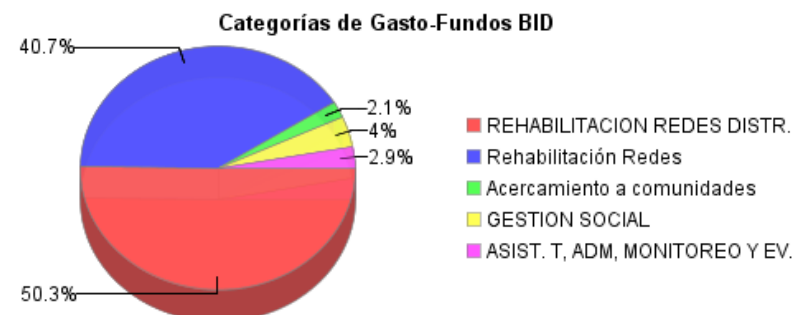
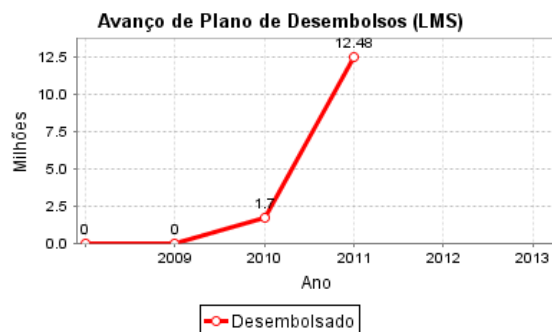



## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD				
Sector:	ENERGY-POWER DISTRIBUTION				
Número da Operação:	2042/OC-DR	Atual:	40.000.000,00	Original BID:	40.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	12.482.580,26	Corrente BID:	40.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	31,21	Pari-passu:	76,00
Operação Relacionada:		Saldo:	27.517.419,74	Cofinanciamento/País:	12.730.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	52.730.000,00
				Período de Amortização (meses):	240

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 18-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 23-abr-2012

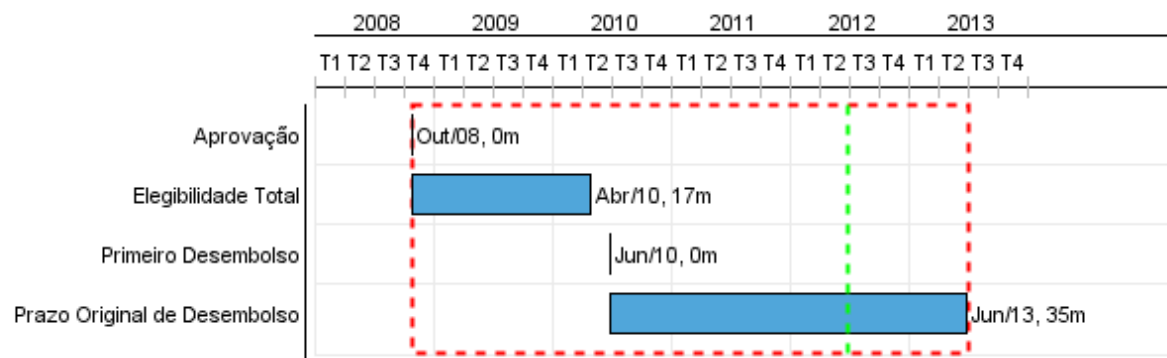

## Progresso Acumulado até 2011

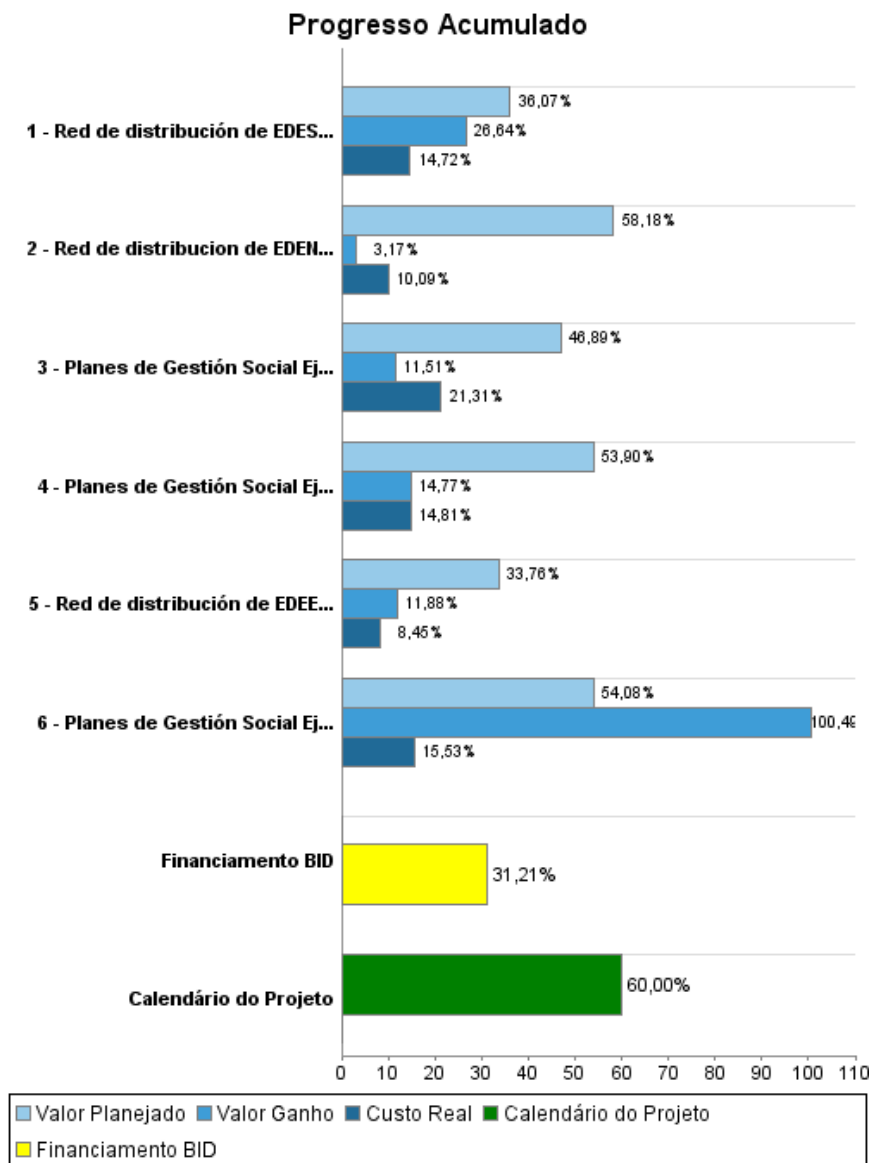

## Resultados

**Resultado:** Eficiencia mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Indice de recaudación EdeNorte	%	89.45	2009	P	90.06	94.00	89.90	94.30	94,30
				A	89.20	86.90			
Indice de Recaudación EdeSur	%	92.48	2009	P	93.16	97.46	93.70	95.50	95,50
				A	91.10	91.70			
Indice de Recaudación EdeEste	%	94.76	2009	P	93.60	94.40	91.90	93.90	93,90
				A	91.30	88.90			
Porcentaje de pérdidas EdeNorte	%	27.10	2009	P	23.75	25.00	29.90	27.00	27,00
				A	32.30	32.90			
Porcentaje de pérdidas EdeSur	%	22.51	2009	P	18.38	28.18	27.60	24.90	24,90
				A	32.20	30.60			
Porcentaje de pérdidas EdeEste	%	44.32	2009	P	42.20	35.20	32.00	29.70	29,70
				A	39.90	36.00			
Indice de recuperacion de efectivo CRI EdeNorte	%	65.21	2009	P	68.67	70.50	62.30	68.80	68,80
				A	60.40	58.30			
Indice de recuperacion de efectivo CRI EdeSur	%	66.92	2009	P	76.04	70.00	66.60	71.70	71,70
				A	60.90	63.60			
Indice de recuperacion de efectivo CRI, EdeEste	%	52.76	2009	P	54.10	61.20	60.90	66.00	66,00
				A	54.90	56.90			

**Resultado:** Disponibilidad de energía a nivel nacional incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Promedio ponderado anual de horas de servicio en EdeNORTE	horas	7,264.00	2009	P		6,588.00	7,096.00	7,884.00	7.884,00
				A		7,131.00			
Promedio ponederado anual de horas de servicio EdeSUR	horas	6,701.00	2010	P		5,832.00	7,008.00	7,884.00	7.884,00
				A		6,684.00			
Promedio ponederado anual de horas de servicio EdeEste	horas	5,586.00	2009	P		6,760.00	6,920.00	7,884.00	7.884,00
				A		7,017.00			

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Rehabilitación de redes de distribución</b>									
Red de distribución de EDENORTE rehabilitada	Kilómetros	121,60	8,00		300,00	8.955.000,00	1.875.000,00		18.590.000,00
Red de distribución de EDESUR rehabilitada	Kilómetros	46,00	47,00		163,00	3.585.000,00	2.024.000,00		13.750.000,00
Red de distribución de EDEESTE rehabilitada	Kilómetros	16,00	8,00		90,00	3.346.000,00	1.190.000,00		14.080.000,00
<b>Resumen Gestión Social por empresa distribuidora</b>									
Planes de Gestión Social Ejecutados EdeNorte	planes	5,00	2,00		6,00	421.440,00	306.000,00		1.464.000,00
Planes de Gestión Social Ejecutados EdeSur	planes	4,00	10,00		12,00	440.130,00	160.000,00		1.095.000,00
Planes de Gestión Social Ejecutados EdeEste	planes	6,00	3,00		7,00	331.190,00	162.000,00		1.121.000,00
<b>Asistencia técnica, administración, monitoreo y evaluación</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>17.078.760,00</b>	<b>5.717.000,00</b>		<b>50.100.000,00</b>
