

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1187	Chief of Operations Validation Date	10/07/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/07/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Civic Coexistence and Neighborhood Improvement Program	Loan Number	4518/BL-HO, 4518/BL-HO-1, 4518/BL-HO-2
Executing Agency	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad	Sector/Subsector	IS - SOCIAL INVESTMENT
Team Leader	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1187	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	2,500,000	4.17%	57,500,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	2,500,000	4.17%	57,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

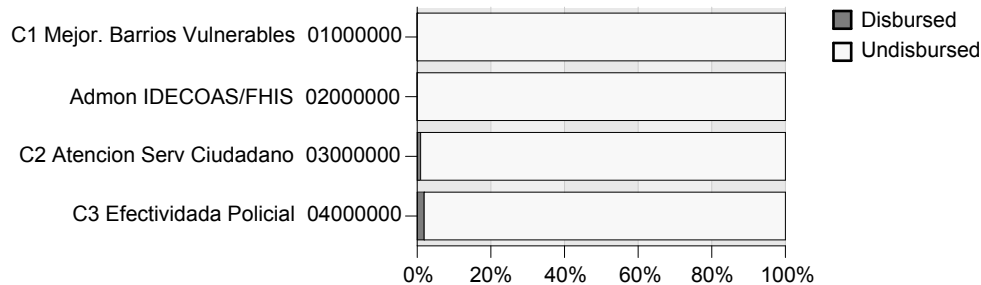

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: IMPACTO ESPERADO: la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Indicador 1. Viviendas con 3 Necesidades Básicas Insatisfechas por clasificación de pobreza (NBI) en áreas urbanas de Honduras	porcentaje	3.08	2018	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63
					A	0.00	0.00					2.63

Details

Means of verification: Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Total de hogares urbanos en Honduras en 2016: 666.627, total de hogares con 3 o más NBI 20.525

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Homicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	59.05	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00					45.00

Details

Means of verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Femicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	7.11	2015	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
					A	0.00	0.00					6.00

Details

Means of verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

Observations: Tasa estimada de acuerdo a las cifras del Observatorio de muertes violentas de mujeres y femicidios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De los 478 homicidios de mujeres reportados, 312 (63.3%) son catalogados como femicidios, 111 (23.2%) como homicidios y 55 (11.5%) como muertes violentas sin determinar

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Confianza de la ciudadanía hondureña en la Policía	Porcentaje	36.80	2015	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.4	(mucha o algo)	Porcentaje	36.80	2015	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00					45.00
Details												
Means of verification: Encuesta Latinobarómetro												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Victimización personal reportada en Honduras	Porcentaje	16.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
					A	0.00	0.00					15.00
Details												
Means of verification: Encuesta de Percepción y Victimización												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: RESULTADO #1: Mejorar el acceso a los servicios básicos en barrios vulnerables intervenidos y disminuir delitos violentos como robos y delitos sexuales.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos	Porcentaje	35.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					A	0.00	0.00					92.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	Porcentaje	2.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					A	0.00	0.00					92.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	Porcentaje	63.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
					A	0.00	0.00					92.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos.	Porcentaje	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos.	Porcentaje	0.00	2017	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					A	0.00	0.00					100.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: En MDC existen 2.000 kilómetros de vías. El programa planea pavimentar 24 kilómetros incluyendo, gradas, rampas y calles vehiculares

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos (basura), en los barrios intervenidos.	Porcentaje	75.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	95.00	95.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	95.00	95.00
					A	0.00	0.00					95.00

Details

Means of verification: Informe de cierre de PCR.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.5	Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los últimos 12 meses	porcentaje	56.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	45.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00					45.00

Details

Means of verification: EMUV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.6	Prevalencia de Robos en los barrios intervenidos para personas de 18 años y mayores	Porcentaje	28.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	20.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	20.00
					A	0.00	0.00					20.00

Details

Means of verification: EMUV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.7	Prevalencia de delitos sexuales por cada 1,000 mujeres en los barrios intervenidos	Tasa	3.80	2016	P	0.00	0.00	0.00	3.40	3.00	3.00	3.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	3.40	3.00	3.00	3.00
					A	0.00	0.00					3.00

Details

Means of verification: SEPOL y Observatorios

Observations: 14 delitos sexuales y 3.600 mujeres y niñas residentes

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: RESULTADO ESPERADO 2: Reducción de homicidios y VIF en los municipios beneficiados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Prevalencia de VIF en las áreas intervenidas	Porcentaje	5.43	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					A	0.00	0.00					5.00

Details

Means of verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia

Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Proporción de víctimas que denuncia un delito de VIF en las áreas intervenidas	Porcentaje	21.70	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
					A	0.00	0.00					25.00

Details

Means of verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia

Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Número de víctimas de VIF que utilizan los servicios de atención con profesionales multidisciplinarios de VIF en las áreas intervenidas de forma anual	Número	700.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
					A	0.00	0.00					850.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details												
Means of verification: Registros de atención en DPI bajo la estrategia MAIE												
Observations: Distrito Central y SPS que realizan denuncias en instalaciones DPI MAIE												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en zonas intervenidas	Tasa	94.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					A	0.00	0.00					85.00

Details												
Means of verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) y UTECI												
Observations: Distrito Central y SPS												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 3: RESULTADO ESPERADO 3: Mejora de los niveles de efectividad policial a través del incremento de casos de homicidio con autor identificado e informe criminalístico aceptado por el Ministerio Público

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Número de graduados de la ANAPO formados en la nueva currícula por competencias	Número	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00					80.00

Details												
Means of verification: Informe Academia Nacional de Policía (ANAPO)												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.1	Casos de homicidio con autor identificado por la policía, sobre el total de homicidios investigados por la PN en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	34.00	2017	P	0.00	35.00	37.00	38.00	40.00	42.00	42.00
					P(a)	0.00	35.00	37.00	38.00	40.00	42.00	42.00
					A	0.00	0.00					42.00

Details												
Means of verification: Policía Nacional (Dirección de Investigación)												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.2	Casos de homicidio aceptados por el MP, sobre el total de casos remitidos por la PN al MP en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	16.00	2017	P	0.00	20.00	24.00	28.00	32.00	36.00	36.00
					P(a)	0.00	20.00	24.00	28.00	32.00	36.00	36.00
					A	0.00	0.00					36.00
Details												
Means of verification: Informe de DPI												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente #1: Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y pavimentación), completados y siendo utilizados	Proyectos	P	0	9	3,020,731	14,432,999
			P(a)	0	9	3,020,731	14,432,999
			A	0	0	281,091	281,091
1.2	Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados	Número de asistencias	P	1,600	9,600	482,644	3,173,001
			P(a)	1,600	9,600	482,644	3,173,001
			A	1,599	1,599	511,830	511,830
1.3	Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo	Número de personas	P	0	700	0	613,000
			P(a)	0	700	0	613,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente #2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Servicios de atención integral para VIF en las DPI intervenidas, en funcionamiento de acuerdo con el protocolo de servicios	Número de Servicios	P	0	2	0	10,000
			P(a)	0	2	0	10,000
			A	0	0	0	0
2.2	Estaciones policiales construidas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones	P	0	6	593,693	19,128,511.23
			P(a)	0	6	593,693	19,128,511.23
			A	0	0	123,272.65	123,272.65
2.3	Estaciones policiales existentes con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones policiales	P	0	16	30,000	94,830.47
			P(a)	0	16	30,000	94,830.47
			A	0	0	0	0
2.4	Protocolo de actuación de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	Protocolos	P	1	1	20,000	20,000
			P(a)	1	1	20,000	20,000
			A	1	1	0	0
2.5	Curso de capacitación para la implementación del protocolo de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	Cursos	P	1	1	0	10,000
			P(a)	1	1	0	10,000
			A	0	0	0	0
2.6	Documento de cartera de servicios policiales elaborado	Documento	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	1	1	0	0
2.7	Unidades móviles de servicios policiales, operando	Número de unidades	P	0	3	510,000	741,000
			P(a)	0	3	510,000	741,000
			A	0	0	0	0
2.8	Cursos impartidos por la policía a jóvenes y familias en temas de violencias, denuncias y derechos humanos	Cursos	P	0	450	384,330	923,450
			P(a)	0	450	384,330	923,450
			A	0	0	103,673	103,673
2.9	Equipo multidisciplinario contratado para la mejora del análisis de datos en la subsecretaría de asuntos interinstitucional	Equipo	P	0	1	115,374.97	115,374.97
			P(a)	0	1	115,374.97	115,374.97
			A	0	0	0	0
2.10	Gobiernos municipales capacitados para análisis de datos y elaboración de planes locales	Subnational governments (#)	P	0	30	117,500	333,500
			P(a)	0	30	117,500	333,500
			A	0	0	0	0
2.11	Estrategia de comunicación en ejecución	Estrategia	P	0	1	143,333.33	573,333.33
			P(a)	0	1	143,333.33	573,333.33
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente #3: Efectividad policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Sistema de Formación y Profesionalización Policial articulado y funcionado	Documento	P	0	1	1,100,542	4,288,548.73
			P(a)	0	1	1,100,542	4,288,548.73
			A	0	0	206,205	206,205
3.2	Academia Nacional de Policía con infraestructura física y tecnología modernas, siendo utilizada	Government agencies (#)	P	0	1	1,191,664	9,649,305.94
			P(a)	0	1	1,191,664	9,649,305.94
			A	0	0	115,255	115,255
3.3	Programa de capacitación y especialización continua en IC, diseñado y efectuado	Programa	P	0	3	952,500	2,062,145.33
			P(a)	0	3	952,500	2,062,145.33
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administracion IDECOAS/FHIS	P			161,205	1,781,000
		P(a)			161,205	1,781,000
		A			235,280	235,280
	Administracion SEDS	P			572,345	2,000,000
		P(a)			572,345	2,000,000
		A			225,872	225,872

Total Cost

	Total Cost	P			9,395,862.3	60,000,000
		P(a)			9,395,862.3	60,000,000
		A			1,802,478.65	1,802,478.65

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Academia Nacional de Policía con infraestructura física y tecnología modernas, siendo utilizada	El producto no se modificó, solo se actualizó los años 2018 y 2019 en cero (0), se adjunta la matriz de resultados revisada en el Taller de Arranque.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	ANDRESRE	10/04/2019
	Estaciones policiales existentes con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	El producto no se modificó, solo se actualizó los años 2018 y 2019 en cero (0), se adjunta la matriz de resultados revisada en el Taller de Arranque.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	ANDRESRE	10/04/2019
	Estrategia de comunicación en ejecución		Modify Output	Modify Physical Historical Actual	ANDRESRE	10/04/2019
	Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo		Modify Output	Modify Physical Historical Actual	ANDRESRE	10/04/2019
	Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y pavimentación), completados y siendo utilizados		Modify Output	Modify Physical Historical Actual	ANDRESRE	10/04/2019
	Personal capacitado	El producto no se modificó, solo se actualizó los años 2018 y 2019 en cero (0), se adjunta la matriz de resultados revisada en el Taller de Arranque.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	ANDRESRE	10/04/2019
	Programa de capacitación y especialización continua en IC, diseñado y efectuado		Modify Output	Modify Physical Historical Actual	ANDRESRE	10/04/2019
	Servicios de atención integral para VIF en las DPI intervenidas, en funcionamiento de acuerdo con el protocolo de servicios		Modify Output	Modify Physical Historical Actual	ANDRESRE	10/04/2019
	Sistema de Formación y Profesionalización Policial articulado y funcionado		Modify Output	Modify Physical Historical Actual	ANDRESRE	10/04/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination
