


# PMR Public Report

Operation Number	AR-L1243	Chief of Operations Validation Date	04/16/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/02/23
Last Update	03/31/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	DEVELOPMENT PROGRAM FOR METROPOLITAN AREAS OUTSIDE THE CAPITAL II	Loan Number	3780/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DEL INTERIOR	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-SUSTAINABLE CITIES
Team Leader	SORIA ALVES, DALVE ALEXANDRE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	08/05/20
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se implementó el plan de reasentamiento involuntario y el plan de forestación compensatoria, aunque éste debe ser monitoreado hasta su culminación. Las acciones de la auditoría ambiental de DAMI I no se tiene registro de que hayan sido implementadas.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1243	80,000,000	40,000,000		0	80,000,000	40,000,000	24,269,327.2	60.67%	15,730,672.8
Aggregated	80,000,000	40,000,000		0	80,000,000	40,000,000	24,269,327.2	60.67%	15,730,672.8

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

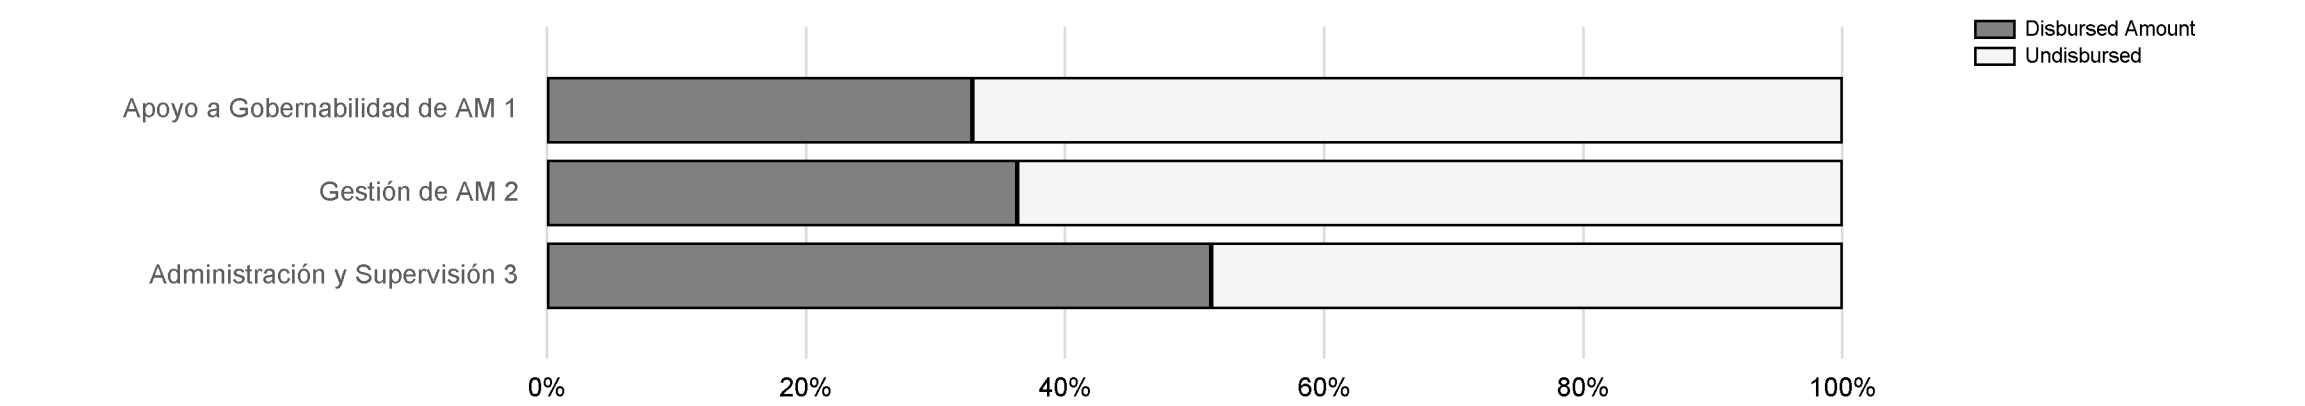

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Generar un entendimiento de los problemas que enfrentan las metrópolis y fomentar acuerdos de priorización de intervenciones que requieren coordinación entre autoridades municipales y provinciales de un área metropolitana

Observation: Las agendas capturan el acuerdo político y líneas prioritarias de trabajo coordinado entre las autoridades que componen las AM. Las 21 AM de Argentina tienen 135 municipios

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Proporción de intendentes en AM del país que suscriben una Agenda Metropolitana de prioridades de intervención en infraestructura y servicios públicos en el AM que involucra al municipio bajo su jurisdicción.	%	14.8	2016	P	-	-	-	50.4
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Aprobación y publicación de agendas metropolitanas de las AM verificado a través de informes semestral y evaluación.

Observations: Las agendas capturan el acuerdo político y líneas prioritarias de trabajo coordinado entre las autoridades que componen las AM. Las 21 AM de Argentina tienen 135 municipios. El valor de línea de base muestra que, hasta el año 2016, 20 intendentes de los 135 municipios habían suscripto una Agenta Metropolitana.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Proporción de municipios en AM del país que envían personal a participar de las distintas instancias de reunión y capacitación del Programa.	%	14.8	2016	P	-	-	-	62.2
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes semestrales y evaluación en base a asistencia a capacitación y reuniones

Observations: Captura la proporción de municipios que participaron de las actividades del Programa

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Visitas anuales al nuevo Portal web del programa DAMI sobre temas de gestión metropolitana.	Nro de visitas anuales al portal	360	2018	P	-	-	-	1,000
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registro a través de sistema analítico del portal web reportado en informe semestral.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a la creación de las instituciones necesarias para la provisión de servicios e infraestructuras en áreas metropolitanas que incluyen dos o más jurisdicciones territoriales.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Número total de entidades metropolitanas que proveen servicios e infraestructuras metropolitanas involucrando dos o más jurisdicciones	Entidades metropolitanas	14	2016	P	-	-	-	17
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Actas de conformación de la entidad metropolitana.

Observations: Línea de base corresponde a entidades metropolitanas existentes en las AM de Argentina

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Nuevos actos normativos subnacionales que formalizan la gestión metropolitana involucrando a dos o más jurisdicciones participantes del Programa.	nro de actos normativos	0	2016	P	-	-	-	10
					A	-	-	-	-
Details									

**Means of Verification:** Informe semestral en base a relevamientos de política del MDTyH y las unidades provinciales

**Observations:** Se define como acto normativo decretos, ordenanzas, leyes o de naturaleza similar

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Financiar inversiones en infraestructura urbana y equipos que apoyen la mejora de los servicios y la infraestructura pública en áreas metropolitanas que requieren de la concurrencia de dos o más jurisdicciones territoriales.

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Índice de uso promedio de las inversiones en infraestructura financiadas por el Programa.	Indice	100	2017	P	-	-	-	110
					A	-	-	-	-
Details									

**Means of Verification:** Informes de uso de las infraestructuras financiadas por el Programa antes y después del programa.

**Observations:** El indicador tomará el promedio de los índices de uso para cada inversión en infraestructura financiada por el Programa. Se tomará como valor de línea de base el uso de la instraestructura financiada en su situación pre-Programa. Para el proyecto de semaforización inteligente del AM Mendoza se considerará el uso del transporte público en el tramo del carril Tomás Godoy Cruz de Guaymallén, donde se instalarán semáforos, que se beneficiará de mejor circulación. El proyecto de recuperación y refuncionalización del Arbolado Público Urbano del AM de Mendoza no se incluirá en este indicador

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 2023
3.2	Índice de estado de salud del Arbolado Público Urbano en el Área metropolitana de Mendoza.	Indice	100	2017	P	-	-	-	130
					A	-	-	-	-
Details									

**Means of Verification:** Sitio online del estado de arbolado. Actas de la Mesa del arbolado.

**Observations:** Cálculo de la información de base de acuerdo a promedio simple de atributo de estado de ejemplar relevado en censo de arbolado, siendo: 4=bueno; 3= enfermo; 2=decrepito; y 1=muerto.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la Gobernabilidad de Áreas Metropolitanas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Diagnósticos de identificación de problemas metropolitanos realizados.	Documen tos de diagnóstico	P	-	4	-	289,000
			P (a)	2	4	-	289,000
			A	3	5	-	39,000
1.02	Talleres sobre temas metropolitanos para funcionarios técnicos y actores de la sociedad civil realizados.	Talleres	P	-	10	-	400,000
			P (a)	3	10	-	400,000
			A	1	8	-	67,000
1.03	Seminarios internacionales sobre temas metropolitanos realizados.	Seminarios	P	-	1	-	84,000
			P (a)	-	1	-	84,000
			A	-	1	-	84,000
1.04	Actualizaciones al portal WEB del programa DAMI sobre temas metropolitanos realizadas.	Portal	P	-	1	-	50,000
			P (a)	-	1	-	50,000
			A	1	1	-	-

Component Nbr. 2 Gestión de Áreas Metropolitanas - Fortalecimiento Institucional de las AM

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Proyectos de desarrollo institucional formulados.	Proyectos	P	-	7	-	418,000
			P (a)	1	7	6,000	412,000
			A	1	7	-	96,024
2.02	Lineamientos estratégicos metropolitanos integrales formulados.	Estudios	P	-	1	-	350,000
			P (a)	1	1	-	350,000
			A	-	-	-	-
2.03	Planes metropolitanos sectoriales formulados.	Planes	P	-	19	-	950,000
			P (a)	5	19	-	950,000
			A	2	16	-	360,000
2.04	Estudios de preinversión para inversiones metropolitanas no financiadas con DAMI-II.	Estudios	P	-	3	-	1,800,000
			P (a)	3	3	199,000	1,601,000
			A	1	1	-	-

Component Nbr. 3 Gestión de Áreas Metropolitanas - Inversiones en áreas metropolitanas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	AM Mendoza – Centro de Gestión de semaforización	Centro en funcionamiento	P	-	1	-	2,250,000
			P (a)	1	1	1,603,000	1,572,000
			A	1	1	880,000	1,114,000
3.02	AM Mendoza: Ciclovías en el área metropolitana de Mendoza construidas	kilómetro	P	-	81	-	5,740,000
			P (a)	39	81	3,351,000	6,169,000
			A	38	48	2,851,000	2,851,000
3.03	AM Mendoza: Censo arbolado finalizado y en línea	Plataforma accesible	P	-	1	-	1,000,000
			P (a)	-	1	532,000	1,095,074
			A	-	-	384,000	963,234
3.04	AM Rosario: Refuncionalización Predio Paganini	Centro Paganini reformado	P	-	1	-	5,500,000
			P (a)	1	1	5,544,000	9,248,000
			A	1	1	4,612,000	7,425,000
3.05	AMBA: Centros de Atención Primaria de la Salud refaccionados y equipados	nro CAPs refaccionados	P	-	50	-	12,000,000
			P (a)	-	68	4,310,000	11,996,000
			A	16	84	4,049,000	9,143,000
3.06	AMBA: Adquisición de Equipamiento Informático para la Red AMBA Salud HCE	Cantidad de equipos	P	-	-	-	-
			P (a)	240	1,340	377,000	898,000
			A	440	1,540	-	823,000

Other Cost				
	Administración y gestión	P		3,875,000
		P (a)	112,000	3,874,000
		A	111,000	1,630,017
Total Cost				
	Total Cost	P	0	40,446,000
		P (a)	16,034,000	38,988,074
		A	12,887,000	24,595,275

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	AM Mendoza – Centro de Gestión de semaforización	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
	AM Mendoza: Censo arbolado finalizado y en linea	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
	AM Mendoza: Ciclovías en el área metropolitana de Mendoza construidas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
	AM Rosario: Refuncionalización Predio Paganini	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
	AMBA: Adquisición de Equipamiento Informático para la Red AMBA Salud HCE	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
	AMBA: Centros de Atención Primaria de la Salud refaccionados y equipados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
	Estudios de preinversión para inversiones metropolitanas no financiadas con DAMI-II.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
	Proyectos de desarrollo institucional formulados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Sustainability
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Integrity
	Response Actions		
	3	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Human Resources
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	5.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE



Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Human Resources
	Response Actions		
	6.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	6.02	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	7.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Monitoring & Evaluation
