

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):

Secteur: WATER AND SANITATION-SEWERAGE

Numéro(s) de Prêt(s): 2322/OC-VE

Étape: Approved

Type d' Opération: INV - Investissement

Opération(s) Connexe(s): VE-T1017, VE-T1021, RG-P1400

Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 140.000.000,00

Montant Décaissé à ce Jour: 3.390.527,59

% Décaissé: 2,42

Solde: 136.609.472,41

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 140.000.000,00

Courant BID: 140.000.000,00

Pari Passu: 70,00

Cofinancement/Pays: 60.000.000,00

Estimation Initiale: 200.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 10-may-2012

Validé par le Représentant: 10-may-2012

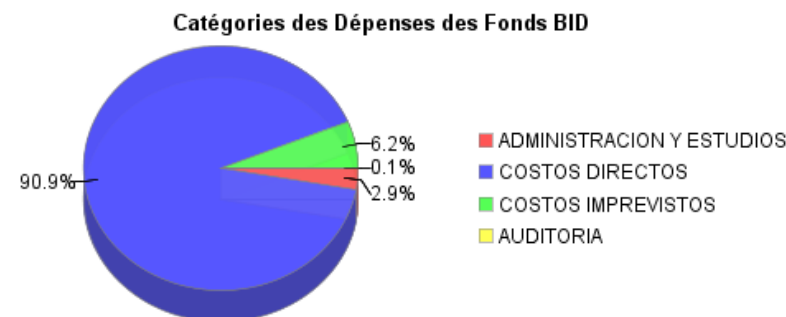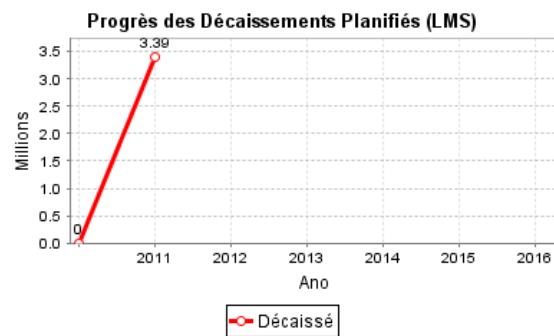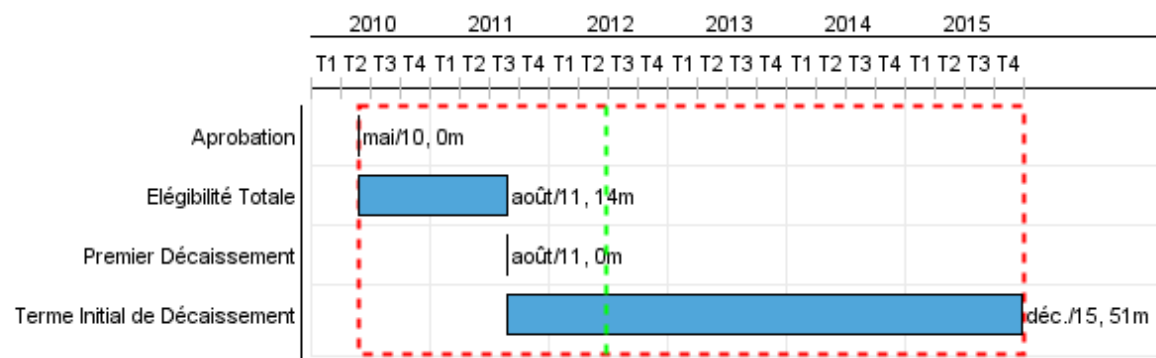

Progrès Cumulé à 2011

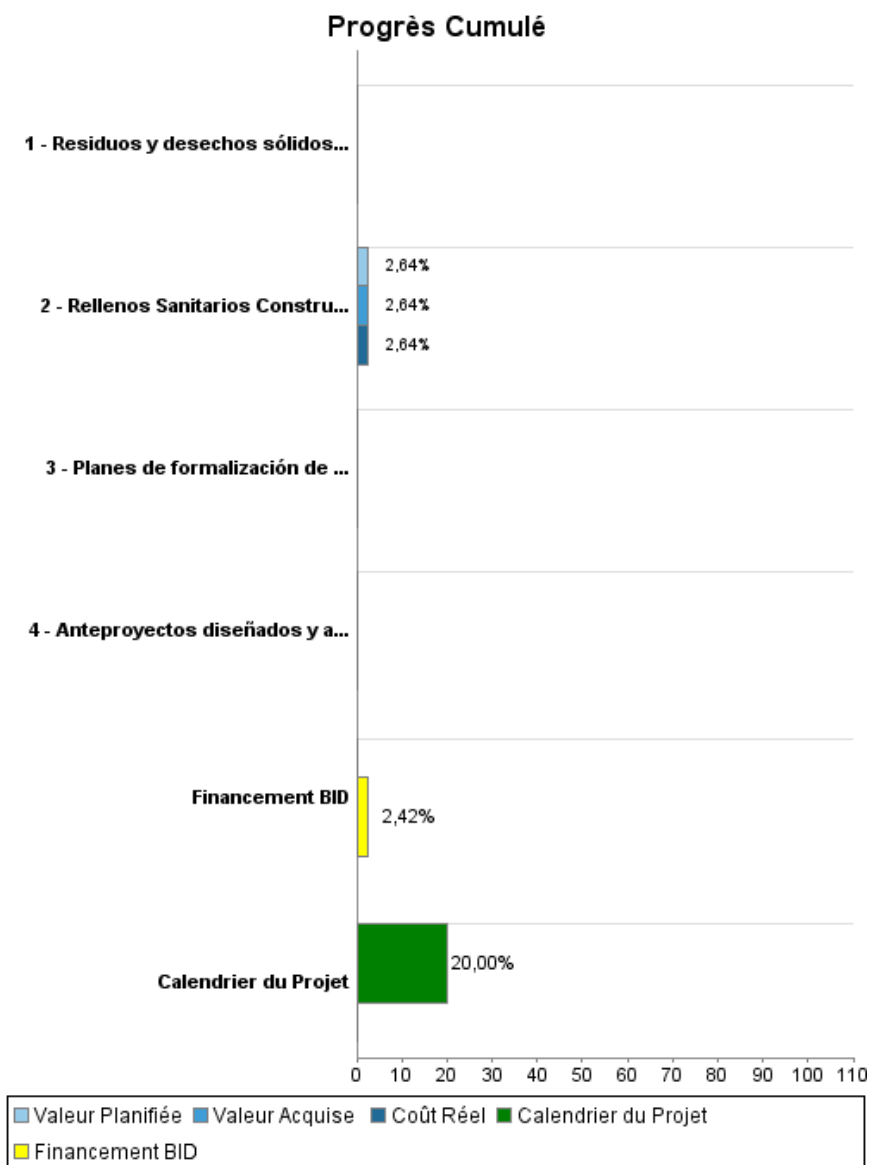

Résultats

Résultat:	Residuos y desechos sólidos (RDS) dispuestos adecuadamente en los proyectos beneficiados con el Programa.
Observações:	Datos de línea base y logrados son acumulativos en relación a los proyectos elegibles del Programa.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Residuos y desechos sólidos (RDS) enviados a vertederos a cielo abierto no controlados.	ton/día	1,100.00	2011	P A	0,00

Résultat:	Sustentabilidad Ambiental y Social lograda en lo que a Residuos y Desechos (RDS) se refiere en los proyectos beneficiados por el Programa.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Residuos y desechos sólidos (RDS) separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.	ton/día	0.20	2011	P A	4,00

Résultat:	Fortalecimiento Institucional facilitado en las zonas beneficiadas por el Programa.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Planes de Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.	Plan		2011	P A	5,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional									
Anteproyectos diseñados y aprobados.	Anteproyecto				3,00				3.800.000,00
Planes de formalización de segregadores elaborados.	Plan				4,00				800.000,00
Infraestructura y Mejora Operacional									
Rellenos Sanitarios Construidos.	Relleno				5,00		3.571.115,06		135.200.000,00
Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Ton/día				1.100,00				39.600.000,00
Costos administrativos y de supervisión									
Costos imprevistos									
Auditoría									
TOTAL							3.571.115,06		179.400.000,00
