




## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE FINANZAS				
Sector:	TRADE-SUPPORT OF TRADE ACTIVITIES				
Loan Number(s):	2467/BL-HO	Current Approved Amount:	10.000.000,00	Original IDB:	10.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	10.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	HO-P1061, RG-P1400	Balance:	10.000.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	10.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	Apr 8, 2011
		Validated by Country Representative:	Apr 15, 2011

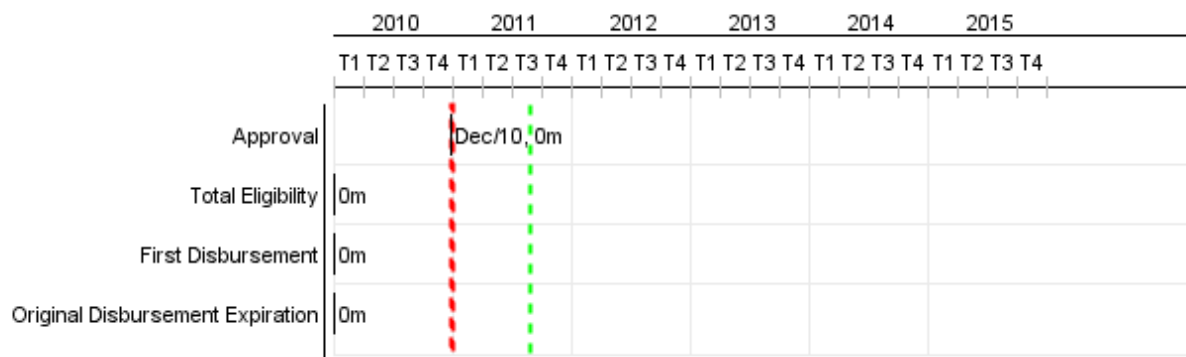

## Accumulated Progress as of 2010



## Outcomes

**Outcome:** Capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	End of project
Porcentaje de las declaraciones de importación, exportación y tránsito revisadas con base en análisis de riesgo, bajo reglas probabilísticas y aleatorias	Porcentaje	41,00	2010	P A					85,00
Eficacia en la selección medida por el porcentaje de liquidaciones complementarias efectuadas en el despacho (canal rojo y naranja).	Porcentaje	8,60	2010	P A		30,00			60,00
Recaudación proveniente de pago electrónico.	Porcentaje	12,00	2010	P A	25,00	50,00	65,00	90,00	90,00
Porcentaje de declaraciones de importación que aplican uso de reglas varias y probabilísticas en la selección mediante el análisis de riesgo	Porcentaje	4,00	2010	P A			50,00		95,00
Porcentaje de declaraciones de importación asignado a los canales rojo y naranja	Porcentaje	89,44	2010	P A		75,00			55,00
Cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de una fiscalización	Porcentaje	21,00	2011	P A					32,00
Incautaciones por ilícitos y contrabando	Incautaciones	70,00	2010	P A					140,00

**Outcome:** Facilitación operativa mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	End of project
Porcentaje de declaraciones de importación y exportación tramitadas con certificación electrónica	Porcentaje		2011	P A			60,00		95,00
Porcentaje de tránsitos internacionales tramitados por sistema TIM en Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A		50,00			100,00
Tiempos de despacho de tránsitos internacionales de mercancías en Puerto Cortés mediante el sistema del TIM	Porcentaje		2011	P A		50,00			70,00
Tiempo promedio de despacho de la declaración de importación	Horas	18,80	2010	P A			10,00		6,00

**Outcome:** Nueva infraestructura y equipamiento de Puerto Cortés en operación

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	End of project
Adjudicación de las obras del edificio de la Aduana de Puerto Cortés	Adjudicación		2010	P A		1,00			1,00
Porcentaje de usuarios externos e internos satisfechos con los servicios de la Aduana de Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A					70,00
Incremento en la disponibilidad de servicios informáticos y telecomunicaciones	Porcentaje	94,16	2010	P A					99,50
Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas	Ranking	93,00	2010	P					90,00



## PROGRESS MONITORING REPORT

HO-L1055 - Puerto Cortés Customs Modernization  
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 22/03/2011

elaborado por el Foro Económico Mundial				A					
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización y Seguridad en Puerto Cortes</b>									
Sistema de información y despacho anticipado implementado	Sistema				1,00				555.000,00
Oficina de Analisis de Riesgo operativa	Oficina				1,00				421.000,00
Estudio de Seguridad en recintos y costas elaborado	Estudio				1,00				400.000,00
Equipos no intrusivos de control adquiridos	Equipos				1,00				1.160.000,00
Laboratorio de Aduanas en funcionamiento	Laboratorio				1,00				300.000,00
Oficina de Fiscalización Operativa	Individuos				20,00				90.000,00
<b>Coordinación y Facilitación Operativa</b>									
Certificados de otros organismos (agricultura, sanidad, etc.) necesarios para realizar operaciones aduaneras que están operativos para su tramite en linea y su control (REVISAR LINEA DE BASE)	Certificados				50,00				368.000,00
Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en Puerto Cortés	Sistema				1,00				200.000,00
Diagnóstico de requerimientos para la implantación del TIM transoceánico elaborado	Diagnóstico				1,00				100.000,00
<b>Fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes</b>									
Aduana de Puerto Cortes Hondureña modernizada	Proyectos				1,00				
Edificio de la Aduana de Puerto Cortés reacondicionado	Edificio				1,00				1.900.000,00
Data Center Instalado	Data Center				1,00				2.246.000,00
<b>Gestion del programa</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>7.740.000,00</b>
