
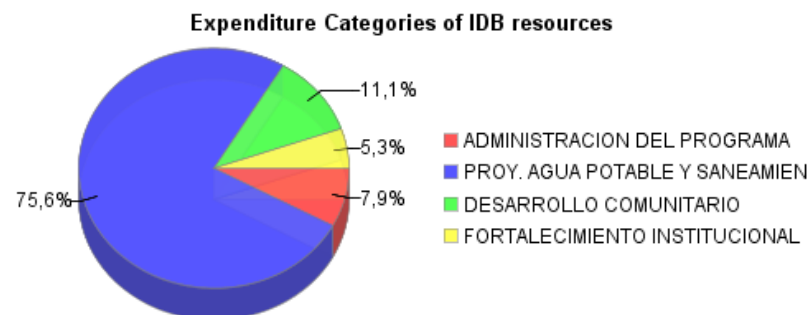
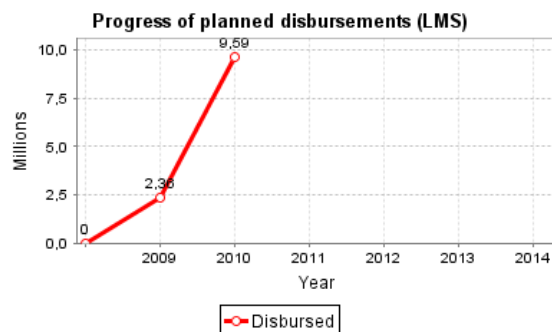



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL	Current Approved Amount:	21.000.000,00	Original IDB:	21.000.000,00
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE	Disbursed Amount to Date:	10.256.976,36	Current IDB:	21.000.000,00
Loan Number(s):	1927/BL-BO	% Disbursed:	48,84	Pari-passu:	85,29
Stage:	Approved	Balance:	10.743.023,64	Co-Financing/Country:	3.500.000,00
Operation Type:	INV - Investment			Original Estimate:	24.500.000,00
Related Operation(s):				Amortization Period (months):	276
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation				

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 30, 2011 Validated by Country Representative: Apr 19, 2011

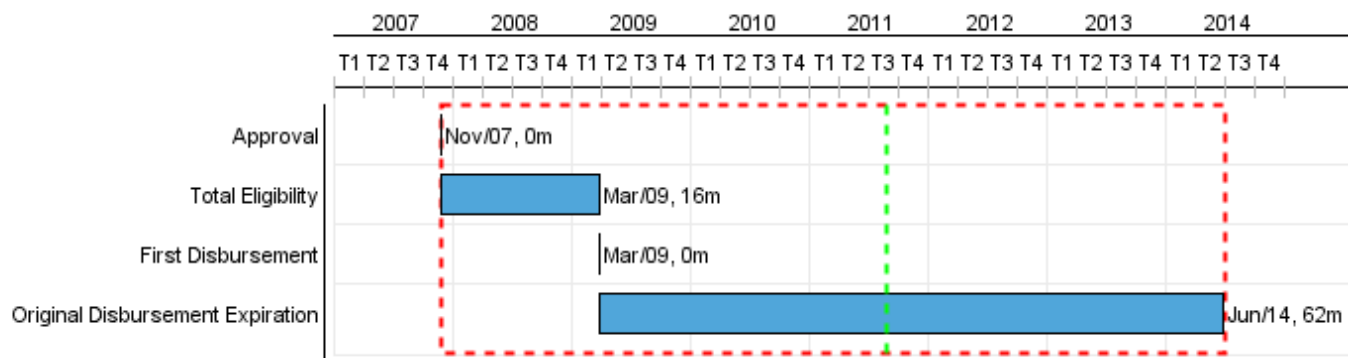

Accumulated Progress as of 2010

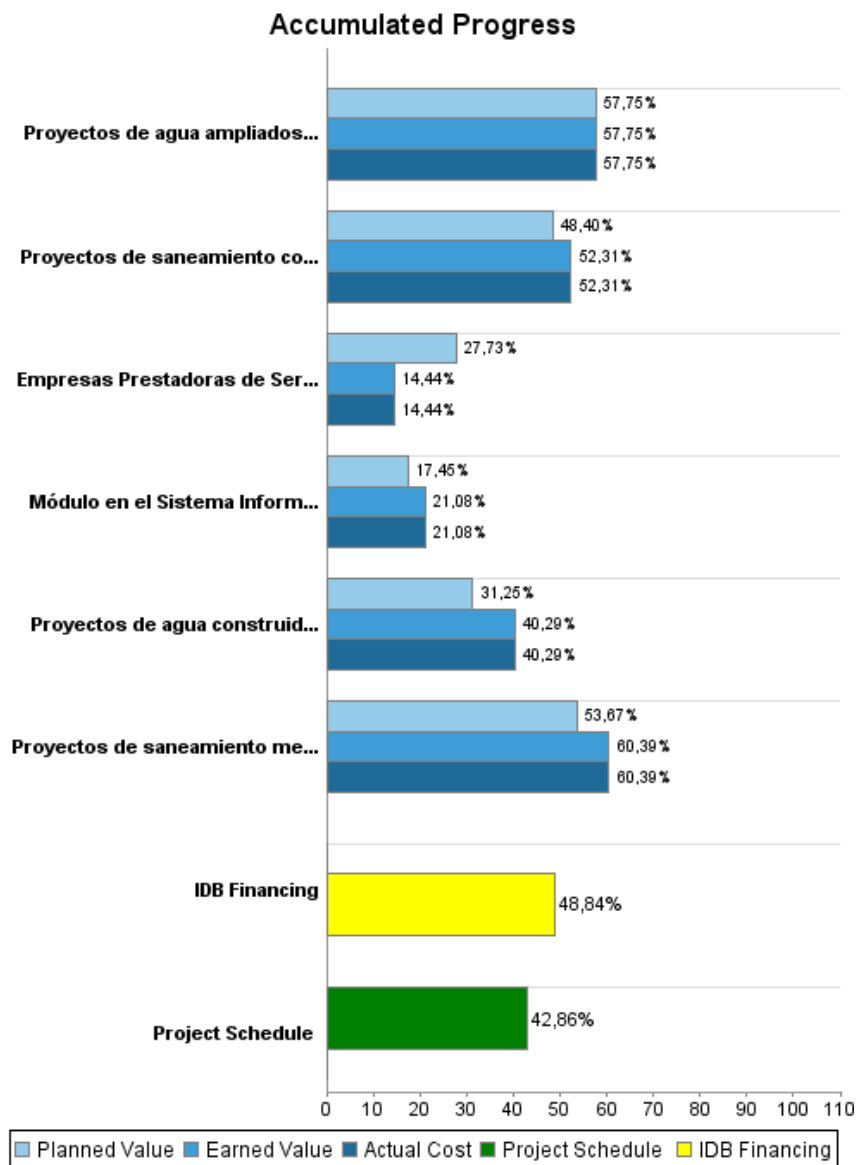

Outcomes

Outcome:	Calidad de vida de los beneficiarios mejorada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	End of project
Hogares con suministro de agua mejorado	Hogar		2010	P A		0,00
Hogares con suministro de agua nuevo	Hogar		2010	P A		0,00
Hogares con conexiones sanitarias mejoradas	Hogar		2010	P A		0,00
Hogares con conexiones sanitarias nuevas	Hogar		2010	P A		0,00

Outcome:	Sostenibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado mejorada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	End of project
Empresas con equilibrio financiero	Empresas		2010	P A		34,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Proyectos de agua potable y saneamiento básico									
Proyectos de agua construidos hasta el final del programa	Proyectos		5,00		15,00	2.418.139,00	3.213.083,99		8.795.876,00
Proyectos de agua ampliados hasta el final del programa (incluye mejoramiento)	Proyectos		5,00		9,00	462.937,00	462.937,00		1.308.809,00
Proyectos de saneamiento construidos hasta el final del programa	Proyectos		9,00		21,00	3.147.612,00	3.449.279,00		7.705.770,00
Proyectos de saneamiento mejorados hasta el final del programa	Proyectos				2,00	576.703,00	648.962,00		1.074.544,00
Desarrollo Comunitario									
Empresas Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado EPSAS con estado financiero	EPSAS				34,00	743.353,00	366.603,00		2.832.750,00
Fortalecimiento institucional									
Módulo en el Sistema Informático de administración de proyectos implementado	Módulo				1,00	70.000,00	110.738,00		1.121.363,00
TOTAL						7.418.744,00	8.251.602,99		22.839.112,00
