
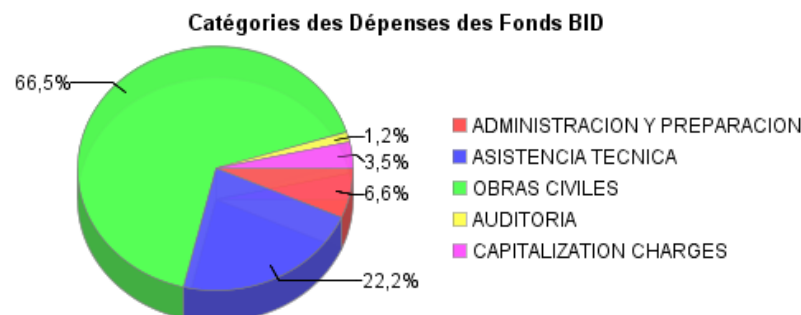
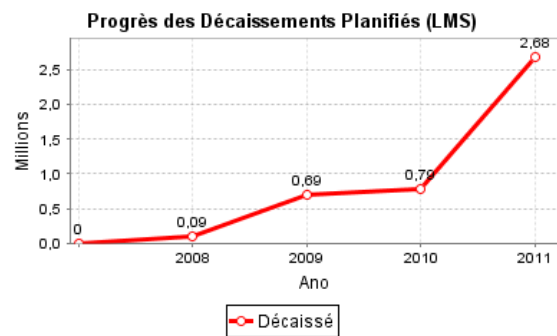



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL		
Secteur:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY		
Numéro(s) de Prêt(s):	1793/SF-HO	Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	2.678.804,92
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	8,93
Opération(s) Connexe(s):	TC0203009	Solde:	27.321.195,08
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing		
		Initial BID:	30.000.000,00
		Courant BID:	30.000.000,00
		Pari Passu:	92,00
		Cofinancement/Pays:	2.540.000,00
		Estimation Initiale:	32.540.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 28, 2011 Validé par le Représentant: Sep 30, 2011

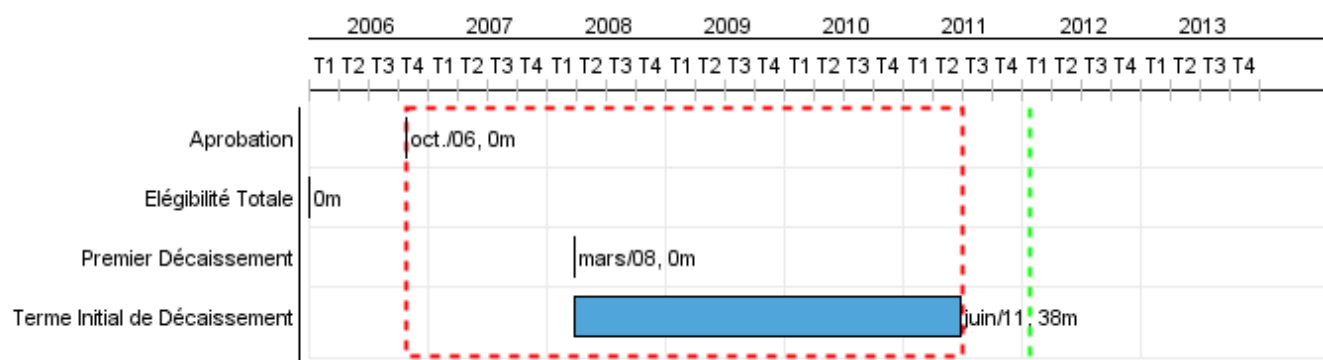

Progrès Cumulé à 2011

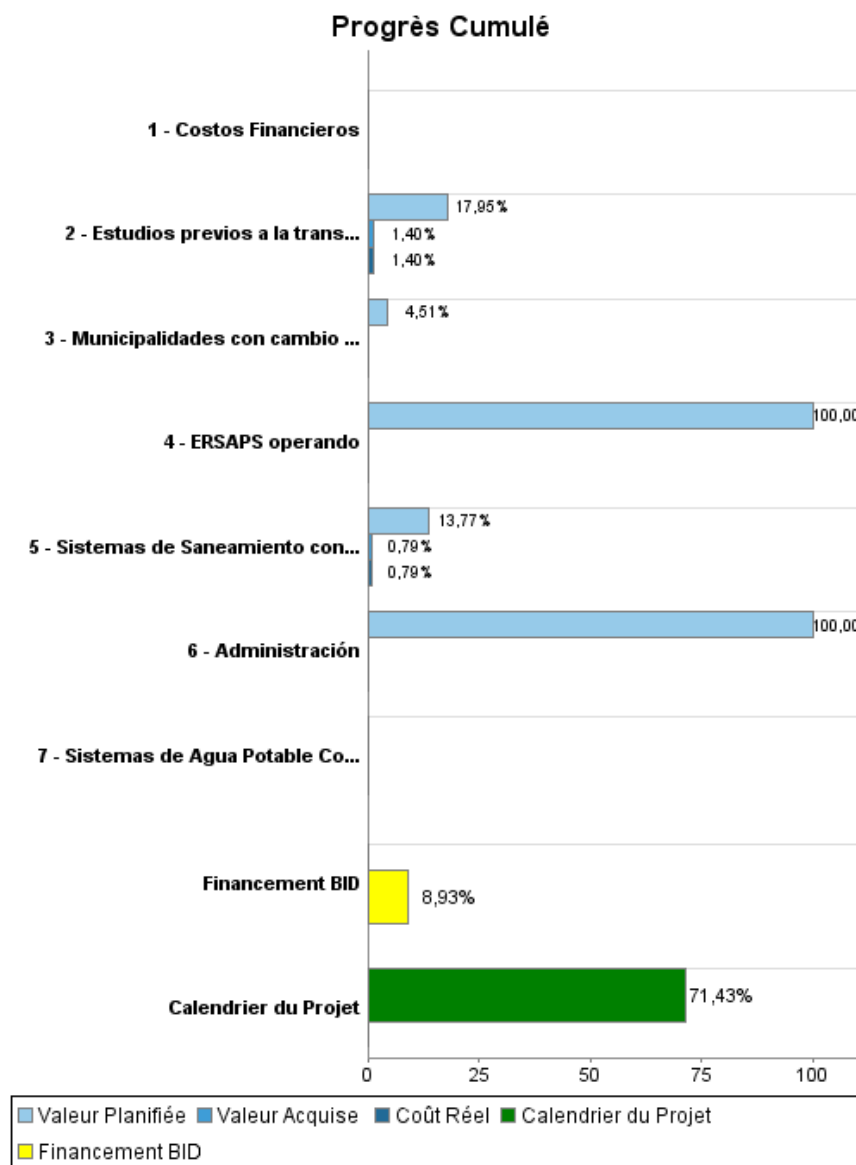

Résultats

Résultat:	Cobertura de agua potable mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos
Suposições:	1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2012	2013	2014	Fin du Projet
Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable	Hogares		2009	P A					11.470,00	11.470,00

Résultat:	Cobertura de saneamiento mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos
Suposições:	1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2012	2013	2014	Fin du Projet
Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado	Hogares		2011	P A			1.315,00		7.379,00	8.694,00

Résultat:	Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a normativas locales
Suposições:	1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2012	2013	2014	Fin du Projet
Operadores de Sevicios de Agua Potable y Saneamiento opererando de acuerdo a normativa de Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	Operadores		2010	P A			9,00		21,00	21,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I: Asistencia Tecnica para el cambio Institucional									
Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) al la Alcaldía Municipal realizados	Estudios				5,00	331.000,00			2.000.000,00
Municipalidades con cambio institucional implementado	Municipios	5,00			21,00	132.000,00			2.925.000,00
Componente II. Obras Civiles construidas									
Sistemas de Saneamiento construidos	Sistemas				20,00	2.691.705,00	154.487,00		19.542.293,00
Sistemas de Agua Potable Construidos	Sistema				4,00				5.287.747,00
Gestión del Programa									
TOTAL						3.154.705,00	154.487,00		29.755.040,00
