
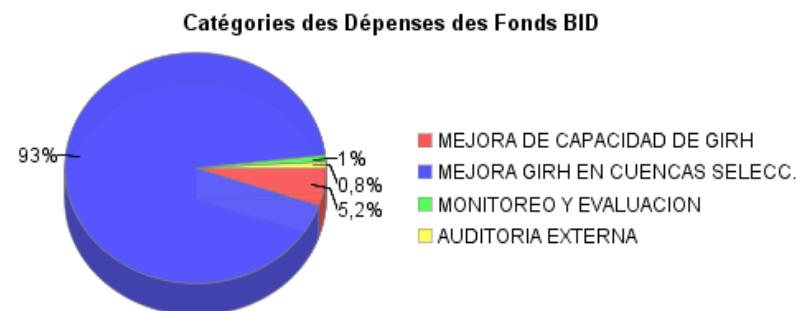




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Autoridad Nacional del Agua				
Secteur:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY				
Numéro(s) de Prêt(s):	2166/OC-PE	Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00	Initial BID:	10.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	10.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	10.000.000,00	Cofinancement/Pays:	9.579.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	19.579.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 24, 2011 Validé par le Représentant: Mar 29, 2011

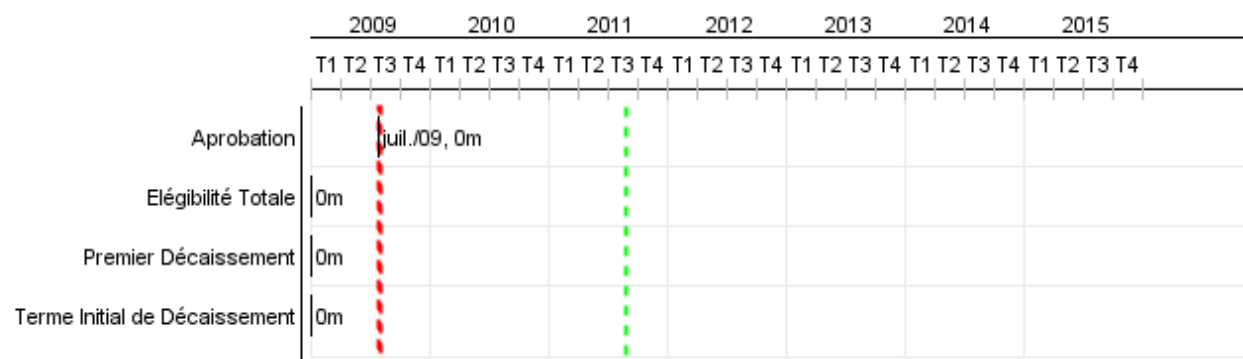

Progrès Cumulé à 2010

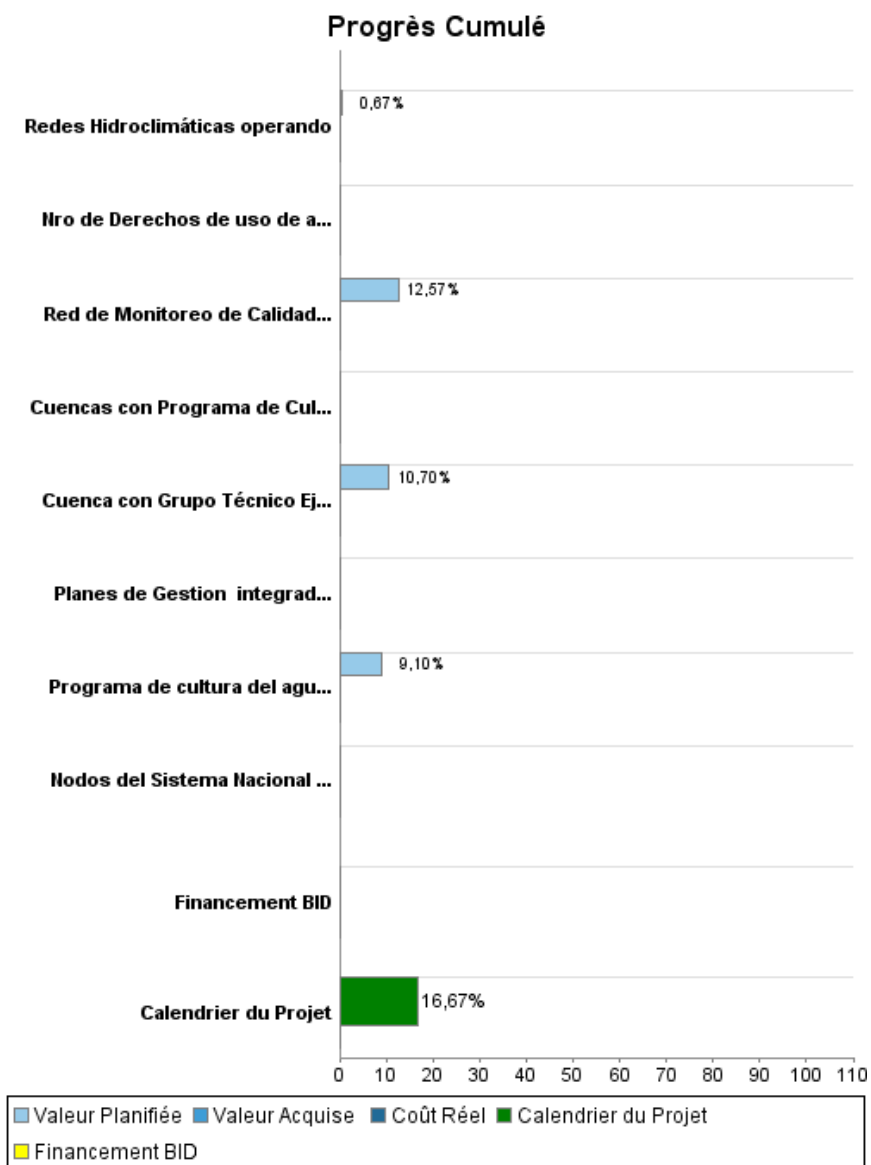

Résultats

Résultat:	Capacidad en la gestion de Recursos Hídricos en las cuencas Chira-Piura, Tacna y Santa mejorada.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2015	Fin du Projet
Valor unitario promedio de la recaudacion incrementado en las tres cuencas.	Centavos de US\$/m3	3,00	2009	P A	3,90	4,50	4,50
Planes de Gestion aprobados por la Autoridad Nacional del Agua	Planes		2009	P A		3,00	3,00
Conflictos locales en las Cuencas por el uso de agua con actas de acuerdos firmados por las partes	Actas		2009	P A	4,00	10,00	10,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Mejora de la Capacidad de GIRH a nivel nacional									
Nodos del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos operando.	Nodos				3,00				931.500,00
Programa de cultura del agua a nivel nacional difundido	Campañas				5,00	46.316,00			509.003,00
Mejora de la GIRH en cuencas seleccionadas									
Cuenca con Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) puesto en operación	Cuenca				3,00	863.047,00			8.069.389,00
Planes de Gestión integrada de Recursos Hídricos, validados por el Consejo de Cuenca	Informes				10,00				2.076.500,00
Nro de Derechos de uso de agua (agrario y poblacional) formalizados mediante Resolución de Otorgamiento	Resolución				100,00				700.000,00
Redes Hidroclimáticas operando	Redes				3,00	20.526,00			3.044.723,00
Red de Monitoreo de Calidad del Agua implementada	Redes				3,00	208.263,00			1.657.261,00
Cuencas con Programa de Cultura de Agua Ejecutado	Cuenca				3,00				1.327.496,00
TOTAL						1.138.152,00			18.315.872,00
