

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PN-L1107	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/20/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/15/20
<b>Last Update</b>	03/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/30/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Customs Logistics Integration Program	<b>Loan Number</b>	4517/OC-PN
<b>Executing Agency</b>	Autoridad Nacional de Aduanas	<b>Sector/Subsector</b>	TR-FRA - TRANSPORT-BORDER CROSSINGS AND INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT FOR BORDER CROSSINGS.
<b>Team Leader</b>	LIBBY HERNANDEZ, MARGARITA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Panama
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PANAMA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1107	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0.00%	75,000,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0.00%	75,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

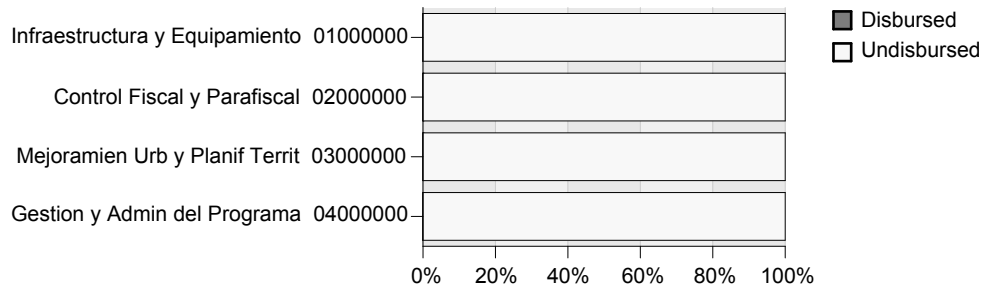

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Mejora del desempeño del sector logístico de Panamá

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Índice de desempeño logístico	Indicador	3.34	2016	P		3.50
					P(a)	3.50	3.50
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reporte de Índice de Desempeño Logístico Banco Mundial

**Observations:** Refleja las percepciones de la logística de un país. El índice varía entre 1 y 5.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.1	Valor del comercio a través de la frontera de Paso Canoas/PIB nacional	%	2.70	2014	P		3.00
					P(a)	3.00	3.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de la Autoridad Nacional de Aduanas

**Observations:** La línea de base fue: US\$1.250 millones/US\$46,21 miles de millones

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Mejorada de la eficiencia operativa de los pasos de frontera de Panamá, a través de la reducción en los costos operativos en los procesos de control y la reducción de tiempos de pasos de personas y mercancías

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Costo total del proceso de importación sanitaria	US\$/Trámite	169.34	2015	P		115.32
					P(a)	115.32	115.32
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e informe de consultoría

**Observations:** Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.1	Costo total del proceso de importación no sanitaria	US\$/Trámite	137.24	2015	P		106.11
					P(a)	106.11	106.11
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.2	Costo total del proceso de exportación sanitaria	US\$/Trámite	150.17	2015	P		60.20
					P(a)	60.20	60.20
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.3	Costo total del proceso de exportación no sanitaria	US\$/Trámite	108.80	2015	P		60.18

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.3	Costo total del proceso de exportación no sanitaria	US\$/Trámite	108.80	2015	P(a)	60.18	60.18
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.4	Costo total del proceso de tránsito sanitario entrando	US\$/Trámite	39.95	2017	P		20.76
					P(a)	20.76	20.76
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.5	Costo total del proceso de tránsito no sanitario entrando	US\$/Trámite	12.88	2015	P		12.47
					P(a)	12.47	12.47
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.6	Costo total del proceso de tránsito sanitario saliendo	US\$/Trámite	64.95	2015	P		0.10
					P(a)	0.10	0.10
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Observations:** Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.7	Costo total del proceso de tránsito no sanitario saliendo	US\$/Trámite	28.46	2015	P		0.10
					P(a)	0.10	0.10
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.8	Costo total del proceso de vacíos entrando	US\$/Trámite	9.93	2015	P		9.70
					P(a)	9.70	9.70
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.9	Costo total del proceso de vacíos saliendo	US\$/Trámite	0.74	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.10	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la	Horas/UT	10.00	2015	P		1.04

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.10	frontera en importación sanitaria	Horas/UT	10.00	2015	P(a)	1.04	1.04
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.11	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en importación no sanitaria	Horas/UT	8.10	2015	P		0.92
					P(a)	0.92	0.92
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.12	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en exportación sanitaria	Horas/UT	14.60	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.13	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en exportación no sanitaria	Horas/UT	7.90	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		
Details							

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.14	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito sanitario entrando	Horas/UT	8.10	2015	P		0.93
					P(a)	0.93	0.93
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Consultoría Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.15	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito sanitario saliendo	Horas/UT	13.80	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.16	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito no sanitario entrando	Horas/UT	7.30	2015	P		0.89
					P(a)	0.89	0.89
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.17	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito no sanitario saliendo	Horas/UT	7.30	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.18	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en vacíos entrando	Horas/UT	7.20	2015	P		0.76
					P(a)	0.76	0.76
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.19	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en vacíos saliendo	Horas/UT	4.80	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: Datos línea de base/metas e Informe de Consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.20	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de buses internacionales Costa Rica a Panamá	Minutos/ pasajero	61.00	2015	P		33.50
					P(a)	33.50	33.50
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.21	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de buses internacionales Panamá a Costa Rica	Minutos/ pasajero	64.00	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.22	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de vehículos particulares Costa Rica a Panamá	Minutos/ pasajero	29.90	2015	P		14.50
					P(a)	14.50	14.50
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.23	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de vehículos particulares Panamá a Costa Rica	Minutos/ pasajero	23.90	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.24	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de peatones Costa Rica a Panamá	Minutos/ pasajero	3.80	2015	P		2.80
					P(a)	2.80	2.80
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.25	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de peatones Panamá a Costa Rica	Minutos/ pasajero	4.10	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.26	Capacidad máxima de procesamiento del puesto fronterizo en importación	UT/día	806.00	2015	P		1,361.00
					P(a)	1,361.00	1,361.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Este nivel se cuantifica mediante simulación de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.27	Capacidad máxima de procesamiento del puesto fronterizo en exportación	UT/día	801.00	2015	P		1,352.00
					P(a)	1,352.00	1,352.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

**Observations:** Este nivel se cuantifica mediante simulación de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.28	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de importación sanitaria	KgCO2e/UT	101.30	2015	P		10.50
					P(a)	10.50	10.50
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.29	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de tránsito sanitario entrando	KgCO2e/UT	81.90	2015	P		9.40
					P(a)	9.40	9.40
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.30	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de exportación sanitaria	KgCO2e/UT	147.10	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.31	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de tránsito sanitario saliendo	KgCO2e/UT	139.90	2015	P		0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos línea de base/metás e Informe de Consultoría

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.32	Medios de transporte que llegan dentro del plazo de tránsito legal establecido	%	0.00	2017	P		90.00
					P(a)	90.00	90.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe del Centro de Control y Monitoreo

**Observations:** Plazo tránsito legal establecido en el Decreto de Gabinete 12 del 29/03/2016

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.33	Índice de rastreo y trazabilidad de LPI	Índice	2.95	2017	P		3.00
					P(a)	3.00	3.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe Logistic Performance Index

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Mejorada la eficacia de la gestión aduanera en Panamá, mediante la implementación de sistemas y tecnología que permita intercambiar la información e interoperar los sistemas de las instituciones de control fiscal y parafiscal

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Acuerdos de integración e iniciativas de cooperación regional y subregional apoyadas	Integration agreements and cooperation	0.00	2015	P		5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.0	Acuerdos de integración e iniciativas de cooperación regional y subregional apoyadas	initiatives (#)	0.00	2015			
Details							
Means of verification: Informe de cumplimiento de acuerdos apoyados							
Observations: Se elaborará el informe de acuerdo a los datos del Ministerio de Comercio e Industrias y Organización Mundial del Comercio							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.1	Declaraciones Únicas de Tránsito (DUT) de tránsitos de entrada y salida en territorio panameño que se tramitan por medio del Sistema de Gestión Aduanera para el procedimiento de tránsito.	% DUT tramitadas	0.00	2017	P		100.00
					P(a)	100.00	100.00
					A		
Details							
Means of verification: Estadísticas de DUCA-T y de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.2	Operaciones aduaneras de importación cuya información se envía en forma electrónica y anticipada	% operaciones	0.00	2017	P		50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		
Details							
Means of verification: Estadísticas anuales de gestión aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.3	Operaciones aduaneras de exportación cuya información se envía en forma electrónica y anticipada	% operaciones	0.00	2017	P		50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		
Details							
Means of verification: Estadísticas de gestión aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	Declaraciones aduaneras procesadas en Paso Canoas anualmente	Número de declaraciones	29,909.00	2015	P		36,895.00
					P(a)	36,895.00	36,895.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas anuales de gestión aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas

**Observations:** Declaraciones aduaneras procesadas exitosamente por año en Paso Canoas. Se asume tasa de crecimiento igual a la esperada para el valor del comercio por ese puesto fronterizo

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.5	Notas técnicas de importación tramitadas vía plataforma VUCE	%	0.00	2017	P		25.00
					P(a)	25.00	25.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.6	Notas técnicas de exportación tramitadas vía plataforma VUCE	%	0.00	2017	P		25.00
					P(a)	25.00	25.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.7	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal rojo en régimen de importación	%	7.00	2015	P		10.00
					P(a)	10.00	10.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas

**Observations:** El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o "no revisión"

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.8	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal amarillo en régimen de importación	%	5.00	2015	P		2.00
					P(a)	2.00	2.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas

**Observations:** El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o “no revisión”

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.9	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal rojo en régimen de exportación	%	2.00	2015	P		2.00
					P(a)	2.00	2.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas

**Observations:** El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o “no revisión”

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.10	Tiempo trámite de presentación de declaración de mercancías a despacho	Horas/trámite	5.00	2017	P		1.00
					P(a)	1.00	1.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe Sistema ANA

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Incrementada la capacidad institucional para atender casos de victimización contra grupos vulnerables en los pasos de frontera

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Casos delictivos o victimización identificados, registrados y atendidos que transitan los pasos de frontera	Número/ 100,000 personas	0.00	2015	P		20.00
					P(a)	20.00	20.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.0	Casos delictivos o victimización identificados, registrados y atendidos que transitan los pasos de frontera	Número/ 100,000 personas	0.00	2015	A		
Details							
<b>Means of verification:</b> Informes del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales							
<b>Observations:</b> Casos que afecten o victimicen a mujeres, grupos indígenas o, menores de edad, tales como proxenetismo, trata de personas, raptos.							
<b>Pro-Gender</b>		Yes			<b>Pro-Ethnicity</b>		No

**Outcome Nbr. 3:** Mejorada la percepción de la calidad de la infraestructura y los servicios en la cabecera panameña del paso de frontera Paso Canoas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.0	Índice de satisfacción de los usuarios turistas de los pasos de frontera	%	54.00	2015	P		90.00
					P(a)	90.00	90.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe consultoría. Encuesta de satisfacción							
Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes características críticas del servicio y la infraestructura: vías de acceso, infraestructura, tecnología y equipos, calidad del servicio, aspectos socioeconómicos y ambientales, costos, seguridad y evaluación general							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.1	Índice de satisfacción de los usuarios transportistas de los pasos de frontera	%	47.00	2015	P		90.00
					P(a)	90.00	90.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe consultoría. Encuesta de satisfacción							
Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes características críticas del servicio y la infraestructura: vías de acceso, infraestructura, tecnología y equipos, calidad del servicio, aspectos socioeconómicos y ambientales, costos, seguridad y evaluación general							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 4:** Mejoradas las condiciones urbanísticas de las comunidades fronterizas contribuye al buen funcionamiento y la sostenibilidad de los pasos de frontera

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
4.0	Incremento de inversión municipal promedio anual	US\$	4.87	2015	P		5.87

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

4.0	ejecutada de acuerdo con la regulación contenida en los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial (PPOT) en los pasos de frontera identificados	US\$	4.87	2015	P(a)	5.87	5.87
					A		
Details							
Means of verification: Informes ejecución proyecto e Informes gestión financiera municipal							
Observations: Se tomarán en consideración las inversiones que las Municipalidades de Barú, Bugaba, Renacimiento y Changuinola realicen en materia de infraestructura y servicios públicos, tanto con presupuesto ordinario como con el financiamiento							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Equipamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Paso Canoas construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Paso de Frontera	P	0	1	0	29,450,000
			P(a)	0	1	0	36,250,000
			A	0	0	0	0
1.2	Río Sereno construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Paso de Frontera	P	0	1	0	1,760,000
			P(a)	0	1	0	280,000
			A	0	0	0	0
1.3	Guabito construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Paso de Frontera	P	0	1	0	12,275,000
			P(a)	0	1	0	10,685,000
			A	0	0	0	0
1.4	Sistema Radio Frequency Identification Device instalado en rutas fiscales y puntos fronterizos	Sistema	P	0	1	0	778,000
			P(a)	0	1	0	778,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente 2: Procesos de Control Fiscal y Parafiscal Eficientes y Efectivos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Sistemas y procesos para la Gestión Coordinada de Fronteras implementados y funcionando	Unidad	P	0	1	0	20,600,000
			P(a)	0	1	0	18,500,000
			A	0	0	0	0
2.2	Catálogos de procesos para Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) desarrollados	Catálogos	P	0	4	0	0
			P(a)	0	4	0	0
			A	0	0	0	0
2.3	Interfase de conexión entre plataformas informáticas de Panamá y Costa Rica	Interfase	P	0	1	0	0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.4	Programa de Operador Económico Autorizado (OEA) implementado	Operador	P	0	3	0	0
			P(a)	0	3	0	0
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Componente 3: Mejoramiento Urbano y Planificación Territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Planes Parciales de Ordenamiento Territorial formulados, aprobados y ejecutados	Plan	P	0	3	0	4,850,000
			P(a)	0	3	0	3,775,000
			A	0	0	0	0
3.2	Estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los pasos de frontera	Estudio	P	1	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	25,000
			A	0	0	0	0
3.3	Funcionarios públicos capacitados y sensibilizados en temas de género	Funcionario	P	0	150	0	40,000
			P(a)	0	150	0	10,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Gestión y Administración del Programa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
4.1	Gestión y Administración del Programa		P	0	0	0	4,035,000
			P(a)	0	0	0	3,535,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Imprevistos		P			0	1,162,000
			P(a)			0	1,162,000
			A			0	0

Total Cost

	Total Cost		P			0	75,000,000
			P(a)			0	75,000,000
			A			0	0

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Valor del comercio a través de la frontera de Paso Canoas/PIB nacional	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Índice de desempeño logístico	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
Outcome	Acuerdos de integración e iniciativas de cooperación regional y subregional apoyadas	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Capacidad máxima de procesamiento del puesto fronterizo en exportación	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Capacidad máxima de procesamiento del puesto fronterizo en importación	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Casos delictivos o victimización identificados, registrados y atendidos que transitan los pasos de frontera	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de exportación no sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de exportación sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de importación no sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de importación sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de tránsito no sanitario entrando	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de tránsito no sanitario saliendo	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de tránsito sanitario entrando	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de tránsito sanitario saliendo	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de vacíos entrando	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Costo total del proceso de vacíos saliendo	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Declaraciones aduaneras procesadas en Paso Canoas anualmente	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Declaraciones Únicas de Tránsito (DUT) de tránsitos de entrada y salida en territorio panameño que se tramitan por medio del Sistema de Gestión Aduanera para el procedimiento de tránsito.	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de exportación sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de importación sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de tránsito sanitario entrando	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de tránsito sanitario saliendo	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Incremento de inversión municipal promedio anual ejecutada de acuerdo con la regulación contenida en los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial (PPOT) en los pasos de frontera identificados	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal amarillo en régimen de importación	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal rojo en régimen de exportación	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal rojo en régimen de importación	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Medios de transporte que llegan dentro del plazo de tránsito legal establecido	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Notas técnicas de exportación tramitadas vía plataforma VUCE	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Notas técnicas de importación tramitadas vía plataforma VUCE	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome			Indicator			
	Operaciones aduaneras de exportación cuya información se envía en forma electrónica y anticipada	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Operaciones aduaneras de importación cuya información se envía en forma electrónica y anticipada	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de buses internacionales Costa Rica a Panamá	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de buses internacionales Panamá a Costa Rica	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de peatones Costa Rica a Panamá	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de peatones Panamá a Costa Rica	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de vehículos particulares Costa Rica a Panamá	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de vehículos particulares Panamá a Costa Rica	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en exportación no sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en exportación sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en importación no sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en importación sanitaria	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito no sanitario entrando	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito no sanitario saliendo	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito sanitario entrando	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo total promedio de ciclo de paso	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz	Modify	Modify EOP	JOSEFA	03/06/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	por la frontera en tránsito sanitario saliendo	de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Outcome Indicator	P(a)		
	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en vacíos entrando	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en vacíos saliendo	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Tiempo trámite de presentación de declaración de mercancías a despacho	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Índice de rastreo y trazabilidad de LPI	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Índice de satisfacción de los usuarios transportistas de los pasos de frontera	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
	Índice de satisfacción de los usuarios turistas de los pasos de frontera	Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificación actualizada (P(a)) del cumplimiento de la matriz de impacto y resultados, acorde a las metas previstas en la planificación inicial.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOSEFA	03/06/2020
Output	Estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los pasos de frontera	Se realizó un nuevo estudio para la Elaboración de Presupuesto Paramétrico Detallado del Proyecto del Centro de Control Nacional de Fronteras en Paso Canoas, arrojando como resultado el aumento del presupuesto originalmente concebido para el diseño y construcción de este puesto fronterizo. Dado lo anterior, fue necesario mediante un trabajo consensuado con la Unidad Ejecutora, realizar la replanificación de los recursos financieros destinados a los demás productos que componen el programa. Habiendo realizado esta replanificación financiera, vale aclarar que los alcances originales de cada producto se mantienen inalterables.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	03/06/2020
	Funcionarios públicos capacitados y sensibilizados en temas de género	Se realizó un nuevo estudio para la Elaboración de Presupuesto Paramétrico Detallado del Proyecto del Centro de Control Nacional de Fronteras en Paso Canoas, arrojando como resultado el aumento del presupuesto originalmente concebido para el diseño y construcción de este puesto fronterizo. Dado lo anterior, fue necesario mediante un trabajo consensuado con la Unidad Ejecutora, realizar la replanificación de los recursos financieros destinados a los demás productos que componen el programa. Habiendo realizado esta replanificación financiera, vale aclarar que los alcances originales de cada producto se mantienen inalterables.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	03/06/2020
	Gestión y Administración del Programa	Se realizó un nuevo estudio para la Elaboración de Presupuesto Paramétrico Detallado del Proyecto del Centro de Control Nacional de Fronteras en Paso Canoas, arrojando como resultado el aumento del presupuesto originalmente concebido para el diseño y construcción de este puesto fronterizo. Dado lo anterior, fue necesario mediante un trabajo consensuado con la Unidad Ejecutora, realizar la replanificación de los recursos financieros destinados a los demás productos que componen el programa. Habiendo realizado esta replanificación financiera, vale aclarar que los alcances originales de cada producto se mantienen inalterables.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	03/06/2020
	Guabito construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Se realizó un nuevo estudio para la Elaboración de Presupuesto Paramétrico Detallado del Proyecto del Centro de Control Nacional de Fronteras en Paso Canoas, arrojando como resultado el aumento del presupuesto originalmente concebido para el diseño y construcción de este puesto fronterizo. Dado lo anterior, fue necesario mediante un trabajo consensuado con la Unidad Ejecutora, realizar la replanificación de los recursos financieros destinados a los demás productos que componen el programa. Habiendo realizado esta replanificación financiera, vale aclarar que los alcances originales de cada producto se mantienen inalterables.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	03/06/2020
	Paso Canoas construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Se realizó un nuevo estudio para la Elaboración de Presupuesto Paramétrico Detallado del Proyecto del Centro de Control Nacional de Fronteras en Paso Canoas, arrojando como resultado el aumento del presupuesto originalmente concebido para el diseño y construcción de este puesto fronterizo. Dado lo anterior, fue necesario mediante un trabajo consensuado con la Unidad Ejecutora, realizar la replanificación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the	JOSEFA	03/06/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output		de los recursos financieros destinados a los demás productos que componen el programa. Habiendo realizado esta replanificación financiera, vale aclarar que los alcances originales de cada producto se mantienen inalterables.		Financial P(a).		
	Planes Parciales de Ordenamiento Territorial formulados, aprobados y ejecutados	Se realizó un nuevo estudio para la Elaboración de Presupuesto Paramétrico Detallado del Proyecto del Centro de Control Nacional de Fronteras en Paso Canoas, arrojando como resultado el aumento del presupuesto originalmente concebido para el diseño y construcción de este puesto fronterizo. Dado lo anterior, fue necesario mediante un trabajo consensuado con la Unidad Ejecutora, realizar la replanificación de los recursos financieros destinados a los demás productos que componen el programa. Habiendo realizado esta replanificación financiera, vale aclarar que los alcances originales de cada producto se mantienen inalterables.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	03/06/2020
	Río Sereno construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Se realizó un nuevo estudio para la Elaboración de Presupuesto Paramétrico Detallado del Proyecto del Centro de Control Nacional de Fronteras en Paso Canoas, arrojando como resultado el aumento del presupuesto originalmente concebido para el diseño y construcción de este puesto fronterizo. Dado lo anterior, fue necesario mediante un trabajo consensuado con la Unidad Ejecutora, realizar la replanificación de los recursos financieros destinados a los demás productos que componen el programa. Habiendo realizado esta replanificación financiera, vale aclarar que los alcances originales de cada producto se mantienen inalterables.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	03/06/2020
	Sistemas y procesos para la Gestión Coordinada de Fronteras implementados y funcionando	Se realizó un nuevo estudio para la Elaboración de Presupuesto Paramétrico Detallado del Proyecto del Centro de Control Nacional de Fronteras en Paso Canoas, arrojando como resultado el aumento del presupuesto originalmente concebido para el diseño y construcción de este puesto fronterizo. Dado lo anterior, fue necesario mediante un trabajo consensuado con la Unidad Ejecutora, realizar la replanificación de los recursos financieros destinados a los demás productos que componen el programa. Habiendo realizado esta replanificación financiera, vale aclarar que los alcances originales de cada producto se mantienen inalterables.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	03/06/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Project Monitoring & Evaluation
