

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CO-G1002	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/23/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/13/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Adaptation to Climate Impacts in Water Regulation and Supply for the Area of Chi	<b>Loan Number</b>	GRT/CX-14525-CO
<b>Executing Agency</b>	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	<b>Sector/Subsector</b>	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-CLIMATE CHANGE ADAPTATION POLICY
<b>Team Leader</b>	NAVIA DIAZ, MARIA DEL ROSARIO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Investment Grants	<b>Country</b>	Colombia
<b>Lending Instrument</b>		<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>			


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-G1002	4,215,750	4,215,750	11,409,000	0	15,624,750	4,215,750	3,810,696.42	90.39%	405,053.58
<b>Aggregated</b>	<b>4,215,750</b>	<b>4,215,750</b>	<b>11,409,000</b>	<b>0</b>	<b>15,624,750</b>	<b>4,215,750</b>	<b>3,810,696.42</b>	<b>90.39%</b>	<b>405,053.58</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

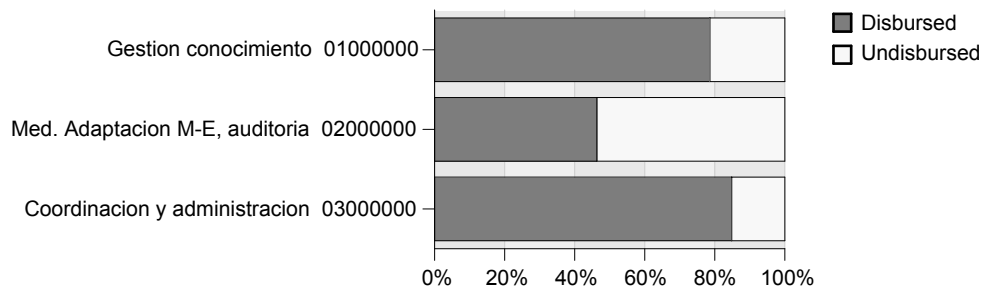

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Planes de uso del suelo y de gestión de cuencas que consideren vulnerabilidad al cambio climático

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
0.0	Planes (ordenamiento, cuenca) que incorporen evaluaciones de vulnerabilidad al cc	Und	0.00	2015	P			2.00	2.00	2.00		6.00
					P(a)			2.00	3.00	3.00	4.00	16.00
					A			2.00	2.00	8.00	13.00	12.00
Details												
Means of verification: Reporte validado por Ministerio												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

**Outcome Nbr. 1:** Adopción Medidas de adaptación al cambio climático

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.0	Familias que incorporan medidas de adaptación en sus procesos productivos	Und.	0.00	2015	P		20.00	120.00	120.00	100.00		360.00
					P(a)		20.00	120.00	180.00	180.00	17.00	381.00
					A		0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	364.00
Details												
Means of verification: Reporte validado por Ministerio												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.1	Nuevas propuestas para desarrollo e implementación de medidas de adaptación	Und.	0.00	2015	P				12.00	20.00		32.00
					P(a)				16.00	16.00		32.00
					A				0.00	32.00		32.00
Details												
Means of verification: Reporte validado por Ministerio												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Transferencia de información y conocimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Funcionarios del orden nacional, regional y local capacitados en el uso de escenario de cambio climático y análisis de vulnerabilidad.	Und.	P		500		1,220,000
			P(a)	37	616	61,156	133,179
			A	42	621	0	72,023
1.2	Reporte de vulnerabilidad con la evaluación de la respuesta hidrológica de los ecosistemas andinos a cambio climático	Und.	P		1		932,000
			P(a)		1	6,103	896,592
			A		1	0	890,489
1.3	Área del corredor cubierta con mapas indicando la distribución de variables climáticas bajo escenarios de cambio climático	Km2	P		5,500		1,617,000
			P(a)		7,580	939	260,201
			A		7,580	0	259,262
1.4	Área del corredor cubierta con mapas evaluando los cambios en la respuesta hidrológica esperada de los ecosistemas andinos a cambio climático	Km2	P		5,500		787,000
			P(a)	0	5,526	0	375,203
			A	0	5,526	0	375,203
1.5	Propuesta de EETA (Estructura Ecología Principal) que incorpore variabilidad y cambio climático.	Und	P		1		382,000
			P(a)		1	0	265,242
			A		1	0	265,242
1.6	Municipios con acompañamiento técnico para incorporación consideraciones cambio climático en instrumentos de planeación del desarrollo, ordenamiento ambiental y territorial (POT, POMCA)	Und.	P		0		0
			P(a)	4	17	3,700	697,444
			A	4	17	7,181	700,925

## Component Nbr. 2 Adopción de medidas de adaptación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Planes de restauración acordados con autoridades/dueños de parcelas	Und.	P		3		2,608,000
			P(a)	0	49	29,324	133,181
			A	0	49	15,891	119,748
2.2	Áreas restauradas/revegetadas con enfoque de género, en zonas de ecosistemas de alta montaña, estratégicas para regulación hídrica	Ha	P		4,828		5,020,000
			P(a)	3,422	4,855	2,057,183	7,734,374
			A	3,111	4,544	165,131	5,842,322
2.3	SM&E para seguimiento de los impactos de las medidas de adaptación en el ciclo del agua	Und.	P		1		911,000
			P(a)	0	1	436,845	1,716,765
			A	0	1	138,871	1,418,791
2.4	Organizaciones municipales y comunidades productoras entrenadas en el manejo de riesgo de cambio climático y medidas de adaptación	Und.	P		65		1,726,000
			P(a)	45	65	146,391	994,401
			A	40	60	100,526	948,536
2.5	Perfiles de proyecto formulado con alcaldías u Organizaciones de Base Comunitaria	Und.	P		0		0
			P(a)	0	32	22,224	125,093
			A	0	32	43,904	146,773
2.6	Acuerdos firmados con familias que incorporan medidas de adaptación que incluyen prácticas de resiliencia	Und.	P		0		0
			P(a)	0	565	427,210	942,147
			A	0	565	206,098	721,035

## Other Cost

Administración y coordinación	P					421,750
	P(a)				63,862	1,350,928
	A				0	1,287,066

Total Cost

	Total Cost	P				15,624,750
		P(a)			3,254,937	15,624,750
		A			677,602	13,047,415

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Others - Technical-Sectorial Dimensions
