

PMR Public Report

Operation Number	ES-L1075	Chief of Operations Validation Date	10/12/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/12/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Productive Corridors Program	Loan Number	3170/OC-ES, 3170/OC-ES-1, 3170/OC-ES-2
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, MINISTERIO DE ECONOMIA	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	SOLIS AHUMADA, GALILEO HUMBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1075	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	30,876,032.5	77.19%	9,123,967.5
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	30,876,032.5	77.19%	9,123,967.5

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

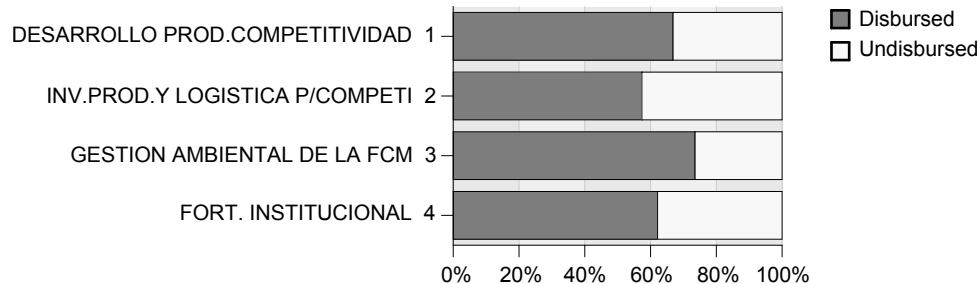

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejorar el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Cambio en la recaudación impositiva por las mayores ventas e ingresos de las empresas beneficiadas que vieron aumentada su productividad.	Indice	1.00	2013	2023	P	1.10
						A	

Details

Means of verification: Cuentas nacionales e Informe del Ministerio de Hacienda

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			
	No		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Aumento de la competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) ubicadas en las áreas de intervención del Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
0.0	Nivel de ingresos de las empresas beneficiarias de cofinanciamientos parciales no reembolsables (o aportes no-reembolsables ANR) y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	10.00			20.00
					A				

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
0.1	Nivel de empleo de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00			10.00
					A				

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
0.2	Productividad de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00			10.00
					A				

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejora de la infraestructura productiva y logística para la competitividad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
1.0	Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2013	P	0.50			0.40
					A				

Details

Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
1.1	Velocidad para los Usuarios de Automóviles	km/h	24.70	2013	P	30.00			50.00
					A				
Details									
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
1.2	Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5.93	2013	P	5.50			3.50
					A				
Details									
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
1.3	Velocidad para los Usuarios de Autobuses	km/h	22.70	2013	P	25.00			45.00
					A				
Details									
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
1.4	Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2013	P	3.00			2.15
					A				
Details									
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.5	Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	km/h	22.70	2013	P	25.00			45.00
					A				

Details

Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
1.6	Cantidad de productores y pescadores artesanales que utilizan nuevas infraestructuras productivas (muelles, centros de acopio, comercialización y sistemas de cadena de frío)	# productores	0.00	2013	P	200.00		400.00
				A				

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas sobre la base de los registros de CENDEPESCA.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
1.7	Tiempo adicional que se conservan los productos a una temperatura adecuada para evitar pérdidas.	horas	0.00	2013	P	24.00		48.00
				A				

Details

Means of verification: Bitácoras administrativas de uso de sistema de cadena de frío

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejora de la gestión ambiental de la Franja Costero Marina (FCM)

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
2.0	Percepción favorable de la gestión ambiental en la Franja Costero Marina	% de población	0.00	2013	P	50.00		66.00
				A				

Details

Means of verification: Encuesta de percepción

Observations: No existe actualmente una medida de este indicador. Como parte del proceso de consulta ambiental y social se realizará una encuesta para medir la línea de base del indicador.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 3: Contribuir al fortalecimiento del marco institucional y de políticas de apoyo al desarrollo productivo

Observation:

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2022
3.0	Inversión en políticas de apoyo al desarrollo productivo de las instituciones involucradas	indice	1.00	2013	P	1.10			1.20
					A				
Details									
Means of verification: Registros de UCP y presupuestos de las instituciones involucradas.									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo Productivo para la Competitividad de MIPYMEs

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.1	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	# of enterprises	P	0	100	14,675	461,200
			P(a)	6	100	150,000	363,951.92
			A	0	25	0	213,951.92
1.2	MIPYMES individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización (Asistencias Técnicas y eventos de comercialización)	# of enterprises	P	0	1,100	175,994	2,250,240
			P(a)	225	1,100	239,981.22	1,768,007.09
			A	56	229	19,136.57	1,239,250.8
1.3	Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial	Grupos asociativos	P	0	30	0	237,500
			P(a)	0	30	0	240,603.98
			A	0	0	0	240,603.98
1.4	MIPYMES asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	# of enterprises	P	0	250	0	340,000
			P(a)	0	250	19,946.9	133,714.15
			A	30	34	14,000	127,767.25
1.5	Grupos Asociativos asistidos técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para acceso al mercado formal y la formalización	Grupos asociativos	P	0	25	0	150,000
			P(a)	0	25		31,200
			A	0	2	0	31,200
1.6	Emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas	Emprendedores	P	0	1,200	0	2,125,000
			P(a)	0	1,200	126,636.28	1,775,342.68
			A	0	656	92,494.84	1,741,201.24
1.7	Iniciativas productivas de emprendimiento financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	0	300	0	2,250,000
			P(a)	0	310	143,108	2,243,141.65
			A	0	310	139,357.98	2,239,391.63
1.8	Iniciativas productivas de emprendimiento lideradas por mujeres financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	0	150	0	1,125,000
			P(a)	0	184	0	1,166,142
			A	0	184	0	1,166,142
1.9	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Proyectos productivos	P	0	115	0	1,737,060
			P(a)	44	115	2,197,022.75	3,286,629.5
			A	13	38	205,167.6	941,896.13
1.10	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Iniciativas productivas	P	0	42	14,571.43	5,224,000
			P(a)	0	46	757,143.03	4,250,241.07
			A	0	46	352,527.66	3,702,834.8

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.1	Muelles de uso dual construidos/reconstruido	Muelles	P	3	4	288,733	4,750,000
			P(a)	0	2	1,541,930.05	3,531,421.56
			A	0	0	0	0
2.2	Centro de Acopio (CAS) construido	Centro de Acopio	P	1	1	688,000	1,200,000
			P(a)	0	1	1,984,512.5	4,231,621.96
			A	0	0	0	0
2.3	Vía Malecón de Ciudad Puerto de la Unión construida	Km	P	0	0.6	0	1,100,000
			P(a)	0	0.6	0	567,595.23
			A	0	0.6	0	567,595.23
2.4	Camino Terciario UNS08S, Tramo Corsain-Las Playitas mejorado	Km	P	0	6.8	0	3,850,000
			P(a)	0	6.8	0	4,486,343.92
			A	0	6.8	0	4,486,343.92
2.5	Camino Rural USU08S, Tramo Carretera CA02S (Desvió San Marcos Lempa)- Desvió el Zamoran reconstruido	Km	P	0	9.8	0	10,500,000
			P(a)	0	9.8	0	8,212,317.33
			A	0	9.8	0	8,212,317.33

Component Nbr. 3 Gestión Ambiental de la Franja Costero-Marítima

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.1	Mapa de zonificación ambiental del Golfo de Fonseca desarrollado	Mapa	P	0	1	0	254,000
			P(a)	0	1	0	223,502.72
			A	0	1	0	223,502.72
3.2	Pasantías en Zonificación Ambiental y Rehabilitación de costas realizadas	Pasantías	P	0	14	0	35,000
			P(a)	0	15	0	32,702.15
			A	0	15	0	32,702.15
3.3	Talleres/eventos de oficialización y socialización de propuesta de zonificación ambiental realizadas	Talleres/ eventos	P	0	5	0	13,500
			P(a)	1	5	12,291.71	13,901.58
			A	0	4	0	1,609.87
3.4	Estudio de caracterización, dinámica y lineamientos para manejo y rehabilitación de la costa de El Salvador desarrollado	Estudio	P	0	1	0	80,400
			P(a)	1	1	120,045	120,045
			A	0	0	0	0
3.5	Funcionarios capacitados en Dinámica y rehabilitación de costas.	Funcionarios	P	0	25	0	14,000
			P(a)	25	25	0	15,123.55
			A	0	0	0	15,123.55
3.6	Equipo tecnológico y software especializado instalado	Equipo	P	0	1	0	103,100
			P(a)	0	1	0	94,725
			A	0	1	0	94,725

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
4.1	Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados	Manuales	P	0	9	0	311,000
			P(a)	0	9		170,548.72
			A	0	9	0	170,548.72
4.2	Herramientas para el monitoreo, seguimiento, evaluación y levantamiento de línea base diseñadas	Herramientas	P	0	4	0	253,000
			P(a)	2	4	151,140	276,423.53
			A	0	2	12,960	89,443.53
4.3	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Funcionarios	P	0	70	0	171,000
			P(a)	0	189	0	100,419.47
			A	0	189	549.6	100,969.07
4.4	Estrategia de Gestión de Riesgos diseñada	Estrategia	P	0	1	0	15,000
			P(a)	1	1	0	0
			A	0	0	0	0
4.5	Asociaciones de Desarrollo Económico Local equipadas	Asociaciones	P	0	2	0	55,000
			P(a)	2	2	50,000	50,000
			A	0	0	0	0
4.6	Laboratorio de control de calidad del agua y patología para pesca y acuicultura equipado	Laboratorio	P	0	1	0	45,000
			P(a)	0	2	0	144,133.24
			A	0	2	0	144,133.24
4.7	Plan anual de visibilización del Programa implementado	Plan	P		4	0	200,000
			P(a)	1	4	37,456.44	199,498.73
			A	0	3	2,600	164,642.29

Other Cost

	Administración (Evaluaciones de Impacto, Auditorías, Evaluaciones del Programa y UEP)	P			130,900	1,150,000
		P(a)			447,600	2,270,702.27
		A			193,893.26	1,222,952.56

Total Cost

	Total Cost	P			1,312,873.43	40,000,000
		P(a)			7,978,813.88	40,000,000
		A			1,032,687.51	27,170,848.93

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Internal Processes
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Internal Processes
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Internal Processes
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Planning
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Technical Design
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Planning
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Sustainability
	Response actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Planning
	Response actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Technical Design
	Response actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Planning
	Response actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Planning
	Response actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
