


PMR Public Report

Operation Number	DR-L1080	Chief of Operations Validation Date	04/19/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/20/22
Last Update	04/19/22	Country Representative Validation Date	04/20/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Women City	Loan Number	4551/OC-DR
Executing Agency	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT
Team Leader	VILLANUEVA, MARIA TERESA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Dominican Republic
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Los dos terrenos en Santo Domingo Norte y Santiago de los Caballeros seleccionados para la construcción de los edificios de Ciudad Mujer están ambos ubicados en zonas urbanas. En 2020 el sitio de Santiago fue cortada la vegetación sin haber obtenido la autorización del Ministerio de Medio Ambiente correspondiente. Sin embargo, después de una vista del sitio se logró establecer que el impacto ambiental había sido menor que lo inicialmente percibido. En 2021, se cuenta con un borrador de los dos Análisis Ambiental y Social (AAS) y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) solicitados por el BID en abril 2021 (actualización del AAS/PGAS de Santo Domingo y realización del AAS/PGAS de Santiago). Por otra parte, se esperan los Términos de Referencia (TDRs) del Ministerio de Medio Ambiente para que la Agencia Ejecutora (AE) pueda presentar los estudios ambientales complementarios al Ministerio y obtener las autorizaciones que permitirán empezar las construcciones de las obras. La consulta de las partes interesadas ha sido realizada en Santiago y Santo Domingo en septiembre del 2021 y la AE ha presentado los informes correspondientes. Además, la AE tiene un especialista ambiental y social asignado.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
DR-L1080	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	430,607.59	2.15%	19,569,392.41
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	430,607.59	2.15%	19,569,392.41
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

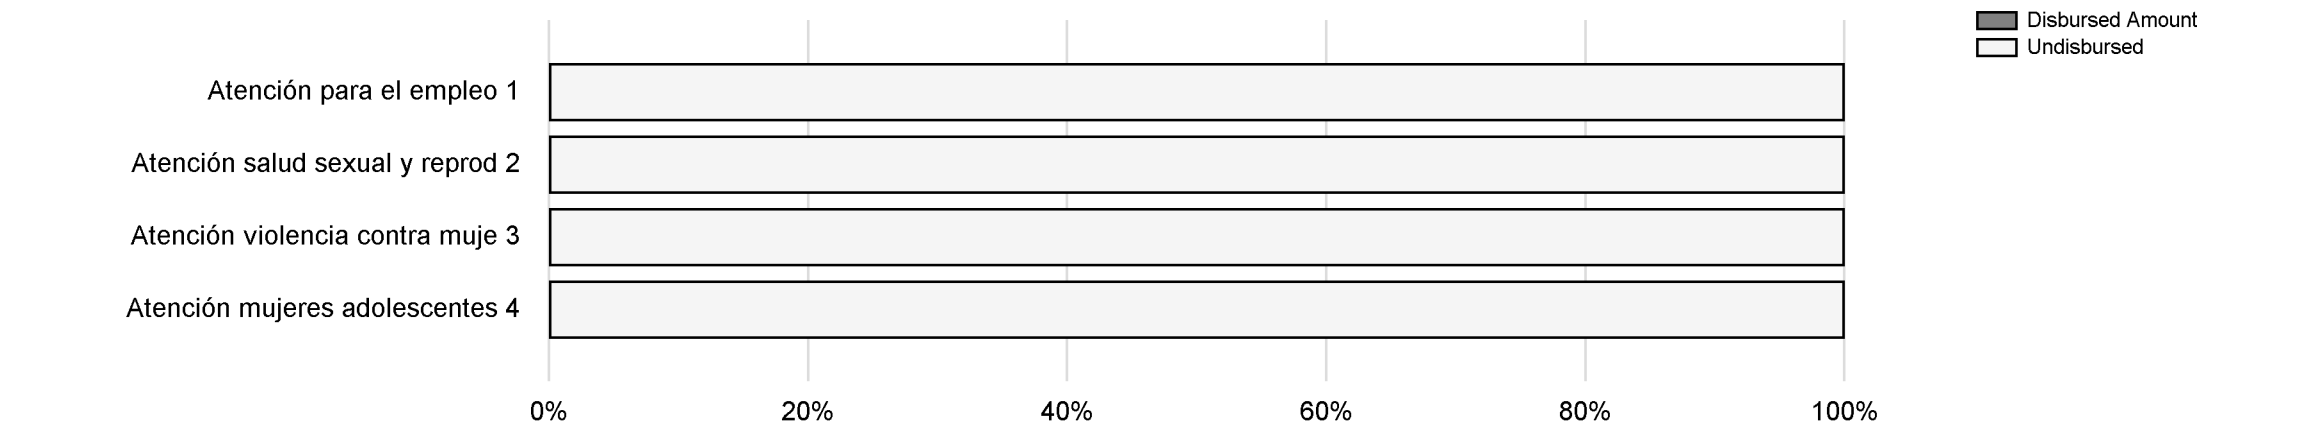

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Reducir la Tasa de mortalidad materna

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Tasa de mortalidad materna en el Gran Santo Domingo y Santiago	Tasa	85.1	2014		P	84.5
						A	-

Details

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Maternal mortality ratio (number of maternal deaths per 100,000 live births) ()		

General Development Objectives Nbr. 1: Reducir la Tasa de mortalidad por cáncer de mama y cérvico uterino

Observation:							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Tasa de mortalidad por cancer cérvico-uterino y de mama en el GSD y Santiago	Tasa	26.8	2015		P	26.4
						A	-
Details							

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Maternal mortality ratio (number of maternal deaths per 100,000 live births) ()		

General Development Objectives Nbr. 3: Aumentar la tasa de ocupación laboral femenina

Observation:							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
3.1	Tasa de ocupación laboral (TOL) femenina	%	39.7	2015		P	39.9
						A	-
Details							

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 4: Disminuir la violencia íntima de pareja

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
4.0	Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.	%	17.8	2013		P	16.3
						A	-
Details							

Means of Verification: Encuesta para Evaluación de Impacto

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 5: Reducir la tasa de Embarazo en Adolescentes

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
5.0	Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo	%	17.8	2013		P	16.2
						A	-
Details							

Means of Verification: SIUBEN

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar el porcentaje de mujeres de 15-64 años ocupadas en el territorio objetivo.											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Tasa de ocupación femenina en el territorio objetivo	%	43.5	2019	P	-	-	-	-	22.71	22.71
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, BCRD											
Observations: Redacción del indicador: La redacción del indicador varía respecto de la inicialmente recogida en la MR para que coincida con la variable que recoge esta información en el sistema nacional que se toma como fuente de verificación. Racionalidad de los datos: La población femenina ocupada en 2019 en Santo Domingo es de 110.941 personas. La población de mujeres de 10 a 64 años en Santo Domingo Norte en 2019 es de 254 mil personas. La tasa media de variación anual de 2017-2019 para Santo Domingo Norte se ha estimado en 1,0260%. El efecto de la pandemia COVID19 en la destrucción de empleo en República Dominicana se ha estimado en un 50% siguiendo estimaciones del Ministerio de Trabajo. El aporte del modelo integral de atención a la mujer se estima en 2023 de un 0,01% en Santo Domingo Norte.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Mujeres entre 16 y 64 años que han recibido capacitación laboral en el territorio objetivo	# of beneficiaries	5.8	2019	P	-	-	-	-	4.2	10.6
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Numerador: INFOTEP; Denominador: Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, BCRD											
Observations: Redacción del indicador: la redacción del indicador varía respecto de la inicialmente recogida en la MR debido a que el concepto "económicamente activas" no está presente en el sistema estadístico nacional, por lo que se ha eliminado de la redacción del indicador. El rango de edad se ha corregido para hacerlo coincidir con los que utiliza la fuente de verificación seleccionada. Racionalidad de los datos: La meta proyectada se basa en datos estimados del efecto de la pandemia COVID en el déficit público y el recorte de servicios públicos no sanitarios, previniendose una reducción de aproximadamente un 25% de la oferta de capacitación de INFOTEP en el territorio objetivo. El aporte del primer centro de atención integral a la mujer en Santo Domingo Norte para el primer año se estima en un 0,2%.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Disaggregation		Male			P	-	-	-	-	-	-
				A	-	-	-	-	-	-	-
		Female			P	-	-	-	-	-	-
				A	-	-	-	-	-	-	-
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Mujeres que han recibido servicios de autonomía económica a través del modelo integral de atención a la mujer y que han accedido a una entrevista laboral en un plazo máximo de 3 meses posterior a finalizar su capacitación	# of beneficiaries	0	2020	P	-	-	-	-	34	34
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer											
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provisión d											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.7 Beneficiaries of employment support initiatives (#) (C)						
Disaggregation			Male			P	-	-	-	-	-

Disaggregation		Male		A	-	-	-	-	-	-	
		Female		P	-	-	-	-	-	-	
			A	-	-	-	-	-	-		
		Male		P	-	-	-	-	-	-	
			A	-	-	-	-	-	-		
		Female		P	-	-	-	-	-	-	
			A	-	-	-	-	-	-		
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.3	Mujeres que han completado cursos de capacitación empresarial a través del modelo integral de atención a la mujer.	# of women	0	2020	P	-	-	-	-	116	116
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer

Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.16 Women beneficiaries of economic empowerment initiatives (#) (C)								
Disaggregation		Male				P	-	-	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	-	-	
		Female				P	-	-	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	-	-	
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023		
1.4	Mujeres que han completado cursos de formación técnico-vocacional a través del modelo integral de atención a la mujer			# of beneficiaries	0	2020	P	-	-	-	-	391	391
							A	-	-	-	-	-	-
Details													

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer

Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.7 Beneficiaries of employment support initiatives (#) (C)							
Disaggregation		Male				P	-	-	-	-	-	-
						A	-	-	-	-	-	-
		Female				P	-	-	-	-	-	-
						A	-	-	-	-	-	-
		Male				P	-	-	-	-	-	-
						A	-	-	-	-	-	-
		Female				P	-	-	-	-	-	-
						A	-	-	-	-	-	-

Specific Development Objectives Nbr. 2: 2. Reducir la tasa de mortalidad materna y por cáncer de mama y cérvico-uterino en mujeres de 15 años o más en el territorio objetivo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Promedio de controles prenatales realizados por nacimiento en el territorio objetivo	# of beneficiaries	0.46	2019	P	-	-	-	-	.57	.57
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Servicio Nacional de Salud y proyecciones de población de la ONE

Observations: Redacción del indicador: el concepto de "embarazo no deseado" no existe como tal en el sistema nacional de estadísticas. Tampoco existe el dato de "número de controles prenatales por mujer o por nacimiento", por lo que no es posible saber cuántos controles se hace cada mujer, el sistema únicamente recoge cuántos controles prenatales se realizan en los centros publicos de tercer nivel de atención. La opción más aproximada al espíritu de medición del indicador es el promedio de controles por nacimiento. Racionalidad de los datos: El indicador muestra el número promedio de controles prenatales que se realizan por nacimiento. La meta incluye el impacto de los datos estimados de producción en el centro de atención integral a la mujer.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)								
Disaggregation		Male				P	-	-	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	-	-	
		Female				P	-	-	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	-	-	
Indicator		Unit of Measure			Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
2.1	Mujeres que se practicaron una citología vaginal o prueba detectora de cáncer vaginal en el territorio objetivo.	# of beneficiaries			1.3	2019	P	-	-	-	-	4.63	4.63
							A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Estadísticas Ministerio de Salud Pública y proyección de datos de población de la ONE

Observations: Redacción del indicador: se elimina el rango de edad previsto en la redacción original del indicador en la MR del diseño, porque el sistema nacional no permite filtrar por edad la información. Para el denominador, se ha tomado el rango de edad en el que la población femenina dominicana estar sexualmente activa. Racionalidad de los datos: Los datos se refieren a los servicios provistos por los centros públicos donde se realizan estas pruebas (centros de tercer nivel). Mujeres que se practican las pruebas como % del total de mujeres entre los 14 y los 64 años en el territorio objetivo. La contribución del modelo de atención integral se estima en función de los datos previstos de atención y se cifra para el año 2023 en un 22% de incremento directo del número de citologías realizadas en el territorio objetivo. La tendencia de los últimos datos observados en el territorio objetivo es descendiente; sin embargo, puesto que el número de citologías que se practican en centros de tercer nivel es

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)								
Disaggregation		Male				P	-	-	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	-	-	
		Female				P	-	-	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	-	-	
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
2.2	Mujeres que se practicaron una mamografía en el territorio objetivo.			# of beneficiaries	5.26	2019	P	-	-	-	-	4.29	4.29
							A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Estadísticas Ministerio de Salud Pública y proyección de datos de población de la ONE

Observations: Redacción del indicador: se elimina el rango de edad previsto en la redacción original del indicador en la MR del diseño, porque el sistema nacional no permite filtrar por edad la información. Para el denominador, se ha tomado el rango de edad originalmente establecido en la MR (40-64 años). Racionalidad de los datos: La estimación de la meta se realiza aplicando la tasa media de crecimiento de las mamografías en el territorio objetivo teniendo en cuenta el dato observado de 2019 y del primer trimestre de 2020. La tendencia de estos datos es decreciente. Esta tasa negativa de crecimiento se proyecta linealmente al 2023. A este dato estimado se aplica la corrección de la contribución del modelo de atención integral en el primer año de funcionamiento (2023), que se estima en un incremento del 53% del número de mamografias realizadas en el territorio objetivo. (Ver ficha del indicador en el informe de consultoría adjunto a esta matriz en el sistema - EZSHARE-1449899531-6).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)						
Disaggregation			Male			P	-	-	-	-	-

Disaggregation		Male		A	-	-	-	-	-	-		
		Female		P	-	-	-	-	-	-		
			A	-	-	-	-	-	-			
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
2.3	Mujeres que se practicaron control prenatal a través del modelo integral de atención a la mujer en el año		# of beneficiaries	0	2020	P	-	-	-	-	2,000	-
						A	-	-	-	-	-	-
Details												

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer

Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)								
Disaggregation		Male				P	-	-	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	-	-	
		Female				P	-	-	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	-	-	
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023		
2.4	Mujeres que practicaron una citología cervical o prueba detectora de cáncer cervical a través del modelo integral de atención a la mujer en el año			# of beneficiaries	0	2020	P	-	-	-	-	2,007	2,007
							A	-	-	-	-	-	-
Details													

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)																
Disaggregation		Male				P	-	-	-	-	-	-									
						A	-	-	-	-	-	-									
		Female				P	-	-	-	-	-	-									
						A	-	-	-	-	-	-									
Indicator													Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.5	Mujeres que se practicaron una mamografía a través del modelo integral de atención a la mujer en el año			# of beneficiaries	0	2020	P	-	-	-	-	1,349	1,349								
							A	-	-	-	-	-	-								
Details																					

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer

Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Disaggregation		Male	P	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	-	-	-	-
		Female	P	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	-	-	-	-

Specific Development Objectives Nbr. 3: 3. Reducir la prevalencia de violencia contra la mujer (violencia intima de pareja -física o sexual) en el territorio objetivo.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Mujeres víctimas de violencia que han sido atendidas a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	#	0	2020	P	-	-	-	-	365	365
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer

Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.1	Mujeres atendidas en el modulo de violencia de género del modelo de atención integral a la mujer que han sido referidas desde otro módulo del modelo	%	0	2020	P	-	-	-	-	80.3	80.3
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: 4. Reducir el porcentaje de mujeres adolescentes de 15-19 años embarazadas en el territorio objetivo.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.0	Nacimientos de mujeres adolescentes (12-19 años) respecto del total de mujeres adolescentes en el territorio objetivo	%	6.33	2019	P	-	-	-	-	11.37	11.37
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Servicio Nacional de Salud y proyección de población de la ONE

Observations: Redacción del indicador: se adapta la redacción para que el indicador coincida en su nomenclatura con la variable que mide el sistema nacional. El rango de edad se cambia para alinearse con la definición de "adolescente" utilizada en las estadísticas nacionales. Racionalidad del los datos: El informe de consultoría (EZSHARE-1449899531-6) resalta la tendencia creciente de la variable en los dos últimos datos observados por el Servicio Nacional de Salud en los territorios objetivo. La hipótesis es que los servicios de atención integral a la mujer adolescentes contribuyan a reducir la pendiente con un impacto esperado de reducción de embarazo adolescente en un 0,28% en 2023, de acuerdo a los datos previstos de atención a adoelscentes; sin embargo, este impacto no logra en el primer año de funcionamiento invertir la tendencia creciente de embarazo adolescente en el territorio objetivo.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.1	Mujeres (12 y 19 años) que son atendidas a través del modelo integral de atención a la mujer	#	0	2020	P	-	-	-	-	674	674
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer

Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación y Demanda Laboral para Orientar la Oferta de Cursos Técnico-Profesional con Enfoque de Género en los Territorios de los CEDIMU, adaptado	Número	P	-	1	-	30,000
			P (a)	-	1	-	14,000
			A	-	-	-	-
1.02	Programa de pasantías implementado	Número	P	-	1	-	285,000
			P (a)	-	1	-	250,000
			A	-	-	-	-
1.03	Taller de capacitación empresarial diseñado y con piloto implementado	Número	P	-	1	-	20,000
			P (a)	-	1	-	20,000
			A	-	-	-	-
1.04	Programa de capacitación técnico - vocacional diseñado y con piloto implementado	Número	P	-	1	-	15,000
			P (a)	-	1	-	15,000
			A	-	-	-	-
1.05	Programa de formación a funcionarias del módulo de autonomía económica, implementado	Número	P	-	1	-	30,000
			P (a)	-	1	-	30,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Atención integral en SSR para las mujeres.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Centros con equipamiento médico especializado (mamógrafo, sonógrafo, colposcopio)	Número	P	-	2	-	900,000
			P (a)	-	2	-	1,870,000
			A	-	-	-	-
2.02	Programa de formación a funcionarias del Módulo de SSR, implementado	Número	P	-	1	-	30,000
			P (a)	-	1	-	30,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Atención integral para la prevención y atención a la VCM.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Programa, manuales y materiales de capacitación en la Atención Integral y Manejo Efectivo de Casos de VCM, diseñado	Número	P	-	1	-	20,000
			P (a)	-	1	-	55,000
			A	-	-	-	-
3.02	Talller de capacitación comunitaria para la prevención de violencia dirigidos a hombres y mujeres, diseñado	Número	P	-	1	-	20,000
			P (a)	-	1	-	20,000
			A	-	-	-	-
3.03	Programa de formación a funcionarias del Módulo de Atención Integral para la prevención y atención a la VCM, implementado	Número	P	-	1	-	30,000
			P (a)	-	1	-	30,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Atención integral a mujeres adolescentes.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
4.01	Diseño y evaluación de intervención piloto para cambio de comportamiento en prevención del embarazo adolescente, implementado	Número	P	-	1	24,000	120,000
			P (a)	-	1	-	90,000
			A	-	-	-	-
4.02	Programa de formación a funcionarias Módulo de Atención Integral a Mujeres Adolescentes, implementado	Número	P	-	1	-	30,000
			P (a)	-	1	-	10,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 5 Construcción y equipamiento de los CCM y fortalecimiento institucional.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
5.01	Centro de Santo Domingo construido y equipado	Número	P	-	1	2,870,400	11,072,000
			P (a)	-	1	70,000	8,441,376.56
			A	-	-	72,711.06	72,711.06
5.02	Centro de Santiago construido y equipado	Número	P	-	1	-	4,725,000
			P (a)	-	1	-	7,550,000
			A	-	-	-	-
5.03	Módulo de registro, monitoreo e interoperatividad del Sistema de Información, operativo	Número	P	-	1	-	385,000
			P (a)	-	1	-	60,000
			A	-	-	-	-
5.04	Sistema de gestión administrativa , operativo	Número	P	-	1	-	30,000
			P (a)	-	1	-	30,000
			A	-	-	-	-
5.05	Estrategia de comunicación implementada	Número	P	-	1	-	420,000
			P (a)	-	1	-	330,000
			A	-	-	-	-
5.06	Taller de capacitación en habilidades para la vida para beneficiarias, diseñado	Número	P	-	1	-	20,000
			P (a)	-	1	-	20,000
			A	-	-	-	-
5.07	Manual operativo y de funciones elaborado	Número	P	-	1	-	105,800
			P (a)	-	1	-	37,734
			A	-	-	7,613	7,613

Other Cost				
	Gestión del Proyecto	P	70,000	406,000
		P (a)	120,000	859,998
		A	153,920	209,687
	Auditorias Anuales	P	30,000	70,000
		P (a)	30,000	34,775
		A	5,925	5,925
	Evaluaciones	P	0	100,000
		P (a)	0	40,000
		A	0	0
	Imprevistos	P	0	1,136,200
		P (a)	0	162,116.44

	Imprevistos	A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	2,994,400	20,000,000
		P (a)	220,000	20,000,000
		A	240,169.06	295,936.06

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Centro de Santiago construido y equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	4/12/2022
	Centro de Santo Domingo construido y equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	4/12/2022
	Centros con equipamiento médico especializado (mamógrafo, sonógrafo, colposcopio)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	3/14/2022
	Diseño	Create Milestone	N/A	NADIAT	3/14/2022
	Diseño y evaluación de intervención piloto para cambio de comportamiento en prevención del embarazo adolescente, implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	3/14/2022
	Equipamiento Médico	Modify Milestone	Modify Milestone name	NADIAT	4/5/2022
			Modify Unit of Measure	NADIAT	4/5/2022
	Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación y Demanda Laboral para Orientar la Oferta de Cursos Técnico-Profesional con Enfoque de Género en los Territorios de los CEDIMU, adaptado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	3/14/2022
	Manual operativo y de funciones elaborado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	4/12/2022
	Módulo de registro, monitoreo e interoperatividad del Sistema de Información, operativo	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	4/12/2022
	Programa de capacitación técnico - vocacional diseñado y con piloto implementado	Modify Output	Modify Output name	NADIAT	4/12/2022
	Programa de formación a funcionarias del Módulo de Atención Integral para la prevención y atención a la VCM, implementado	Modify Output	Modify Unit of Measure	NADIAT	4/12/2022
	Programa de formación a funcionarias del módulo de autonomía económica, implementado	Modify Output	Modify Unit of Measure	NADIAT	4/12/2022
	Programa de formación a funcionarias del Módulo de SSR, implementado	Modify Output	Modify Unit of Measure	NADIAT	4/12/2022
	Programa de formación a funcionarias Módulo de Atención Integral a Mujeres Adolescentes, implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	4/5/2022
	Programa de pasantías implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	3/14/2022
	Programa, manuales y materiales de capacitación en la Atención Integral y Manejo Efectivo de Casos de VCM, diseñado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NADIAT	4/12/2022
	Protocolos de atención actualizados	Create Milestone	N/A	NADIAT	3/14/2022
	Supervisión	Create Milestone	N/A	NADIAT	4/5/2022
	Taller de capacitación empresarial diseñado y con piloto implementado	Modify Output	Modify Output name	NADIAT	4/12/2022
	Talller de capacitación comunitaria para la prevención de violencia dirigidos a hombres y mujeres, diseñado	Modify Output	Modify Output name	NADIAT	4/12/2022
Specific Development Objective	Mujeres que han completado cursos de capacitación empresarial a través del modelo integral de atención a la mujer.	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	NADIAT	3/24/2022
	Mujeres que han completado cursos de formación técnico-vocacional a través del modelo integral de atención a la mujer	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	NADIAT	3/24/2022
	Mujeres que han recibido servicios de autonomía económica a través del modelo integral de atención a la mujer y que han accedido a una entrevista laboral en un plazo máximo de 3 meses posterior a finalizar su capacitación	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	NADIAT	3/24/2022
	Mujeres que practicaron una citología cervical o prueba detectora de cáncer cervical a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	NADIAT	3/24/2022
	Mujeres que se practicaron control prenatal a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	NADIAT	3/24/2022
	Mujeres que se practicaron una citología vaginal o prueba detectora de cáncer vaginal en el territorio objetivo.	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	NADIAT	3/24/2022

Specific Development Objective	Mujeres que se practicaron una mamografía a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	NADIAT	3/24/2022
	Mujeres que se practicaron una mamografía en el territorio objetivo.	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	NADIAT	3/24/2022
	Promedio de controles prenatales realizados por nacimiento en el territorio objetivo	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	NADIAT	3/24/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Planning
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		AVOID	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Planning
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Technical Design
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Technical Design
	Response Actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Planning
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
15	Inactive		Human Resources		
	Response Actions				
	15.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	15.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
18	Inactive		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	18.1	Management Strategy		Status	
		AVOID		INACTIVE	
	18.2	Management Strategy		Status	
		AVOID		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
20	Inactive		Planning		
	Response Actions				
	20.1	Management Strategy		Status	
		AVOID		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Active		Technical Design
	Response Actions		
	22.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	22.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	22.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	22.4	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Inactive		Technical Design
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
25	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	25.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
28	Active		Systems
	Response Actions		
	28.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
29	Active		Human Resources
	Response Actions		
	29.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	29.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
32	Active		Human Resources
	Response Actions		
	32.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
34	Active		Human Resources
	Response Actions		
	34.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
35	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	35.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Cost and Budgetary Aspects
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
