

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1327	Chief of Operations Validation Date	05/12/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/14/23
Last Update	05/11/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Innovation Program for Crisis Response and Strategic Priorities Management	Loan Number	5084/OC-AR
Executing Agency	SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT RESULTS
Team Leader	GARCIA MEJIA, MAURICIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1327	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	1,561,000	7.81%	18,439,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	1,561,000	7.81%	18,439,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

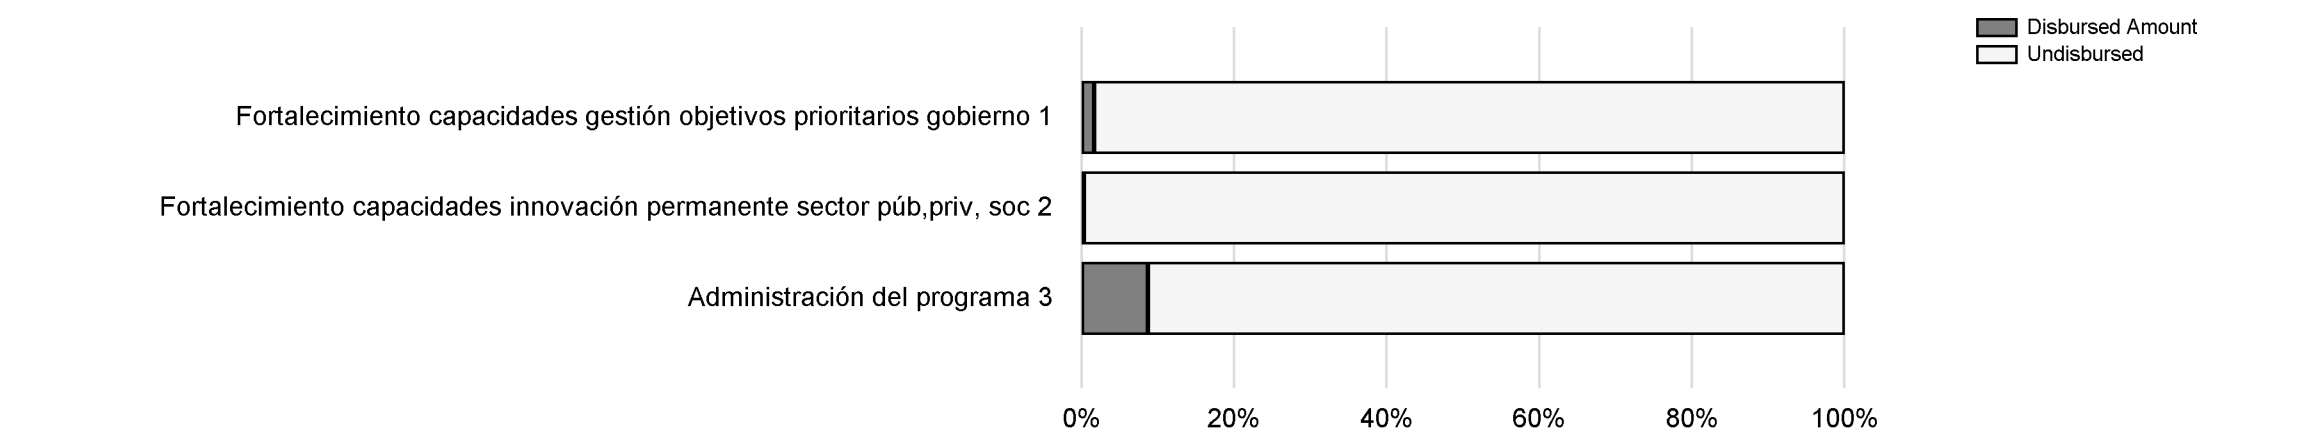

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Indice de Efectividad Gubernamental (IEG)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Indice de Efectividad Gubernamental (IEG)	Numero	0.03	2018	2024	P	.15
						A	-

Details

Means of Verification: Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI) project - Banco Mundial

Observations: Se asume que con el programa, se logrará una mejora en el cumplimiento de PG que permitirá a Argentina mejorar su efectividad gubernamental al término del mismo. Argentina pasó de -0,28 en 2013 a 0,03 en 2018.Se espera mantener la tendencia creciente con el apoyo del programa.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX													
Specific Development Objectives													
Specific Development Objectives Nbr. 0: Capacidad de cumplimiento de PGE incrementada													
Observation:													
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	Índice de la Revisión de Capacidad de Cumplimiento (RCC - Delivery Capacity Review)			Indice	1.73	2020	P	2	2.25	2.25	2.6	3	3
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Fuente: RCC (BID). Responsable de recolección y reporte de datos: CGC (recolección) - (UEP) (reporte)													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.1	Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas			Instituciones	0	2021	P	-	-	-	-	1	1
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Reporte OE													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Specific Development Objectives Nbr. 1: Emprendimientos e iniciativas de innovación digital incrementadas													
Observation:													
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Iniciativas de innovación pública en funcionamiento			Iniciativas	0	2020	P	-	-	-	-	1	1
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Reporte OE													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Iniciativas de innovación del sector privado en funcionamiento			Iniciativas	0	2020	P	-	-	-	-	1	1
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Reporte OE													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.4	Iniciativas de innovación de la sociedad civil en funcionamiento		Iniciativas	0	2020	P	-	-	-	-	1	1
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Reporte OE												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1.1. Fortalecimiento de las funciones de Centro de Gobierno

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	1.1.1 Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC) diseñado e implementado	Modelo	P	1	1	146,666.67	440,000
			P (a)	1	-	220,000	440,000
			A	-	-	-	-
1.02	1.1.2 Funcionarios capacitados en el Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC)	Funcionarios	P	50	200	82,000	500,000
			P (a)	49	152	22,000	500,000
			A	-	51	-	-
1.03	1.1.3 Evaluaciones rápidas (Deep Dives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de Prioridades Gubernamentales (PG) realizadas	documentos	P	3	16	414,895	1,320,000
			P (a)	6	17	305,968	1,320,000
			A	5	6	174,730	179,875
1.04	1.1.4 Informes de Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental realizados	informes	P	12	48	179,750	719,000
			P (a)	12	43	19,431	719,000
			A	7	10	15,738	15,738

Component Nbr. 2 1.2. Fortalecimiento de la gestión de la información

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	1.2.1 Sistema Integrado de Información Estratégica implementado	Sistema	P	1	1	451,900	4,120,000
			P (a)	1	1	-	4,120,000
			A	-	-	-	-
2.02	1.2.2 Herramienta de visualización de información georreferenciada y analítica de datos diseñada e implementada	Sistema	P	1	1	-	1,230,000
			P (a)	1	1	65,969	1,230,000
			A	-	-	-	13,713
2.03	1.2.3 Salas de Situación implementadas	Salas	P	1	2	229,333	1,819,000
			P (a)	1	2	103,500	1,819,000
			A	-	-	41,956	41,956
2.04	1.2.4 Plan de gestión del cambio implementado	Plan	P	1	4	20,000	500,000
			P (a)	1	4	-	500,000
			A	-	1	-	-

Component Nbr. 3 2.1. Innovaciones en la gestión pública

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
3.01	2.2.1 Acciones para la construcción de un ecosistema para la innovación en el sector público implementadas	acciones	P	1	3	262,500	265,000
			P (a)	-	5	199,409	265,000
			A	-	3	-	-
3.02	2.2.2 Modelo de innovadores gubernamentales implementado.	Modelo	P	1	1	1,256,000	3,115,000
			P (a)	1	1	313,286	3,115,000
			A	-	-	918,080	1,046,809

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
4.01	2.2.1 Laboratorio inteligente de innovación en funcionamiento	Laboratorio	P	-	1	-	1,820,000
			P (a)	-	1	-	1,820,000
			A	-	-	-	-
4.02	2.2.2 Instrumentos de apoyo a la innovación implementados	Instrumentos	P	2	5	1,821,000	2,004,000.28
			P (a)	2	18	1,174,336	2,004,000.28
			A	17	18	399,004	428,549
4.03	2.2.3 Cursos capacitación y formación en habilidades digitales ofrecidos para afrontar la Revolución 4.0	cursos	P	2	8	25,000	295,000
			P (a)	2	30	-	295,000
			A	-	24	120,071	175,876
4.04	2.2.4 Actividades para el desarrollo colaborativo de soluciones basadas en inteligencia artificial para las prioridades gubernamentales realizados	acciones	P	2	8	12,000	675,000
			P (a)	2	6	92,166	675,000
			A	-	2	-	13,834

Other Cost				
	Administración	P	0	0
		P (a)	0	46,000
		A	0	0
	Asistencia Técnica	P	150,000	1,157,999.58
		P (a)	140,953	1,111,999.58
		A	121,739	177,413
	Gastos operativos	P	5,000	20,000.14
		P (a)	12,415	20,000.14
		A	331	462

Total Cost				
	Total Cost	P	5,056,044.67	20,000,000
		P (a)	2,669,433	20,000,000
		A	1,791,649	2,094,225

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	1.1.1 Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC) diseñado e implementado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/20/2023
	1.1.2 Funcionarios capacitados en el Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC)	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/31/2023
	1.1.3 Evaluaciones rápidas (Deep Dives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de Prioridades Gubernamentales (PG) realizadas	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/31/2023
	1.1.4 Informes de Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental realizados	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/31/2023
	2.2.1 Acciones para la construcción de un ecosistema para la innovación en el sector público implementadas	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/31/2023
	2.2.2 Instrumentos de apoyo a la innovación implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	5/11/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/20/2023
	2.2.2 Modelo de innovadores gubernamentales implementado.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GLAFFAYE	3/31/2023
	2.2.3 Cursos capacitación y formación en habilidades digitales ofrecidos para afrontar la Revolución 4.0	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GLAFFAYE	3/31/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/31/2023
	2.2.4 Actividades para el desarrollo colaborativo de soluciones basadas en inteligencia artificial para las prioridades gubernamentales realizados	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/20/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
1	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	1	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Planning		
	Response Actions				
	2	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Active		Internal Processes		
	Response Actions				
	3	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	4	Management Strategy		Status	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
