


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1326	Chief of Operations Validation Date	05/11/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/12/23
Last Update	05/10/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Immediate Public Health Response Project en the context of the COVID-19 Pandemic to contain, control and mitigate its effect in health service provision in Argentina	Loan Number	5032/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Todas las licitaciones de los nueve centros de almacenamiento de vacunas han sido lanzadas, de las cuales seis tienen contrato adjudicado con orden de inicio de obras en diciembre 2022. Los contratos prevén la respectiva documentación socioambiental. El organismo ejecutor cuenta con el equipo adecuado para la gestión socioambiental del Programa y con un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS). El organismo entregó al Banco un AAS único sobre los 9 centros provinciales y un AAS sobre el centro nacional de almacenamiento de vacunas, e informe de Consulta Virtual Pública.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1326	470,000,000	470,000,000	125,844,350	0	595,844,350	470,000,000	403,400,000	85.83%	66,600,000
Aggregated	470,000,000	470,000,000	125,844,350	0	595,844,350	470,000,000	403,400,000	85.83%	66,600,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

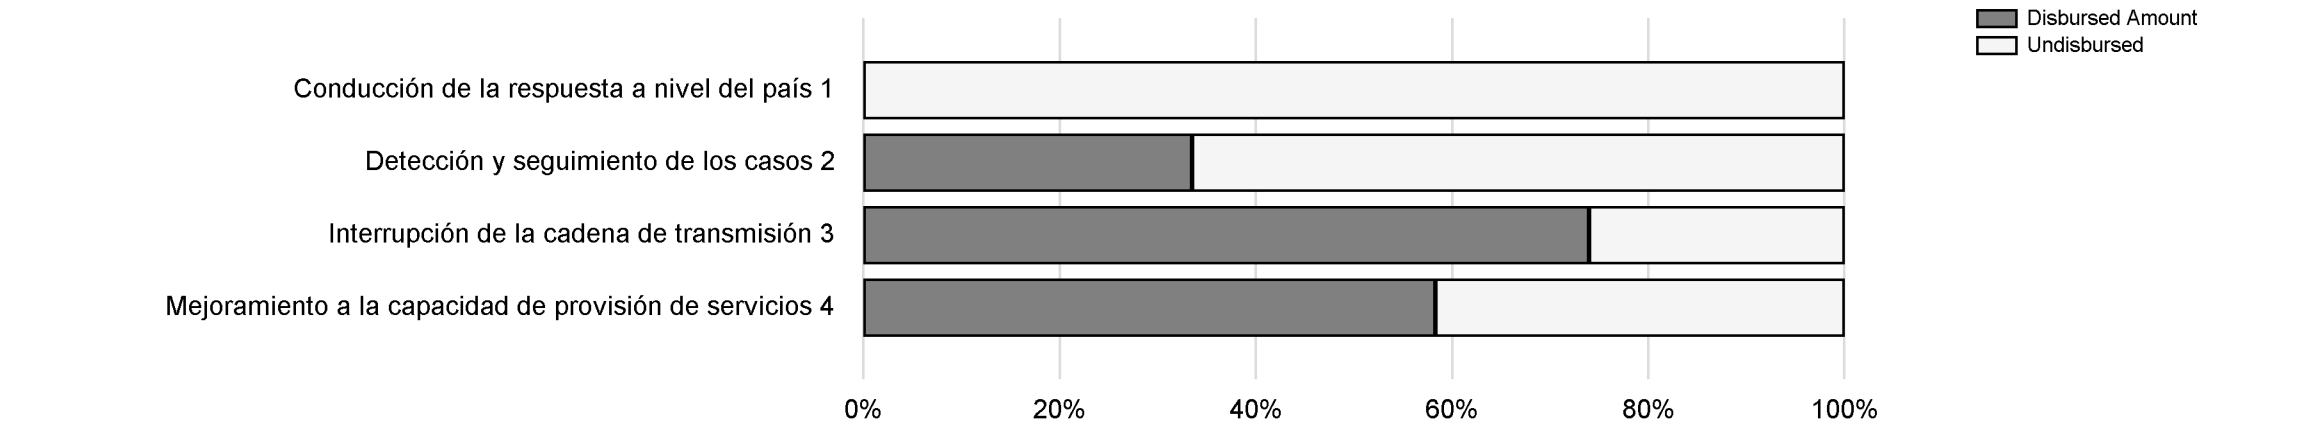

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Reducción de la morbilidad y mortalidad por COVID-19

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Muertes por COVID-19	Número	174044	2022	2022	P	91,768
						A	-
Details							

Means of Verification: Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria

Observations: El valor de la meta representa un punto de corte debajo del cual la meta se considera cumplida. La meta es acumulativa. La línea de base corresponde a las muertes proyectadas para 2022 sin intervención y la meta corresponde a las muertes proyectadas con intervención para 2022. Se ajustó la meta y la línea de base teniendo en cuenta los valores de los peores 3 meses en términos de circulación y propagación y proyectando ese promedio hacia 2022. La meta corresponde a la proyección teniendo en cuenta las intervenciones realizadas y programadas (entre ellas, la vacunación) y las proyecciones de contagio.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Casos confirmados de COVID-19			Número	7635811	2022	2022	P	6,042,642
								A	-
Details									

Means of Verification: Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria

Observations: El valor de la meta representa un punto de corte debajo del cual la meta se considera cumplida. La meta es acumulativa.La línea de base corresponde a los contagios proyectados para 2022 sin intervención y la meta corresponde a los contagios proyectados con intervención para 2022. Se ajustó la meta y la línea de base teniendo en cuenta los valores de los peores 3 meses en términos de circulación y propagación y proyectando ese promedio hacia 2022. La meta corresponde a la proyección teniendo en cuenta las intervenciones realizadas y programadas (entre ellas, la vacunación) y las proyecciones de contagio.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 1: Efectos indirectos de la pandemia sobre la salud mitigados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Porcentaje de personas con cobertura efectiva de salud dentro de la población con cobertura pública exclusiva en salud	Porcentaje	16	2019	2022	P	25
						A	-
Details							

Means of Verification: Registros de Programa SUMAR, REDES, Documento de población elegible SUMAR

Observations: Numerador: Personas con CPE que utilizaron servicios de salud priorizados en efectores que integran RIISS en los últimos 12 meses. Denominador: Estimación de Población con CPE en Efectores de REDES.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX														
Specific Development Objectives														
Specific Development Objectives Nbr. 0: Conducción de la respuesta a nivel del país fortalecida														
Observation:														
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
0.0	Mecanismo de coordinación multisectorial para COVID-19 activado				Documento protocolo	0	2019	P	1	-	-	-	-	1
								A	1	-	-	-	-	1
Details														
Means of Verification: Plan de Respuesta Integrada a la pandemia COVID-19														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
0.1	Porcentaje de actividades iniciadas como parte del Plan de Respuesta Integrada a la pandemia COVID-19				Porcentaje	0	2019	P	70	100	100	-	-	100
								A	80	100	100	-	-	100
Details														
Means of Verification: Plan de Respuesta Integrada a la pandemia COVID-19														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Specific Development Objectives Nbr. 1: Detección y seguimiento de los casos mejorada														
Observation:														
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
1.0	Número de laboratorios con capacidad para procesar muestras COVID-19 que se incorporan a la Red de Influenza de Laboratorios				Número	0	2019	P	-	5	10	-	-	10
								A	5	30	35	-	-	35
Details														
Means of Verification: Sistema de reporte de Agencia Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
1.2	Porcentaje de boletines epidemiológicos emitidos semanalmente durante el período de vigencia de la emergencia sanitaria por COVID-19				Porcentaje	0	2019	P	100	100	100	-	-	100
								A	100	100	100	-	-	100
Details														
Means of Verification: Sitio Web del Ministerio de Salud de la Nación														
Observations: Numerador: cantidad de semanas en que se emite un boletín epidemiológico durante el periodo de vigencia de la emergencia sanitaria por COVID-19.. Denominador: cantidad de semanas de duración de emergencia sanitaria por COVID-19.														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
1.3	Número de laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios acreditados en procesos de calidad		Número	1	2019	P	1	4	9	-	-	9
						A	1	-	-	-	-	1
Details												
Means of Verification: Sistema de reporte de Agencia Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Specific Development Objectives Nbr. 2: Esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad apoyados												
Observation:												
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
2.0	Número de trabajadores de la salud con competencias vinculadas a la prevención y protección ante COVID-19 con enfoque intercultural		Personas	0	2019	P	62	70	70	-	-	202
						A	62	124	88	-	-	274
Details												
Means of Verification: Reporte del Ministerio de Salud												
Observations: Los cursos tienen una evaluación por la cual se considera que los participantes adquieren las competencias cuando logran un puntaje mayor o igual al 80%.												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
2.2	Número de municipios del Programa Municipios Saludables con proyectos presentados sobre comunicación a la población sobre COVID-19		Municipios	0	2019	P	-	-	100	-	-	100
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Sistema de reporte del Programa Municipios Saludables												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
2.2	Número de personas de grupos priorizados vacunadas contra COVID-19		# of beneficiaries	0	2020	P	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000
						A	-	-	9,936,355	-	-	9,936,355
Details												
Means of Verification: Reporte del Ministerio de Salud generado a través del sistema NOMIVAC												
Observations: Los grupos priorizados están definidos en el plan nacional de vacunación COVID (Resolución 2883/20).Las estimaciones están basadas en el supuesto de dos dosis con el precio promedio disponible de UD12.5/dosis (sin los servicios logísticos).												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
4.0	Porcentaje de jurisdicciones con capacidad de atención ampliada para atención de pacientes con COVID-19	Porcentaje	0	2019	P	-	100	100	-	-	100
					A	-	-	75	-	-	75
Details											
Means of Verification: Sistema de reporte REDES y reportes de la Dirección Nacional de Recursos Físicos.											
Observations: Numerador: jurisdicciones que incrementan la cantidad de: i. camas y equipamiento Unidad Terapia Intensiva; ii. equipamiento Primer Nivel de Atención; iii. móviles de traslado; iv. ambulancias (alta y baja complejidad); y v. dispositivo de circulación diferenciada para pacientes febriles. Denominador: total de jurisdicciones.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
4.2	Porcentaje de camas disponibles en unidades de terapia intensiva (promedio anual a nivel nacional)	Porcentaje	10	2019	P	10	10	10	-	-	10
					A	45	65.1	41.4	-	-	41.4
Details											
Means of Verification: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)											
Observations: Numerador: número de camas en UTI disponibles. Denominador: Número total de camas en UTI en efectores públicos y privados.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
4.3	Porcentaje de jurisdicciones que tienen formalizada una red integrada e integral de servicios de salud (RIISS) COVID-19	Porcentaje	0	2019	P	42	100	100	-	-	100
					A	42	42	87.5	-	-	87.5
Details											
Means of Verification: Reporte de REDES a partir del Acuerdo de Gestión firmados y/o normativas jurisdiccionales que definan roles y responsabilidades											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
4.4	Porcentaje de establecimientos de salud públicos con imágenes digitales integradas al sistema de Historia Clínica Digital	Porcentaje	0	2019	P	-	-	5	-	-	5
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
4.4	Porcentaje de jurisdicciones que implementan programas de telemedicina priorizados por el Ministerio de Salud	Porcentaje	0	2019	P	25	75	75	-	-	75
					A	100	96	96	-	-	96
Details											
Means of Verification: Sistema de Reportes de la Coordinación de Telesalud											
Observations:											

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									

Means of Verification: Sistema Integrado de reportes de logística y medicamentos, REMEDIAR

Observations: Numerador: Número de consultas que reciben el medicamento gratuitamente por el programa. Denominador: Número total de consultas que reciben una prescripción en el PNA.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023	
4.7	Porcentaje de establecimientos de salud públicos con imágenes digitales				Porcentaje	3	2019	P	-	-	20	-	-	20
								A	3	-	-	-	-	-
Details														

Means of Verification: SISA

Observations: Numerador: total de establecimientos de salud con imágenes digitales Denominador: total de establecimientos de salud (460)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023
4.8	Porcentaje de jurisdicciones que utilizan la plataforma de Telesalud			Porcentaje	0	2019	P	71	-	80	-	-	80
A							71	83.33	96	-	-	96	
Details													

Means of Verification: Reportes de la Plataforma de Telesalud

Observations: Numerador: Número de Jurisdicciones que utilizan y/o interoperan con la Plataforma de Telesalud Denominador: Número total de jurisdicciones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Disaggregation			Número de prestaciones que se brindan mediante programas de Telesalud a nivel nacional					P	131,045	-	-	-	-	-
								A	131,045	181,173	-	-	-	312,218
Indicator			Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2023		
4.9	Numero de personas que reciben tratamiento con medicamentos esenciales			# of beneficiaries	0	2019	P	639,875	-	-	-	-	639,875	
							A	639,875	-	-	-	-	639,875	
Details														

Means of Verification: Sistema Integrado de reportes de logística y medicamentos, REMEDIAR

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Plan de respuesta integrada a la pandemia COVID-19 fortalecido	Plan	P	-	1	63,000	158,000
			P (a)	-	1	63,000	44,076.84
			A	-	1	44,076.84	44,076.84
1.02	Comités operativos a nivel nacional y provincial en funcionamiento	Número de comités	P	-	25	67,900	135,800
			P (a)	-	25	68,300	39,160.47
			A	-	25	39,160.47	39,160.47

Component Nbr. 2 Componente 2: Detección y seguimiento de los casos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria fortalecido y con capacidad de producir boletines epidemiológicos para grupos poblacionales específicos y con perspectiva de género	Sistema	P	-	1	-	900,000
			P (a)	1	1	669,797.48	440,735.58
			A	1	1	210,533.06	440,735.58
2.02	Laboratorios que reciben equipos e insumos para diagnóstico de COVID-19	Número de laboratorios	P	-	35	-	10,515,207
			P (a)	-	35	10,687,724	6,430,794.42
			A	-	35	1,088,284.61	6,430,794.42
2.03	Jurisdicciones que reciben insumos para diagnóstico rápido de COVID-19.	Jurisdicciones	P	-	24	-	5,416,702
			P (a)	-	24	5,320,000	3,133,677.63
			A	-	24	344.79	3,133,677.63
2.04	Talleres de capacitación al personal de los laboratorios pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios	Número de Talleres	P	-	4	-	1,450,000
			P (a)	-	5	1,733,947	588,807.44
			A	-	4	179,195.44	179,195.44

Component Nbr. 3 Componente 3: Interrupción de la cadena de transmisión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Municipios por año que reciben transferencias contra el cumplimiento de hitos vinculados a la implementación de planes locales de comunicación sobre riesgo y prevención (hábitos saludables), con perspectiva de género y diversidad	Municipios	P	50	100	12,350,000	27,690,200
			P (a)	-	100	12,350,000	16,282,447.35
			A	-	-	2,564,548.23	4,696,921.03
3.02	Jurisdicciones que reciben Equipos de Protección Personal para trabajadores de salud	Jurisdicciones	P	-	24	-	33,300,000
			P (a)	-	24	29,451,096	65,445,527.91
			A	24	24	56,005,293.5	65,288,502.91
3.03	Talleres de capacitación al personal de salud en la aplicación de protocolos con enfoque intercultural vinculados a la prevención y protección ante COVID-19	Número de Talleres	P	1	3	-	300,000
			P (a)	1	5	900,000	98,796.42
			A	1	5	98,796.42	98,796.42
3.04	Dosis de vacunas recibidas	Número de dosis	P	4,000,000	4,000,000	65,000,000	65,000,000
			P (a)	4,000,000	22,459,300	-	71,775,494
			A	22,459,300	22,459,300	-	71,775,494

Component Nbr. 4 Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Sistemas de registros nacionales (REFES, REFEPS, SMIS) fortalecidos para evaluación de brechas de suministro para proporcionar servicio a pacientes con COVID-19	Sistemas	P	3	3	-	960,000
			P (a)	1	3	409,915	288,348.46
			A	3	3	148,178.26	288,348.46
4.02	Establecimientos sanitarios que recibieron al menos un equipamiento crítico para la atención de pacientes con COVID-19	Número de establecimientos sanitarios	P	250	500	27,794,284	158,524,060
			P (a)	200	444	104,852,764	56,871,919.56
			A	175	275	17,068,862.28	47,050,874.28
4.03	Centros Modulares de Almacenamiento de Vacunas construidos	Número de Centros	P	9	9	8,167,082	10,230,000
			P (a)	-	6	2,062,918	6,937,850.35
			A	-	-	2,018,092.45	2,018,092.45
4.04	Depósito Central de Vacunas construido	edificio	P	1	1	14,850,000	14,850,000
			P (a)	1	-	14,850,000	-
			A	-	-	-	-
4.05	Establecimientos de salud con equipos digitales de diagnóstico por imágenes instalados	Número de establecimientos	P	96	96	18,304,400	64,922,000
			P (a)	-	110	11,654,400	92,401,937.76
			A	-	-	6,540,669.51	6,540,669.51
4.06	Centros de salud con sistema de Telesalud asíncrona y síncrona (para teleconsulta, teleeducación y telegestión)	Número de Centros	P	1,000	2,759	2,048,000	3,626,994
			P (a)	798	3,508	2,048,000	1,489,373.1
			A	1,547	3,508	-	1,489,373.1
4.07	Piloto de inteligencia artifical en teleconsulta implementado	Piloto	P	1	1	50,000	200,000
			P (a)	-	-	100,000	-
			A	-	-	-	-
4.08	Plan de gobernanza y normativa de Telesalud desarrollado	Plan	P	-	1	100,000	400,000
			P (a)	-	-	300,000	-
			A	-	-	-	-
4.09	Plataforma de Telesalud disponible para efectores (asíncrona)	Plataforma	P	1	1	-	209,000
			P (a)	-	1	209,000	1,218,056.6
			A	-	-	52,822.71	686,884.29
4.10	Tratamientos con medicamentos esenciales distribuidos	# of beneficiaries	P	32,976,200	64,800,000	63,039,794	79,495,196
			P (a)	33,129,446	96,493,426	23,245,294	181,412,645.33
			A	37,840,263	69,510,817	85,746,785.92	109,414,204.27
4.11	Unidades equipadas para la mejora en la gestión electrónica de medicamentos	Número de unidades	P	1,500	1,500	-	13,000,000
			P (a)	-	-	12,365,938	-
			A	-	-	-	-
4.12	Estudios sobre prevención, seguimiento y tratamiento de COVID-19	documentos	P	2	2	-	396,763
			P (a)	1	4	198,382	374,517.43
			A	3	3	301,870.03	301,870.03
4.13	Personal de salud capacitado en el uso adecuado y la gestión de medicamentos	Personas	P	3,750	8,250	20,000	100,000
			P (a)	3,722	12,377	60,000	28,967.2
			A	7,849	12,377	28,967.2	28,967.2
4.14	Jurisdicciones que reciben transferencias para la implementación de proyectos de inversión contra el cumplimiento de hitos	Número de jurisdicciones	P	24	24	44,109,459	100,014,189
			P (a)	24	24	56,608,298	86,755,138.8
			A	-	-	33,574,278.29	76,980,169.58
4.15	Recursos humanos capacitados en el funcionamiento de las redes integradas e integrales de servicios de salud y en la gestión del cambio	Personas	P	500	2,000	-	1,350,000
			P (a)	500	5,560	245,439	1,348,815.01

4.15	Recursos humanos capacitados en el funcionamiento de las redes integradas e integrales de servicios de salud y en la gestión del cambio	Personas	A	2,894	5,560	244,253.69	1,348,815.01
------	---	----------	---	-------	-------	------------	--------------

Other Cost				
	Administración del Proyecto	P	189,000	540,000
		P (a)	189,000	1,562,638.94
		A	575,438.94	575,438.94
	Auditoría Financiera	P	280,068	280,068
		P (a)	140,034	214,753.26
		A	126,644.46	126,644.46
	Consultores individuales DGPFE	P	157,500	450,000
		P (a)	157,500	0
		A	0	0
	Estudios de evaluación de impacto del proyecto	P	500,171	700,171
		P (a)	360,332	184,610
		A	0	0
	Estudios de evaluación REDES	P	370,000	370,000
		P (a)	370,000	277,428
		A	0	0
	Estudios de evaluación TeleSalud	P	160,000	160,000
		P (a)	160,000	0
		A	0	0
	Gastos de funcionamiento operativos	P	89,000	200,000
		P (a)	89,000	197,832.13
		A	64,602.37	145,832.13
Total Cost				
	Total Cost	P	257,709,658	595,844,350
		P (a)	291,920,078.48	595,844,349.99
		A	206,721,699.47	399,123,538.45

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Centros de salud con sistema de Telesalud asíncrona y síncrona (para teleconsulta, teleeducación y telegestión)	Modify Output	Modify Physical EOP P(a)	CCONDE	3/16/2023
	Centros Modulares de Almacenamiento de Vacunas construidos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	3/13/2023
	Comités operativos a nivel nacional y provincial en funcionamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/13/2023
			Modify Financial Historical Actual	MARIOSAN	3/30/2023
	Depósito Central de Vacunas construido	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CCONDE	3/16/2023
	Dosis de vacunas recibidas	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CCONDE	3/17/2023
	Establecimientos de salud con equipos digitales de diagnóstico por imágenes instalados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	5/10/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CCONDE	4/17/2023
	Establecimientos sanitarios que recibieron al menos un equipamiento crítico para la atención de pacientes con COVID-19	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
			Modify Physical EOP P(a)	CCONDE	3/17/2023
	Estudios sobre prevención, seguimiento y tratamiento de COVID-19	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
	Jurisdicciones que reciben Equipos de Protección Personal para trabajadores de salud	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
	Jurisdicciones que reciben transferencias para la implementación de proyectos de inversión contra el cumplimiento de hitos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
	Municipios por año que reciben transferencias contra el cumplimiento de hitos vinculados a la implementación de planes locales de comunicación sobre riesgo y prevención (hábitos saludables), con perspectiva de género y diversidad	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/13/2023
	Personal de salud capacitado en el uso adecuado y la gestión de medicamentos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/13/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CCONDE	3/16/2023
	Piloto de inteligencia artificial en teleconsulta implementado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	3/13/2023
	Plan de gobernanza y normativa de Telesalud desarrollado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	3/13/2023
	Plan de respuesta integrada a la pandemia COVID-19 fortalecido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/13/2023
			Modify Financial Historical Actual	MARIOSAN	3/30/2023
	Plataforma de Telesalud disponible para efectores (asíncrona)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
			Modify Financial Historical Actual	MARIOSAN	3/31/2023
	Recursos humanos capacitados en el funcionamiento de las redes integradas e integrales de servicios de salud y en la gestión del cambio	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
			Modify Financial Historical Actual	MARIOSAN	3/13/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CCONDE	3/16/2023
	Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria fortalecido y con capacidad de producir boletines epidemiológicos para grupos poblacionales específicos y con perspectiva de género	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/30/2023
	Talleres de capacitación al personal de los laboratorios pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/13/2023

Output	Talleres de capacitación al personal de los laboratorios pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	3/30/2023
	Talleres de capacitación al personal de salud en la aplicación de protocolos con enfoque intercultural vinculados a la prevención y protección ante COVID-19	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
	Tratamientos con medicamentos esenciales distribuidos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	5/10/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	5/10/2023
			Modify Physical Historical Actual	MARIOSAN	4/4/2023
	Unidades equipadas para la mejora en la gestión electrónica de medicamentos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIOSAN	3/31/2023
			Modify Financial Historical Actual	MARIOSAN	3/31/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	3/13/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
1	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	1.01	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	
	1.02	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	
	1.03	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
5	Inactive		Natural Environment		
	Response Actions				
	5.01	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	6.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	6.02	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Planning
	Response Actions		
	7.01	Management Strategy	Status
		TRANSFER	COMPLETE
	7.02	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	8.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	8.02	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Systems
	Response Actions		
	9.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	9.02	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Inactive		Governance Framework
	Response Actions		
	10.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	11.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Natural Environment
	Response Actions		
	12.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
