


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1292	Chief of Operations Validation Date	04/19/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/04/23
Last Update	04/14/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Support Integrated Public Expenditure Management	Loan Number	4802/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT RESULTS
Team Leader	GARCIA MEJIA, MAURICIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1292	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	9,073,294.12	22.68%	30,926,705.88
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	9,073,294.12	22.68%	30,926,705.88

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

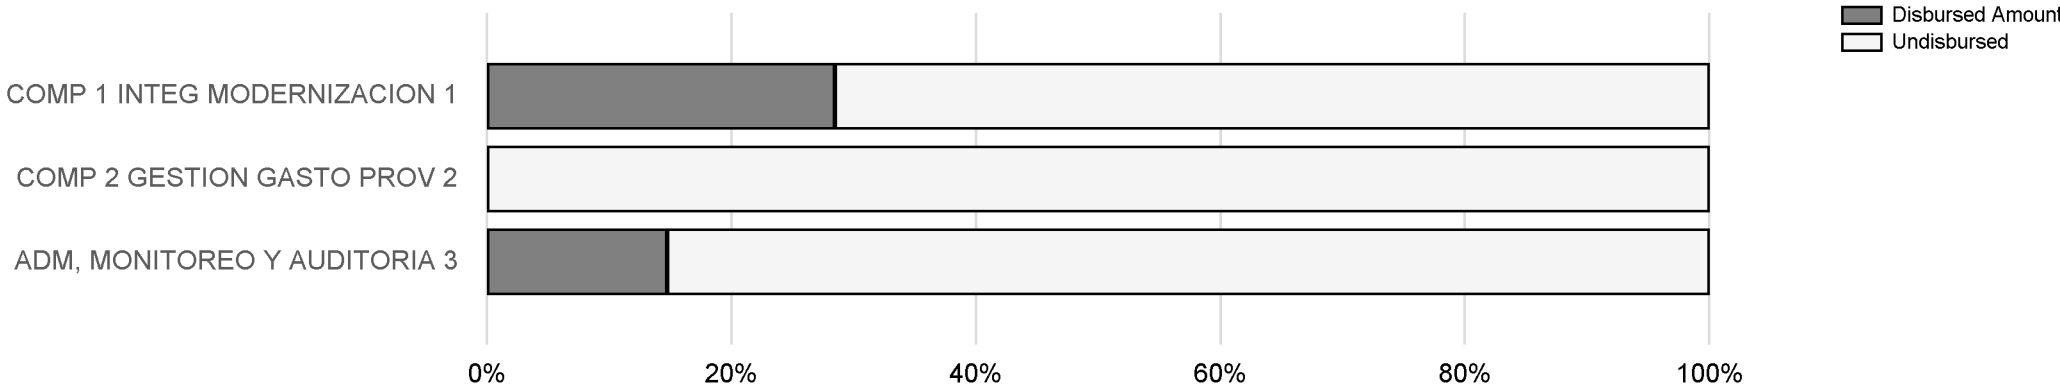

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: #1: Aumento en la efectividad en la gestión del gasto público

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Cumplimiento de las metas previstas de los Programas Sociales con resultados asignados	Porcentaje cumplido/total de metas	70	2018	2025	P	80
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de la Cuenta de Inversión Anual (Tomo II).

Observations: El indicador refiere al promedio ponderado por el gasto de la relación entre el valor logrado en la meta del indicador sobre el valor programado. Se tomará como universo los indicadores de resultados en los programas sociales listados en el PME, Anexo 2.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: #1: Aumento de la eficiencia en la gestión del gasto público nacional.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.0	Cumplimiento de los tiempos de ejecución programados en Programas prioritarios.	Porcentaje cumplido/total de metas	86	2017	P	93	93
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe de la Cuenta de Inversión Anual (Tomo II).

Observations: El indicador refiere al cumplimiento de las metas físicas sobre el total de las metas físicas planificadas, considerando cumplida la meta física lograda con hasta un desvío de 3 meses. Se tomará como universo el total de programas presupuestarios prioritarios con metas planificadas para el año, los cuales se detallan en el PME, Anexo 3. La medición se efectuará en marzo de cada año.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.1	Ejecución presupuestaria sobre crédito vigente en organismos de la APN.	Porcentaje ejecución/total presupuestario	88.9	2017	P	100	100
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe publicado de la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Observations: El indicador refiere a la relación entre la ejecución presupuestaria y el crédito vigente, específicamente para las categorías de bienes de uso y bienes de consumo (categorización por objeto del gasto). El detalle que justifica la medición puede verse en el PME, Anexo 4.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.2	Costo administrativo de procesar una licitación pública de bienes.	Costo de procesamiento en AR\$	66582	2017	P	59,924	59,924
					A	-	-

Details

Means of Verification: Estudio de costos sobre procesos seleccionados.

Observations: El indicador refiere a los costos de transacciones asociados a los procesos de Licitación Pública de Bienes, estimados para el Sistema de Administración Financiera (SAF) de ENOHSA.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: #2: Aumento de la transparencia en la gestión sub-nacional.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
2.0	Acceso a la información presupuestaria publicada por provincias beneficiarias.	Número de accesos	44186	2018	P	64,109	64,109
					A	-	-

Details

Means of Verification: Similar Web.

Observations: El indicador refiere a la cantidad promedio de accesos mensuales (medidos en "clicks" de ingreso) a las pág. oficiales de publicación de información financiera de c/provincia. La línea base y metas se estimaron considerando los registros de Similar Web en las cuatro provincias seleccionadas: Santa Cruz, Chubut, Catamarca y Santiago del Estero, según se detalla en el PME, Anexo 6.

Evaluation Methodology: -

--	--	--	--	--	--

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Means of Verification: Informe de evaluación de resultados de implementación por provincia.

Observations: El indicador refiere a la demora promedio en el que incurren las provincias seleccionadas en la presentación de la Cuenta de Inversión a la Legislatura Provincial, calculada a partir del vencimiento del plazo legal (180 días). La estimación de línea base y metas surge de la evaluación de resultados de despliegue y puesta en funcionamiento del e- Sidif en la Provincia de La Rioja, según se detalla en el PME, Anexo 7.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Integración y Modernización de los Sistemas de Información de Apoyo a la Gestión del Gasto Nacional.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Softwares desarrollados e interoperables con e-Sidif.	Software	P	1	3	650,000	900,000
			P (a)	1	3	344,960	960,103
			A	-	-	22,344	25,490
1.02	Interfaces de e-Sidif con sistemas transversales de la APN desarrolladas e interoperando.	Software de apoyo a la interfaz	P	2	4	340,000	670,000
			P (a)	1	4	460,000	713,945
			A	-	1	-	-
1.03	Organismos de la APN con sistemas desplegados y en funcionamiento.	Organismos	P	10	124	90,000	250,000
			P (a)	10	124	15,000	250,000
			A	-	-	-	-
1.04	Softwares de consolidación de información financiera con otras jurisdicciones desarrollados.	Software	P	1	2	105,000	190,000
			P (a)	-	2	-	190,000
			A	-	-	-	-
1.05	Proyectos de actualización tecnológica implementados en la DGSIAF.	Documento	P	-	5	5,700,000	12,000,000
			P (a)	4	10	6,062,862	10,952,884
			A	4	4	4,395,668	5,724,526
1.06	Proyectos de actualización tecnológica implementados en la Secretaría de Hacienda.	Documento	P	1	5	1,480,000	2,000,000
			P (a)	4	11	1,090,242	2,415,625
			A	5	7	956,914	973,144
1.07	Instrumentos para la gestión financiera contable y presupuestaria nacional desarrollados.	Documento	P	1	2	390,000	1,441,000
			P (a)	1	2	604,595	1,590,681
			A	-	-	77,159	123,488
1.08	Softwares para el monitoreo de las iniciativas prioritarias de gobierno y su relación presupuestaria desarrollados.	Software	P	1	2	150,000	230,000
			P (a)	1	2	80,000	303,109
			A	-	-	-	-
1.09	Programas presupuestarios con indicadores de resultados asignados.	Programa presupuestario	P	30	100	130,000	379,000
			P (a)	30	100	149,107	390,538
			A	10	30	39,020	58,914
1.10	Proyectos especiales de fortalecimiento de la gestión presupuestaria y financiera implementados en el Sector Público.	Documento	P	-	9	1,815,000	4,480,000
			P (a)	-	9	500,000	4,480,000
			A	-	-	-	-
1.11	Personas capacitadas en Administración Financiera y Presupuesto Público.	Certificado de capacitación	P	1,850	5,350	260,000	810,000
			P (a)	2,000	5,350	260,000	823,170
			A	90	90	13,651	13,651
1.12	Programas de capacitación financiera y presupuestaria desarrollados.	Curso de capacitación	P	2	6	515,000	650,000
			P (a)	2	6	200,000	656,477
			A	-	-	7,042	7,042

Component Nbr. 2 Componente 2: Apoyo a la Gestión del Gasto Provincial y Municipal.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	Provincias con e-Sidif desplegado y en funcionamiento.	Software implementado	P	-	5	1,745,000	4,500,000
			P (a)	1	5	500,000	4,609,375
			A	-	-	-	-
2.02	Proyectos integrales de mejora de administración financiera municipal implementados.	Documento	P	-	7	3,310,000	7,000,000
			P (a)	-	7	-	7,000,000
			A	-	-	-	-
2.03	Portales provinciales de presupuesto ciudadano implementados.	Software	P	2	5	180,000	500,000
			P (a)	-	5	-	500,000
			A	-	-	-	-
2.04	Programas presupuestarios provinciales y municipales con indicadores de seguimiento físico y financiero.	Programa presupuestario	P	15	50	365,000	1,000,000
			P (a)	20	50	350,000	1,036,328
			A	-	-	-	-
2.05	Personas capacitadas en gestión financiera y presupuestaria provincial.	Certificado de capacitación	P	1,350	4,330	420,000	1,000,000
			P (a)	500	4,330	110,000	1,000,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración, evaluación y monitoreo.	P	615,000	2,000,000
		P (a)	266,476	2,127,765
		A	219,850	363,374
Total Cost				
	Total Cost	P	18,260,000	40,000,000
		P (a)	10,993,242	40,000,000
		A	5,731,648	7,289,629

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Instrumentos para la gestión financiera contable y presupuestaria nacional desarrollados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
	Interfaces de e-Sidif con sistemas transversales de la APN desarrolladas e interoperando.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
	Personas capacitadas en Administración Financiera y Presupuesto Público.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
	Programas de capacitación financiera y presupuestaria desarrollados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
	Programas presupuestarios con indicadores de resultados asignados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
			Modify Financial Historical Actual	GLAFFAYE	4/3/2023
	Programas presupuestarios provinciales y municipales con indicadores de seguimiento físico y financiero.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
	Provincias con e-Sidif desplegado y en funcionamiento.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
	Proyectos de actualización tecnológica implementados en la DGSIAF.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
	Proyectos de actualización tecnológica implementados en la Secretaría de Hacienda.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
	Softwares desarrollados e interoperables con e-Sidif.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023
	Softwares para el monitoreo de las iniciativas prioritarias de gobierno y su relación presupuestaria desarrollados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/3/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Political Environment
	Response Actions		
	1	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Human Resources
	Response Actions		
	2	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Sustainability
	Response Actions		
	3	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	4	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	5	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	6	Management Strategy		Status	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
