


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1415	Chief of Operations Validation Date	04/22/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/01/23
Last Update	03/31/23	Country Representative Validation Date	05/02/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Strengthening Unified Health System in São Bernardo do Campo	Loan Number	3400/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	ROCHA, MARCIA GOMES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PREFEITURA DO MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O projeto no estágio atual está satisfatório conforme com as Políticas do BID a ele aplicáveis. As obras em construção contam com todas as licenças e planes de gestão ambiental e social requeridos. As condições de trabalho e de segurança dos trabalhadores estão adequadas. Recomendacao: • Implementar sistemática de acompanhamento das ações de SST e Meio Ambiente no canteiro de obras • Apresentar relatórios de verificação de atendimento de salvaguardas		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1415	80,050,000	59,050,000	59,050,000	0	139,100,000	59,050,000	55,506,997.05	94.00%	3,543,002.95
Aggregated	80,050,000	59,050,000	59,050,000	0	139,100,000	59,050,000	55,506,997.05	94.00%	3,543,002.95
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

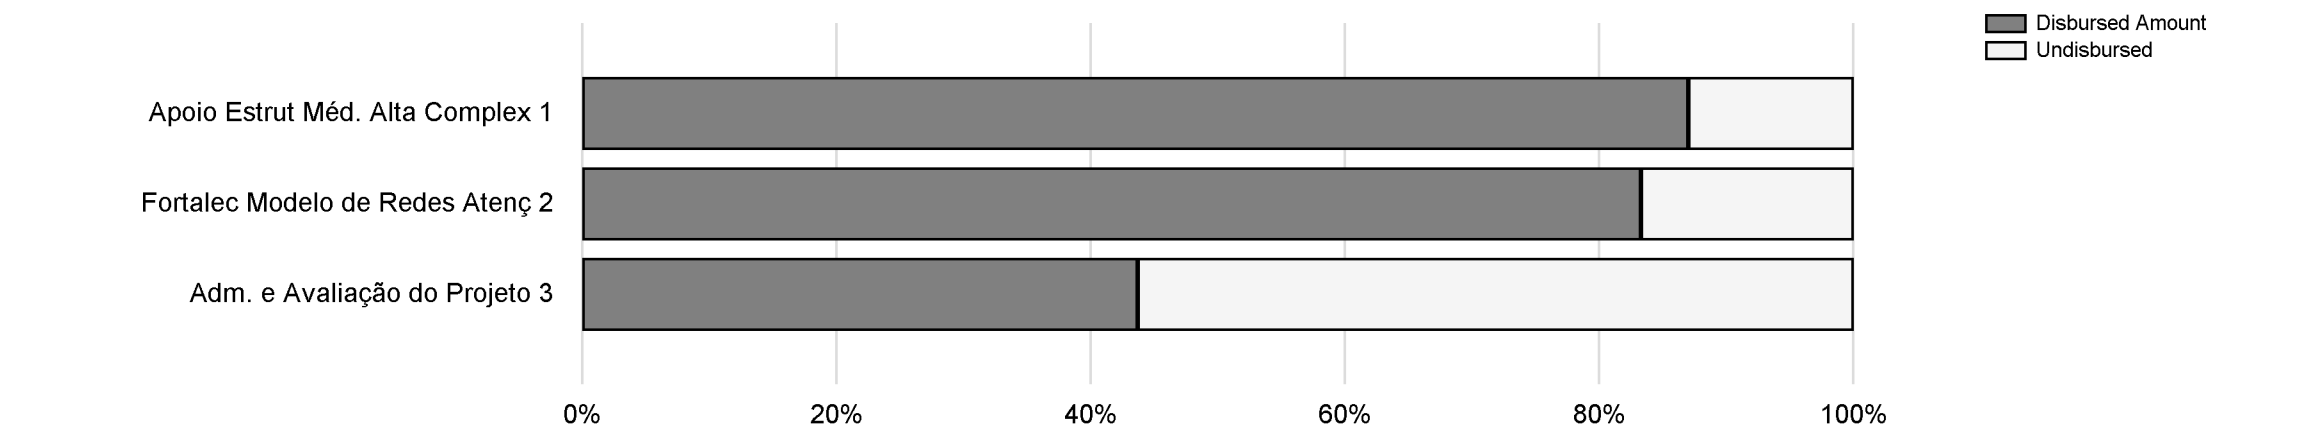

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Condições de Saúde da população de SBC melhoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Taxa de mortalidade precoce (30-59 anos) diabetes mellitus e suas complicações na população residente em SBC.	obitos	2.84	2015	2022	P	2.8
						A	-

Details

Means of Verification: SIM-SUS (Sistema de Informação de Mortalidade) e IBGE.

Observations: número de óbitos por diabetes mellitus e suas complicações na população residente em SBC, na faixa etária de 30 a 59 anos / população residente em SBC na faixa etária de 30-59 anos x 100.000 hab;. Linha de base mulheres: 1.8; linha de base homens: 4.78.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
		Mulheres				P	1.95		
						A	-		
		Homens				P	9.25		
						A	-		
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023		
0.1	Taxa de mortalidade precoce (30-59 anos) por doença cerebrovascular na população residente em SBC.			obitos	21.31	2015	2022	P	20
								A	-

Details

Means of Verification: SIM-SUS (Sistema de Informação de Mortalidade) e IBGE.

Observations: número de óbitos por doença cerebrovascular na população residente em SBC na faixa etária de 30 a 59 anos / população residente em SBC na faixa etária de 30-59 anos x 10.000 hab. Linha de base mulheres: 18.42; linha de base homens: 23.91

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
		Mulheres				P	42.24	
						A	-	
		Homens				P	39.24	
						A	-	
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Proporção de internações por causas selecionadas sensíveis à Atenção Básica	numero de hospitalizações		12.7	2015	2022	P	12
							A	-

Details

Means of Verification: SIH-SUS (Sistema de Informação Hospitalar)

Observations: número de internações de residentes em SBC por causas sensíveis à AB / total de internações de residentes em SBC x 100. Linha de base mulheres: 11.34; linha de base homens: 14.50

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

		Mulheres				P	21.5	
						A	-	
		Homens				P	27.5	
						A	-	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023		
0.3	Taxa de mortalidade neonatal institucional (HMU)	obitos	7.3	2015	2022	P	6.5	
							A	-
Details								

Details

Means of Verification: SIM (Sistema de Informação de mortalidade) e SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos)

Observations: número de óbitos em menores de 28 dias ocorridos no HMU/ número de nascidos vivos no HMU x 1.000

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: Indicadores de resultado final												
Observation:												
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2021	EOP 2023
0.0	Taxa anual de internação hospitalar por diabetes mellitus e suas complicações na população de 30 a 59 anos de idade, residente em SBC.		número de internações	1.36	2015	P	-	-	1.33	-	1.3	1.3
						A	-	-	-	1.13	-	-
Details												
Means of Verification: DATASUS, SIH-SUS, IBGE												
Observations: Número de hospitalizações por diabetes mellitus e suas complicações na população residente em SBC, na faixa etaria de 30 a 59 anos/ população residente em SBC na faixa etaria de 30-59 anos x 10.000 habitantes												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2021	EOP 2023
0.1	Taxa anual de internação hospitalar por acidente vascular cerebral na População de 30 a 59 anos de idade, residente em SBC.		número de internações	5.2	2015	P	-	-	4.8	-	4.5	4.5
						A	-	-	-	4.99	-	-
Details												
Means of Verification: DATASUS, SIH-SUS, IBGE												
Observations: Número de hospitalizações por acidente cerebrovascular na população residente em SBC na faixa etaria de 30 a 59 anos/ população residente na SBC na faixa etaria de 30-59 anos x 10.000 habitantes												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2021	EOP 2023
0.2	Proporção de partos SUS de residentes realizados na rede SUS Municipal		partos	83.4	2015	P	-	-	90	-	95	95
						A	-	-	-	88.8	-	-
Details												
Means of Verification: DATASUS, SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos)												
Observations: Número de partos SUS de residentes em SBC realizados na rede SUS Municipal/ total de partos SUS de residentes em SBC												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Specific Development Objectives Nbr. 1: Indicadores de Resultados Intermediários												
Observation:												
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2021	EOP 2023
1.0	Pessoas que recebem serviços de saúde na rede SUS municipal		# of beneficiaries	359684	2015	P	-	-	375,000	-	385,000	385,000
						A	377,720	397,376	394,877	403,157	-	-
Details												
Means of Verification: TABNET ANS/IBGE												
Observations: População total do município – beneficiários de planos de saúde (assistência médica)												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2021	EOP 2023
1.1	Proporção de parto normal em primíparas na rede SUS municipal	partos	62.54	2015	P	-	-	65	-	67	67
					A	-	-	-	64.33	-	-
Details											
Means of Verification: SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos)											
Observations: número de partos normais em primíparas realizados na rede SUS Municipal / total de partos de primíparas realizados na rede SUS Municipal											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2021	EOP 2023
1.2	Proporção de parto normal na rede SUS municipal	partos	61.21	2015	P	-	-	64	-	66	66
					A	-	-	-	60.9	-	-
Details											
Means of Verification: SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos)											
Observations: número de partos normais realizados na rede SUS Municipal / total de partos realizados na rede SUS Municipal											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2021	EOP 2023
1.3	Consultas médicas em CARDIOLOGIA realizadas na rede SUS municipal	consultas médicas	19107	2015	P	-	-	21,000	-	23,000	23,000
					A	-	-	-	24,651	-	-
Details											
Means of Verification: Total de consultas médicas em CARDIOLOGIA realizadas na rede SUS municipal											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2021	EOP 2023
1.4	Consultas médicas em ENDOCRINOLOGIA realizadas na rede SUS municipal	consultas médicas	11840	2015	P	-	-	14,000	-	16,000	16,000
					A	-	-	-	12,785	-	-
Details											
Means of Verification: Total de consultas médicas em ENDOCRINOLOGIA realizadas na rede SUS municipal											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2021	EOP 2023
1.5	Consultas médicas em NEUROLOGIA realizadas na rede SUS municipal	consulta médica	26388	2015	P	-	-	28,000	-	30,000	30,000
					A	-	-	-	24,847	-	-
Details											
Means of Verification: Total de consultas médicas em NEUROLOGIA realizadas na rede SUS municipal											

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Component Nbr. 1 C1: Estruturação da atenção especializada de alta e media complexidade

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Estudos e projetos básicos e executivos das obras concluídos	relatorio	P	-	3	-	4,646,711
			P (a)	2	11	330,884.2	2,804,777.66
			A	1	10	63,455.89	2,560,130.38
1.02	Hospital de Urgências segundo especificações técnicas do SUS construído	Hospital	P	-	1	-	38,900,000
			P (a)	-	1	-	35,525,976.52
			A	-	1	-	35,522,580.8
1.03	Hospital de Urgências segundo especificações técnicas do SUS equipado	Lotes	P	-	4	-	14,756,927
			P (a)	1	5	691,569.03	4,916,021.84
			A	2	6	1,060,960.31	5,285,413.12
1.04	Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	Hospital	P	-	1	-	36,280,639
			P (a)	1	1	8,355,747.73	18,522,544.35
			A	1	1	6,954,037.99	16,216,550.44
1.05	Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	Lotes	P	-	4	-	13,170,798
			P (a)	3	4	3,168,922.2	4,028,173.22
			A	1	2	526,866.65	1,274,914.61
1.06	Policlínica de Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	policlinicas	P	-	1	-	1,254,312
			P (a)	1	1	413,886.81	402,398.51
			A	1	1	396,453.94	396,453.94
1.07	Policlinicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	policlinicas	P	-	3	-	3,253,991
			P (a)	1	4	111,844.31	419,533.93
			A	1	3	47,063.79	349,735.57
1.08	Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construída	UPA	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	313,455.89	1,521,385.5
			A	-	-	574,554.17	812,776.71
1.09	Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	Lote	P	-	-	-	-
			P (a)	2	2	372,814.36	383,354.74
			A	-	-	26,492.04	26,492.04
1.10	Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construído	CAPS	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	428,387.96
			A	-	1	46,248.61	433,643.25
1.11	Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	Lote	P	-	-	-	-
			P (a)	-	2	-	36,381.31
			A	-	2	-	38,268.59
1.12	Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Farina segundo as especificações técnicas do SUS construído	CAPS	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	599,187.67
			A	-	1	-	599,187.67
1.13	Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Farina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	Lote	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	55,244.9
			A	-	1	-	57,606.23
1.14	Hospital de Urgência em funcionamento de acordo com as especificações técnicas do SUS	Leitos	P	-	-	-	-
			P (a)	150	240	2,513,323.21	30,691,166.39
			A	150	240	2,513,323.21	30,691,166.39

Component Nbr. 2 C2: Fortalecimento do modelo de atenção em RAS

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Solução Data Center Saude implementada	módulos	P	-	2	-	4,165,138
			P (a)	-	2	306,552.53	1,708,715.37
			A	-	2	311,079.43	1,713,242.27
2.02	Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	unidades	P	-	80	-	5,834,971
			P (a)	2	80	1,360,456.41	5,419,088.52
			A	2	80	729,762.28	4,918,004.63
2.03	Sistema de gestão da informação em saúde implementado (online)	módulos	P	-	9	-	4,998,410
			P (a)	-	7	13,618.03	460,710.59
			A	-	7	35,865.96	482,958.52
2.04	Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias cronicas implementadas	Relatórios	P	-	72	-	303,829
			P (a)	1	74	249,148.55	3,657,158.35
			A	-	73	507,035.6	3,915,045.4
2.05	Materiais de comunicação e informação (video, cartilhas, guias, material eletrônico etc) sobre as Linhas de Cuidado elaborados	peças	P	-	7	-	210,000
			P (a)	-	9	-	33,385.22
			A	-	9	-	33,385.23
2.06	Seminarios tecnicos de linhas de cuidados elaborados	Seminarios	P	-	10	-	122,000
			P (a)	-	10	-	52,448.01
			A	-	10	-	52,448.01
2.07	Capacitação e formação diversa dos profissionais realizadas	Profissionais	P	-	400	-	350,000
			P (a)	-	561	1,818.61	53,930.17
			A	-	561	2,236.89	54,348.45
2.08	Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	Relatórios	P	-	2	-	200,000
			P (a)	1	2	70,000	85,019.64
			A	1	1	32,880.5	32,880.5

Component Nbr. 3 C3: Administração e Avaliação do Programa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	Sistema	P	-	1	-	110,000
			P (a)	-	1	8,879.5	130,190.49
			A	-	1	16,040.53	110,399.2
3.02	Avaliação de Impacto realizada	Relatórios	P	-	3	-	250,000
			P (a)	2	3	40,503.8	140,293.55
			A	-	1	35,807.72	71,395.91
3.03	Avaliação Final realizadas	Relatórios	P	-	2	-	95,300
			P (a)	1	1	37,076.38	37,076.38
			A	-	-	-	-
3.04	Interoperabilidade de Sistemas	Sistema	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	2,000,000	1,884,463.94
			A	-	-	-	-

Other Cost

	Outros custos	P		5,557,065
		P (a)	35,614.29	2,716,186.78

	Outros custos	A	383,838.21	2,560,029.59
	Auditorias	P		200,000
		P (a)	46,274.78	277,914.58
		A	30,610.34	211,113.4
Total Cost				
	Total Cost	P	0	139,100,003
		P (a)	20,442,390.62	122,908,010.37
		A	14,294,614.06	114,337,065.13

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Avaliação de Impacto realizada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
	Estudo direitos sexuais e reprodutivo realizado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
	Estudos e projetos básicos e executivos das obras concluídos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/31/2023
	Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
	Hospital da Mulher segundo as especificações técnicas do SUS reabilitado e ampliado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
	Interoperabilidade de Sistemas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/31/2023
	Linhas de cuidados diabetes, hipertensão, materno-infantil, respiratórias crônicas implementadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
	Policlínica de Alvarenga segundo as especificações técnicas do SUS reabilitada e ampliada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
	Policlínicas segundo as especificações técnicas do SUS equipadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARTHURDO	3/31/2023
	Prédio do IMASF adquirido	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	ARTHURDO	3/17/2023
	Serviços finais concluídos	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	ARTHURDO	3/17/2023
	Sistema de Gestão Financeira desenvolvido e implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
	Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Silvina segundo as especificações técnicas do SUS construída	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
	Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Silvina segundo as especificações técnicas do SUS equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023
	Unidades de saúde com cabeamento e equipamento (hardware) adquirido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARTHURDO	3/15/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
1	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	1	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Planning		
	Response Actions				
	2	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	3	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Inactive		Political Environment		
	Response Actions				
	4	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
5	Active		Internal Processes		
	Response Actions				
	5	Management Strategy		Status	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
