


PMR Public Report

Operation Number	PR-L1176	Chief of Operations Validation Date	04/20/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/05/23
Last Update	04/19/23	Country Representative Validation Date	05/12/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Strengthen Paraguay’s National Statistics System	Loan Number	5224/OC-PR
Executing Agency	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Team Leader	MEJIA-GUERRA, JOSE ANTONIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PR-L1176	43,000,000	43,000,000	0	0	43,000,000	43,000,000	29,359,602.53	68.28%	13,640,397.47
Aggregated	43,000,000	43,000,000	0	0	43,000,000	43,000,000	29,359,602.53	68.28%	13,640,397.47
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

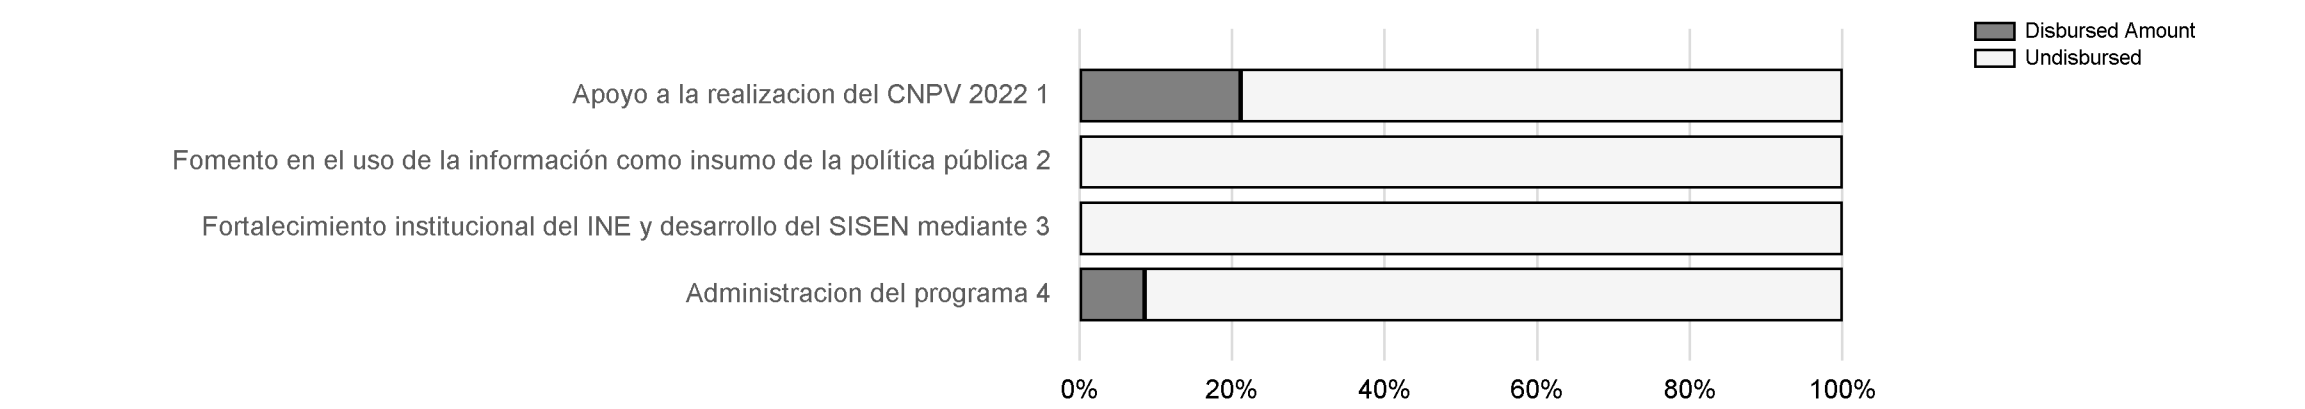

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.0	Solicitudes anuales de información de fuentes censales del sector público	# Solicitudes	450	2020	2026	P	675
						A	-

Details

Means of Verification: Sistema de Registro de Solicitudes de Informaciones Sociodemográfica del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Este indicador se puede observar al finalizar la vida del proyecto. Información de fuentes censales incluye: base de datos censal, proyecciones y cartografía censal

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.1	Solicitudes anuales de información de fuentes censales del sector privado			# Solicitudes	1085	2020	2026	P	1,628
								A	-
Details									

Means of Verification: Sistema de Registro de Solicitudes de Informaciones Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Este indicador se puede observar al finalizar la vida del proyecto. Información de fuentes censales incluye: base de datos censal, proyecciones y cartografía censal

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad, y accesibilidad

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.0	Indicadores producidos que pueden ser estimados a partir de la información censal para dar seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	%	57	2020	P	-	75
					A	-	-

Details

Means of Verification: Publicación de los indicadores en la página web del INE

Observations: Atributo: relevancia El % se calcula dividiendo los indicadores ODS que el INE calcula actualmente con datos censales (20) entre el total de indicadores (ODS) que se pueden producir con base a información censal (35)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.1	Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del censo de población y la fecha de publicación de los resultados básicos definitivos nacionales (por grupos de edad y por sexo)	Meses	24	2014	P	-	12
					A	-	-

Details

Means of Verification: Publicación de datos en la página web del INE

Observations: Atributo: oportunidad Línea de base: Censo de Población de 2012 El universo se refiere a los 17 Departamentos. Los 258 Municipios, más el Distrito Capital (Asunción) La meta final se refiere a la planificación para el censo 2022

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.2	Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del Censo Indígena y la fecha de publicación de los resultados básicos definitivos nacionales (por grupos de edad y sexo)	Meses	22	2014	P	-	12
					A	-	-

Details

Means of Verification: Publicación de datos en la página web del INE

Observations: Atributo: oportunidad Línea de base: Censo de Población de 2012

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.3	Tasa de omisión del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	%	25.6	2012	P	-	7
					A	-	-

Details

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.4	Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos	Número	0	2020	P	-	1
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Informes semestrales de avance e informe final aprobados por el Banco

Observations: La agencia gubernamental se refiere al INE

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Apoyo a la realización del CNPV 2022

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
1.01	P1. Base de datos cartográfica actualizada y digitalizada para el operativo censal desarrollada	Base Digital	P	1	1	7,844,555	7,844,555
			P (a)	1	1	7,844,555	6,889,241
			A	1	1	6,889,241	6,889,241
1.02	P2. Censo experimental ejecutado	Censo experimental	P	1	1	908,755	908,755
			P (a)	1	1	908,755	393,647
			A	1	1	393,647	393,647
1.03	P3. Campaña de publicidad y sensibilización censal desarrolladas	Campanas	P	1	2	3,116,147	3,116,557
			P (a)	1	2	3,116,147	1,248,657
			A	1	1	1,248,247	1,248,247
1.04	P4. Operativo de campo para el CNPV desarrollado	Censo	P	-	1	17,487,780	23,566,519
			P (a)	1	1	17,487,780	18,394,027
			A	1	1	15,171,976	15,171,976
1.05	P5. Censo Indígena realizado	Censo	P	-	1	640,591	640,591
			P (a)	1	1	640,591	147,104
			A	1	1	147,104	147,104
1.06	P6. Base de datos de población validada y consistenciada	base de datos	P	-	1	180,841	1,470,506
			P (a)	-	1	180,841	7,868,087
			A	-	-	766	766
1.07	P7. Información de resultados del CNPV validados y difundidos	Publicaciones	P	-	6	-	427,337
			P (a)	-	6	-	3,133,535
			A	-	-	-	-
1.08	P8. Evaluación de cobertura censal desarrollada	documentos	P	-	1	25,179	25,179
			P (a)	-	1	25,179	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. Fomento en el uso de la información como insumo de la política pública

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
2.01	P9. Talleres para estimular y difundir el uso de la información censal realizados	informes	P	-	3	-	143,176
			P (a)	-	3	-	231,996
			A	-	-	-	-
2.02	P10. Estudios que utilizan la información censal desarrollados (proyecciones)	Estudios	P	-	5	-	103,576
			P (a)	-	5	-	97,666
			A	-	-	-	-
2.03	P11. Estudios temáticos a la luz de datos censo 2022 desarrollados (investigaciones). Incluyendo al menos uno sobre temas de género, y otro sobre población con discapacidad.	Estudios	P	-	20	-	413,544
			P (a)	-	20	-	410,891
			A	-	-	-	-
2.04	P12. Plataforma tecnológica de procesamiento de datos en línea implementada	Plataforma	P	-	1	-	11,285
			P (a)	-	1	-	11,212
			A	-	-	-	-
2.05	P13. Geoportal combinando distintas fuentes de información con la cartografía digital censal funcionando	Geoportal	P	-	1	157,309	928,420
			P (a)	-	1	157,309	774,150
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento institucional del INE y desarrollo del Sistema Estadístico Nacional (SISEN) mediante el aprovechamiento estadístico de los RA

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
3.01	P14. Metodologías estandarizadas de captura estadística de datos de RA (con énfasis en temas de género y diversidad) a instituciones del SISEN	Asistencias Metodológicas	P	-	10	-	189,944
			P (a)	-	10	-	248,191
			A	-	-	-	-
3.02	P15. Marco muestral maestro de viviendas actualizado	Marco muestral disponible	P	-	1	-	11,285
			P (a)	-	1	-	11,212
			A	-	-	-	-
3.03	P16. Talleres de capacitación para responsables de registros administrativos y para promover el uso de información estadística por parte del sector público (central y subnacional) y del sector privado realizados	Talleres	P	-	10	-	146,915
			P (a)	-	10	-	145,973
			A	-	-	-	-
3.04	P17. Actividades de capacitación a funcionarios del INE realizadas (cursos, talleres, diplomados, seminarios, capacitación en el trabajo)	funcionarios capacitados	P	-	30	-	151,857
			P (a)	-	30	-	94,821
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración del Programa	P	893,655	2,299,999
		P (a)	893,655	2,299,590
		A	643,219	643,219
	Imprevistos	P	0	600,000
		P (a)	0	600,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	31,254,812	43,000,000
		P (a)	31,254,812	43,000,000
		A	24,494,200	24,494,200

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	P1. Base de datos cartográfica actualizada y digitalizada para el operativo censal desarrollada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P10. Estudios que utilizan la información censal desarrollados (proyecciones)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P11. Estudios temáticos a la luz de datos censo 2022 desarrollados (investigaciones). Incluyendo al menos uno sobre temas de género, y otro sobre población con discapacidad.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P12. Plataforma tecnológica de procesamiento de datos en línea implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P13. Geoportal combinando distintas fuentes de información con la cartografía digital censal funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P14. Metodologías estandarizadas de captura estadística de datos de RA (con énfasis en temas de género y diversidad) a instituciones del SISEN	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P15. Marco muestral maestro de viviendas actualizado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P16. Talleres de capacitación para responsables de registros administrativos y para promover el uso de información estadística por parte del sector público (central y subnacional) y del sector privado realizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P17. Actividades de capacitación a funcionarios del INE realizadas (cursos, talleres, diplomados, seminarios, capacitación en el trabajo)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P2. Censo experimental ejecutado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P3. Campaña de publicidad y sensibilización censal desarrolladas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P4. Operativo de campo para el CNPV desarrollado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P5. Censo Indígena realizado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P6. Base de datos de población validada y consistenciada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P7. Información de resultados del CNPV validados y difundidos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023
	P9. Talleres para estimular y difundir el uso de la información censal realizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SIMONZ	3/24/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	1	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Planning
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	3	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Human Resources
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Political Environment
	Response Actions		
	5	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Human Resources
	Response Actions		
	6.01	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Planning
	Response Actions		
	7.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Active		Planning		
	Response Actions				
	8.01	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
9	Active		Planning		
	Response Actions				
	9.01	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
10	Inactive		Political Environment		
	Response Actions				
	10	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
11	Active		Planning		
	Response Actions				
	11.01	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	12.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Human Resources
	Response Actions		
	13.01	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
14	Active		Planning		
	Response Actions				
	14	Management Strategy		Status	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
