


# PMR Public Report

Operation Number	UR-L1135	Chief of Operations Validation Date	04/13/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/28/23
Last Update	04/03/23	Country Representative Validation Date	05/02/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Support Agricultural Public Management II	Loan Number	3800/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	DE SALVO, CARMINE PAOLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1135	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	6,910,442.23	90.93%	689,557.77
Aggregated	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	6,910,442.23	90.93%	689,557.77

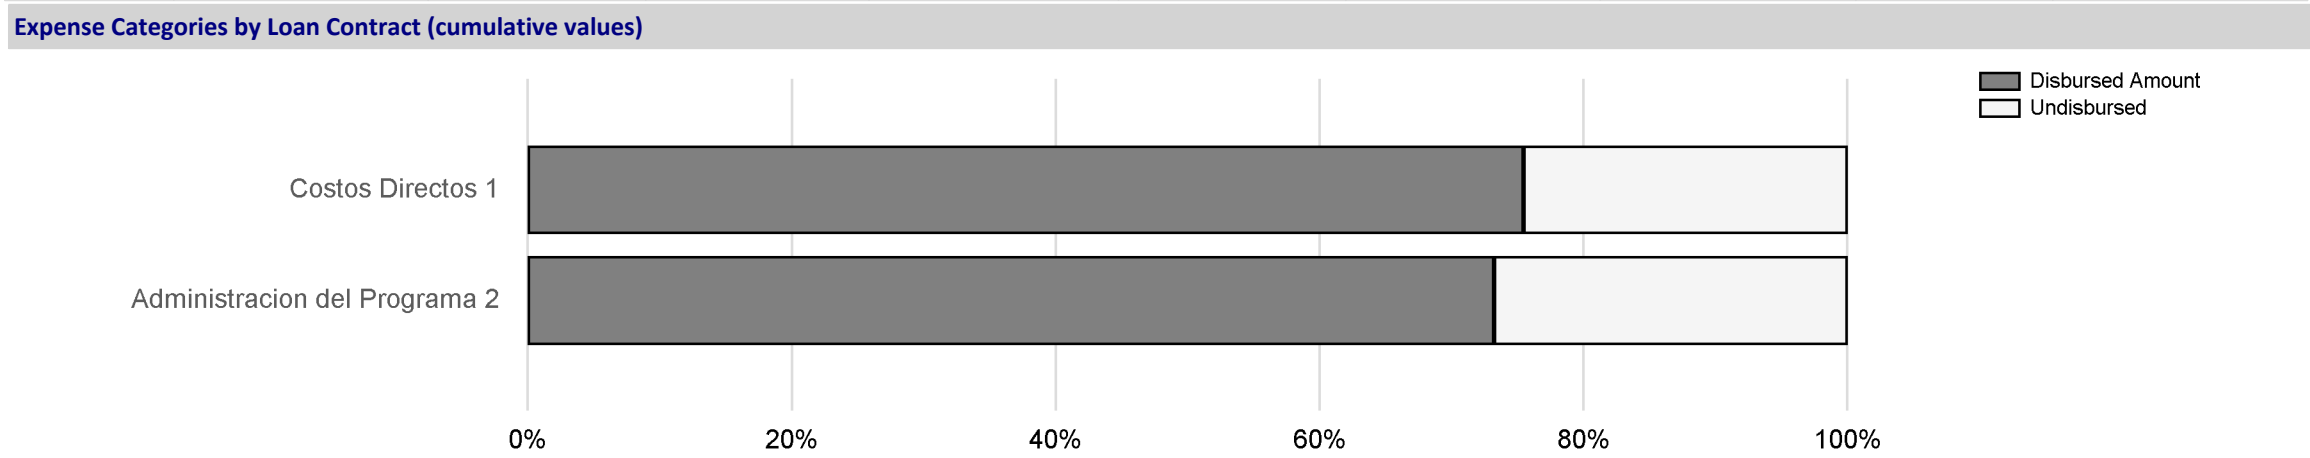

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Incrementar el valor de las exportaciones agroalimentarias de Uruguay

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Valor de las exportaciones	Miles de U\$S	4060	2015	2022	P	4,400
						A	-

Details

Means of Verification: Uruguay XXI

Observations: Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar los mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias de Uruguay	Número de Mercados	302	2015	2022	P	312
						A	-

Details

Means of Verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Suma de mercados de carne, lácteos y granos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Disminución del costo de trámites de exportación correspondientes al MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) en carne y lácteos

Observation: Estimado con base en 262.000 t de carne y 118.934 t de lácteos, año 2015

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
0.0	Costo de trámites por tonelada - Carne	U\$S	5.55	2015	P	-	2.78
					A	-	-

Details

Means of Verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Estimado con base en 262.000 t de carne, año 2015

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
0.1	Costo de trámites por tonelada - Lácteos	U\$S	2.15	2015	P	-	1.07
					A	-	-

Details

Means of Verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Estimado con base en 118.934 t de lácteos, año 2015

Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Specific Development Objectives Nbr. 1: Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)

Observation: El rubro de línea de base es pesca; los que se prevé incorporar son carne, lácteos y granos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2023
1.0	Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)	Rubros	1	2015	P	-	4
					A	-	-
Details							
Means of Verification: VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior) de Uruguay XXI							
Observations: El rubro de línea de base es Pesca; los que se prevé incorporar son carnes, lácteos y granos							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Specific Development Objectives Nbr. 2: Disminución de observaciones de inocuidad en exportaciones de alimentos

Observation:							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
2.0	Notificaciones anuales RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)	Número de notificaciones	6	2013	P	-	4
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Reporte Anual del Food and Feed Safety Alerts (RASFF)

Observations: Línea de base es promedio 2012-2014. Valor de fin de proyecto, Promedio 2021 - 2023

Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			


Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejora en la eficiencia del laboratorio

Observation: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.0	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Ganaderos	Días	7	2015	P	-	3
					A	-	-

Details

Means of Verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)

Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.1	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Agrícolas	Días	10	2015	P	-	5
					A	-	-

Details

Means of Verification: MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)

Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Cantidad de Notificaciones electrónicas realizadas por año	P	-	32,400	-	236,327
			P (a)	50	50	17,159.44	236,362.42
			A	-	-	19,174	226,115.42
1.02	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Domicilios electrónicos constituidos en la BDDE	P	-	10,000	-	178,305
			P (a)	100	200	17,159.44	174,256.2
			A	-	-	26,903	164,009.2
1.03	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	% de expedientes gestionados por medios electrónicos	P	-	100	-	538,379
			P (a)	60	100	262,812.15	864,708.8
			A	60	60	176,071	638,427.8
1.04	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Oficinas clave	P	-	9	-	359,168
			P (a)	6	9	41,421.69	340,903.92
			A	3	3	29,250	208,473.92
1.05	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	% de trámites con gestión total vía web incorporados durante el Programa	P	-	83	-	935,309
			P (a)	4	179	248,167.94	1,088,360.65
			A	4	177	216,871	857,163.65
1.06	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Oficina construida y operanodo	P	-	1	-	710,471
			P (a)	-	1	100,538.83	792,154.29
			A	-	1	99,395	769,737.29
1.07	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Centros Administrativos	P	-	4	-	348,033
			P (a)	-	-	21,300.47	351,781.13
			A	-	-	23,815	339,061.13
1.08	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Funcionarios Capacitados por el Programa	P	-	25	-	320,535
			P (a)	5	73	19,121.69	112,036.2
			A	24	73	14,069	106,589.2

Component Nbr. 2    Componente 2. Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	% de avance en desarrollo e implementación	P	-	100	-	925,743
			P (a)	17	100	144,414.53	1,022,978.09
			A	13	88	87,051	771,462.09
2.02	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Laboratorios integrados al SIGLA	P	-	10	-	899,030
			P (a)	15	31	144,414.53	804,327.9
			A	5	13	87,051	552,811.9
2.03	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Grado de avance de obra y equipamiento	P	-	100	-	724,030
			P (a)	80	100	104,414.53	833,846.22
			A	64	84	5,049	692,482.22
2.04	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	No. de sustancias	P	-	23	-	119,030
			P (a)	5	20	4,414.53	83,501.13
			A	1	17	5,049	80,865.13
2.05	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Protocolos aprobados	P	-	8	-	76,713
			P (a)	2	15	112,000	132,076.02
			A	5	14	21,204	37,443.02
2.06	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Reportes del observatorio	P	-	1,200	-	273,713
			P (a)	250	2,400	70,000	72,228.89
			A	656	2,300	4,820	68,228.89
2.07	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Reportes del observatorio	P	-	24	-	226,713
			P (a)	15	201	25,265.71	144,047.28
			A	58	191	28,355	121,882.28
2.08	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Barreras Sanitarias con sistema inteligente	P	-	3	-	598,758
			P (a)	4	11	253,220	819,524
			A	3	9	132,428	424,063

Other Cost				
	Administración del Programa (seguimiento, evaluación, auditorías)	P		529,743
		P (a)	68,929.87	458,575.43
		A	84,984	409,521.43
Total Cost				
	Total Cost	P	0	8,000,000
		P (a)	1,654,755.35	8,331,668.57
		A	1,061,539	6,468,337.57

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NOHORAF	3/18/2023
	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NOHORAF	3/18/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	1	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	2	Management Strategy	Status



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Monitoring & Evaluation
