


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1071	Chief of Operations Validation Date	04/16/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/18/23
Last Update	03/30/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Development of Tourism Corridors	Loan Number	2606/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	Sector/Subsector	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	SABRA, MARIEL	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La UE (Ministerio de Turismo de la Nación) con apoyo de la Inspección tercerizada realizan un adecuado seguimiento de cumplimiento socioambiental en las respectivas obras. Se observa el cumplimiento de los requerimientos socioambientales en las obras por parte de las contratistas. Se toman en cuenta medidas de mitigación de la contaminación en las obras (dispersión de polvo, prevención de derrames, etc.). Faltó reportar información vinculada a la obra en Rio Pipo (T. Del Fuego) en el ICAS y en los informes de seguimiento socioambiental de obras.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1071	80,000,000	68,406,000	25,000,000	0	105,000,000	68,406,000	68,406,000	100.00%	-
Aggregated	80,000,000	68,406,000	25,000,000	0	105,000,000	68,406,000	68,406,000	0.00%	-
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

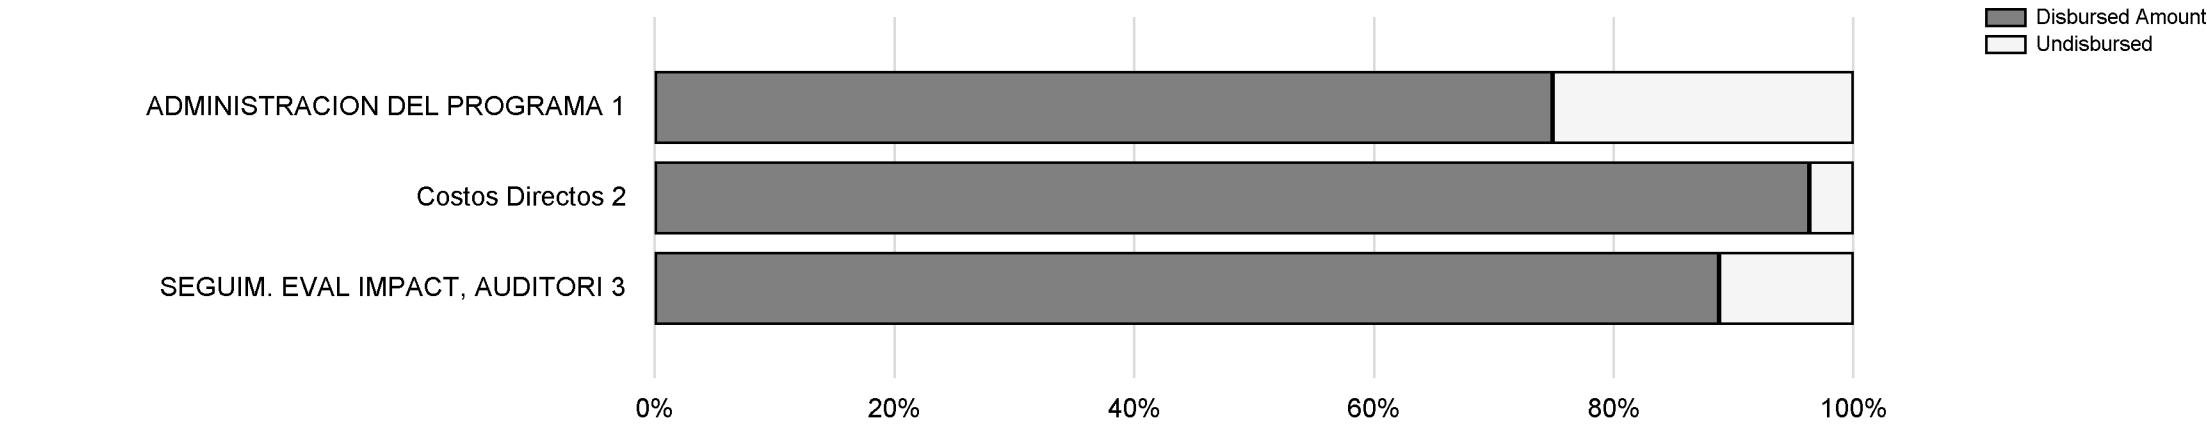

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incremento del gasto turístico en los corredores del Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.1	Gasto total de turistas que visitan parques nacionales	USD millones	1742	2010	2021	P	1,808
						A	-
Details							

Means of Verification: Administración de Parques Nacionales

Observations: Fuente de Línea de Base: Administración de Parques Nacionales

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 2: Aprovechamiento espacial de APs y destinos asociados mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
2.1	Días de estadía media	Días	2.51	2010	2021	P	2.25
						A	-
Details							

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: La línea de base corresponde a la región patagónica (agrupa 4 de los 6 corredores del Programa y el 76,5% de plazas de alojamiento). En cuanto a la Meta FDP, la previsión basada en la tendencia logarítmica es que la estadía media para el conjunto de la r

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 3: Aprovechamiento temporal de APs y destinos asociados mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
3.1	Desviación estándar de las pernотaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor Ruta 40 disminuída	Desviación estándar	42634	2010	2021	P	39,891
						A	-
Details							

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Ruta 40: promedio mensual nro. pernотaciones y desviación estándar: 71.651, desv. est. 42.634. Para establecer la meta en cada corredor se han equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por debajo del

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
3.2	Desviación estándar de las pernотaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor de los Lagos disminuída	Desviación estándar	150932	2010	2021	P	141,430
						A	-

Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Corredor de los Lagos: promedio mensual nro. pernотaciones y desviación estándar: 275.257, desv. est. 150.932. Para establecer la meta en cada corredor se han equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
3.3	Desviación estándar de las pernотaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor Ushuaia disminuída	Desviación estándar	19581	2010	2021	P	12,094
						A	-

Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Corredor Ushuaia: promedio mensual nro. pernотaciones y desviación estándar: 56.010, desv. est. 19.581. Para establecer la meta en cada corredor se han equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por de

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
3.4	Desviación estándar de las pernотaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor Iguazú disminuída	Desviación estándar	18067	2010	2021	P	16,395
						A	-
Details							

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Corredor Iguazú: promedio mensual nro. pernотaciones y desviación estándar: 104.355, desv. est. 18.067. Para establecer la meta en cada corredor se han equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por de							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
3.5	Desviación estándar de las pernотaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor Cuyo disminuída	Desviación estándar	4523	2010	2021	P	3,623
						A	-
Details							

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)							
Observations: Línea de base Corredor Cuyo: promedio mensual nro. pernотaciones y desviación estándar: 34.848, desv. est. 4.523. Para establecer la meta en cada corredor se han equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por debajo							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
3.6	Desviación estándar de las pernотaciones mes a mes a lo largo del año (estacionalidad) en el Corredor del Litoral disminuída	Desviación estándar	22874	2010	2021	P	19,051
						A	-

Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Corredor Litoral: promedio mensual nro. pernотaciones y desviación estándar: 55.082, desv. est. 22.874. Para establecer la meta en cada corredor se han equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por de

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Oferta turística en productos relacionados con Áreas Protegidas diversificada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
1.1	Prestadores turísticos en actividades relacionadas/complementarias ofreciendo productos para la puesta en valor de Áreas Protegidas	Prestadores turísticos en actividades complementarias	438	2010	P	-	-	28	-	55	-	-	-	-	521
					A	-	-	-	1,360	-	-	964	-	-	-

Details

Means of Verification: Medición anual - Dirección de Inversiones Turísticas MINTUR

Observations: Los prestatarios de actividades turísticas complementarias representan sólo el 8.45% del conjunto de establecimientos turísticos en los 6 corredores, frente al 40% del alojamiento y el 23% de establecimientos gastronómicos. Para el cálculo de la meta incr

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Cadenas de valor turística en los corredores del programa fortalecidas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
2.1	Capital Humano vinculado a la actividad turística fortalecido/capacitado	Número de personas	700	2012	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	690	-	273	306	-	18,896	-	-

Details

Means of Verification: Informes de progreso UEPI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
3.1	Municipios capacitados y con un sistema de indicadores ambientales y su correspondiente plan de implementación elaborado	Municipios	1	2010	P	-	-	14	-	6	-	-	-	-	21
					A	-	-	11	15	-	2	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de progreso UEPI

Observations: 21 municipios con un plan para la implementación de un sistema de indicadores ambientales elaborado.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
3.2	Áreas Protegidas con un sistema de indicadores ambientales implementado y en permanente actualización	Areas Protegidas	0	2010	P	-	-	9	-	6	-	-	-	-	15
					A	-	-	-	14	-	-	1	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de progreso APN

Observations: 15 APs con un sistema de indicadores ambientales implementado y en permanente actualización.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a productos turísticos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Inversores internacionales y nacionales recibiendo el Catálogo de Inversiones	Inversores	P	-	31	-	2,500,000
			P (a)	-	5	-	3,505,712.13
			A	-	5	117,805	1,130,024.13
1.02	Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios desarrollados	Plan Operativo	P	-	6	-	800,000
			P (a)	-	-	200,123	-
			A	-	-	-	-
1.03	Proyectos (obras) estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminados	Obras	P	-	58	-	69,040,000
			P (a)	-	29	3,100,000	47,492,325.27
			A	-	28	2,638,964	47,020,903.27
1.04	MIPyMes Turísticas beneficiadas con el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística - FACT	# of MSMEs	P	-	-	-	-
			P (a)	-	2,570	-	34,059,682.07
			A	-	2,570	9,478	34,069,160.07

Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Gestores públicos y privados en turismo capacitados	Tourism destinations (#)	P	-	800	-	1,250,000
			P (a)	-	1,233	-	471,765.32
			A	-	1,233	-	471,765.32
2.02	Proyectos de Certificación del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados	Proyectos	P	-	8	-	1,250,000
			P (a)	-	7	200,000	674,380.67
			A	-	7	53,156	674,380.67

Component Nbr. 3 Gestión ambiental

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público y capacidad de carga, elaborados	Planes de manejo	P	-	18	-	3,630,000
			P (a)	-	25	-	652,598.81
			A	-	25	-	652,598.81
3.02	Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y ambiental elaborados	Municipios	P	-	15	-	2,000,000
			P (a)	-	6	-	381,058
			A	-	6	-	381,058
3.03	Informes de supervisión ambiental de obras elaborados	Informe de supervisión	P	-	58	-	720,000
			P (a)	-	27	-	13,855.74
			A	-	27	-	13,855.74
3.04	Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios implementado	Sistema de monitoreo	P	-	6	-	1,000,000
			P (a)	-	6	-	689,618.8
			A	-	6	-	689,618.8
3.05	Areas Protegidas con protocolos de seguridad y planes de contingencia implementados	PN	P	-	15	-	450,000
			P (a)	-	15	-	19,486.68
			A	-	15	-	19,486.68
3.06	Municipios con Directrices Ambientales implementadas	Municipios	P	-	10	-	2,600,000
			P (a)	-	16	-	1,214,498.01
			A	-	16	-	1,214,498.01
3.07	Estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredor realizados	Estudios	P	-	6	-	900,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Administración, seguimiento, evaluación de impacto, auditorías e imprevistos

				FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP
4.00			P	-
			P (a)	-
			A	-

Other Cost				
	Gastos Administrativos MINTUR	P		5,000,000
		P (a)	0	5,397,120.44
		A	633,076	4,997,120.44
	Gastos Administrativos APN	P		3,500,000
		P (a)	100,000	1,403,094.39
		A	59,071	1,403,094.39
	Evaluación de impacto	P		1,000,000
		P (a)	75,000	545,661.67
		A	40,799	545,661.67
	Auditorías	P		500,000
		P (a)	0	0
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	105,000,000

	Total Cost	P (a)	3,675,123	96,520,858
		A	3,552,349	93,283,226

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Inversores internacionales y nacionales recibiendo el Catálogo de Inversiones	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EBUCHTER	3/29/2023
	Proyectos (obras) estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EBUCHTER	3/29/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	EBUCHTER	3/29/2023
	Proyectos de Certificación del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EBUCHTER	3/29/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
1	Inactive		Environmental and Social Safeguards		
	Response Actions				
	1	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Materialized		Organizational Structure		
	Response Actions				
	2.01	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	2.02	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Technical Design
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Human Resources
	Response Actions		
	5	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	6.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	7	Management Strategy	Status

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
