


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1387	Chief of Operations Validation Date	04/22/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/04/23
Last Update	03/27/23	Country Representative Validation Date	05/08/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Present State Project: Citizen Security in Espírito Santo	Loan Number	3279/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	PANTOJA VERA, RODRIGO ANDRES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO ESPIRITU SANTO		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1387	56,000,000	56,000,000	14,000,000	0	70,000,000	56,000,000	23,371,179.05	41.73%	32,628,820.95
Aggregated	56,000,000	56,000,000	14,000,000	0	70,000,000	56,000,000	23,371,179.05	41.73%	32,628,820.95
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

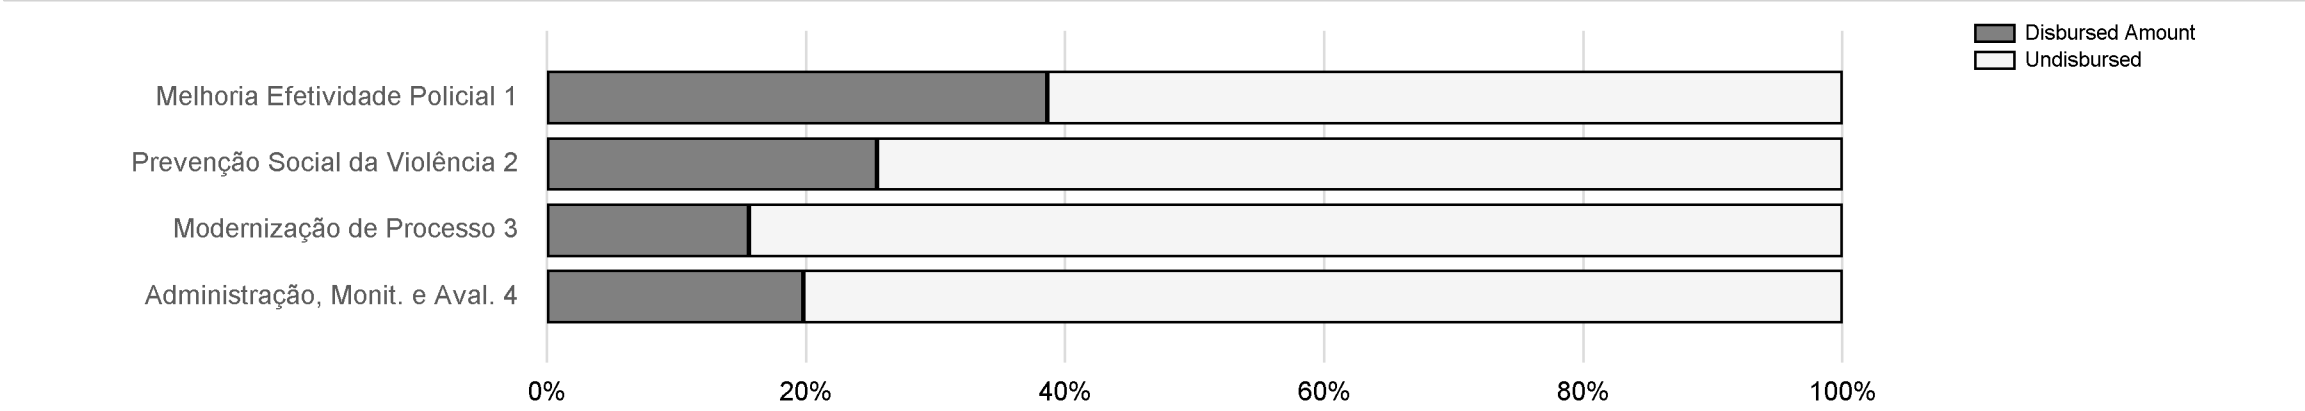

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir para a redução dos índices de crimes violentos (homicídios e roubos) em 09 municípios no ES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
0.0	Homicídios nos 09 Municípios	Taxa por 100 Mil Hab.	49.7	2013		P	31.05
						A	-
Details							

Means of Verification: SESP

Observations: A taxa foi calculada em função de 1.133 homicídios em uma população total de 2.280.501. O monitoramento deste indicador como dos outros se realizara como parte da implementação do Programa. A metodologia para a projeção da meta para 2022 tem como referência o alinhamento nacional para a redução das taxas de homicídio que é de 5% ao ano. As taxas para 2018 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2013) e um impacto conversador de 20% considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vivo impacto atribuível de uma redução de 69% no número de homicídios; Diadema, alcançou redução de 85% de homicídios de jovens entre 16 a 20 anos de idade.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
0.2	Roubos nos 09 Municípios			Taxa por 100 Mil Hab.	694.9	2013		P	555.92
								A	-
Details									

Means of Verification: SESP

Observations: O número de roubos observado em 2013 foi de 15.847 nos 09 municípios, cuja população era de 2.280.501. Foram considerados os seguintes incidentes de roubos: roubo a pessoa em via pública, em transporte coletivo, em estabelecimento comercial, em residência e condomínio e de veículo. A meta de redução de taxa é de 20% em função dos programas de policiamento comunitário e de prevenção: Programa IGESP contribuiu com uma redução de 24% nos delitos contra o patrimônio, o que significa voltar à taxa observada em 2011.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 1: Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã	Subnational governments (#)	9	2015		P	9
						A	-
Details							

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Subnational governments benefited by citizen security projects (#) ()		
		Municipal			P	9	
					A	-	
		Subnational			P	9	
					A	-	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado 1: Aumentar a efetividade das Polícias Civil e Militar no controle e investigação da criminalidade violenta em 09 Municípios do Espírito Santo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2025
0.0	Homicídios de jovens de 15 e 24 anos de idade nos 09 Municípios	Taxa por 100 Mil Hab.	130.4	2013	P	96.5	96.4
					A	-	-

Details

Means of Verification: SESP

Observations: A taxa foi calculada em função de 533 homicídios com uma população total de jovens de 15 a 24 anos de 372.114. O monitoramento deste indicador e de outros será realizado como parte da implementação do programa. A projeção das taxas para (2020 e 2022) toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2013), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vivo impacto atribuível de uma redução de 69% no número de homicídios; Diadema, alcançou redução de 85% nos homicídios de jovens entre 16 a 20 anos de idade.A taxa foi calculada em função de 533 homicídios com uma população total de jovens de 15 a 24 anos de 372.114. O monitoramento deste indicador e de outros será realizado como parte da implementação do programa. A projeção das taxas para 2022 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2013), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2025	
0.1	Homicídios de jovens afrodescendentes de 15 e 24 anos de idade nos 09 Municípios			Taxa por 100 Mil Hab.	179.7	2013	P	125.6	125.6
							A	-	-
Details									

Means of Verification: SESP

Observations: No ano de 2013 havia nos 09 municípios 237061 afrodescendentes de 15 a 24 anos de idade. Destes, 468 foram vítimas de homicídio (estimativa com base no IBGE e Informação da GEAC/SESP-ES). A projeção das taxas para 2022 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2103), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vivo impacto atribuível de uma redução de 69% no número de homicídios; Diadema, alcançou redução de 85% nos homicídios de jovens entre 16 a 20 anos de idade.No ano de 2013 havia nos 09 municípios 412.907 afrodescendentes de 15 a 24 anos de idade. Destes, 468 foram vítimas de homicídio (estimativa com base no IBGE e Informação da GEAC/SESP-ES). A projeção das taxas para 2022 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2103), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vi

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2025	
0.2	Investigação de homicídios esclarecidos no Espírito Santo dentro de 01 ano e enviados ao Ministério Público - Resolutividade de inquéritos de homicídios dolosos no Estado.			%	54	2014	P	66	66
							A	-	-
Details									

Means of Verification: SESP

Observations: Este indicador refere-se a porcentagem de todas as investigações de homicídios dolosos registrados pela Polícia Civil, nas quais: (i) - é identificado o autor material do crime; e (ii) - o caso é enviado à consideração do Ministério Público. Em 2014 foram instaurados 1.379 inquéritos de homicídios dolosos, dos quais 751 foram esclarecidos e enviados ao Ministério Público (fonte SESP - Fevereiro 2014). O dado da linha de base corresponde aos casos do Espírito Santo no ano de 2014. O impacto reconhece que o maior esforço para redução do estoque de investigações já foi realizado, e que o programa continuará seu esforço dentro da tendência observada entre 2011 e 2012 de um incremento anual de 4 pontos percentuais, e que o projeto terá como foco a melhora da qualidade das investigações. A meta proposta é consistente com o desempenho da Polícia Civil, no cumprimento dos objetivos do Programa Federal Meta 2 (alcançando a solução de 55% nos crimes em aberto cometidos antes de 2008), é consiste

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado 2: Incrementar as oportunidades de inclusão social dos jovens entre 15 a 24 anos de idade, em condições de risco à violência

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2025
0.4	Roubos cometidos que tiveram como autor um jovem de 15 a 24 anos de idade nos 09 Municípios.	%	96	2012	P	77	77
					A	-	-

Details

Means of Verification: SESP

Observations: A linha de base foi calculada em função de 08 municípios. A SESP fará atualização conforme os dados a serem entregues pelas Delegacias do Estados nos municípios e posteriormente será atualizada. A taxa de participação presume uma taxa de êxito de 20% como resultado dos programas de prevenção. Este resultado é consistente com a evidência preliminar vinculada ao uso produtivo do jovem em comunidades, que indica uma redução de 33%. "New pool programs help to reduce local crime", Smith, B. (1993), Recreation Exchange, vol. 5, no. 3. Resultado: O vandalismo e os roubos diminuíram me 85% graças ao Programa com o uso de Piscinas. A linha de base, em 96%, corresponde a 622 jovens de 648 casos de roubo com autoria identificada.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado 3: Reduzir a reincidência delitiva dos jovens

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2025
0.0	Jovens egressos do ano anterior e que voltaram a ingressar aos centros IASES para servir uma nova medida de internação no Espírito Santo.	Taxa	48.8	2013	P	38	38
					A	-	-

Details

Means of Verification: SEAE e IASES

Observations: Em 2012, havia 62 jovens com menos de 17 anos de idade cumprindo medida de internação, dos quais 30 retornaram ao IASES para servir uma nova medida de internação em 2013, o que significa uma taxa de reingresso de 48,8%. A meta foi estimada em função de que serão implementados serviços para apoio à reinserção social dos egressos e um impacto conservador de redução de 20%. Este impacto é consistente com a evidência internacional, que sugere uma redução de 53%. "Metodología de Tratamiento del Comportamiento Cognitivo de Infractores Jóvenes y Adultos", Lipsey, M. Landenberger, N.A., Wilson, S. J. (2007).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I - Melhoria da efetividade policial para o controle e investigação do crime

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	1.1 - Módulos de Delegacia Online DEON/BAON e BI para estatística e análise criminal e Observatório da Violência desenvolvidos e implementados.	módulos	P	-	14	-	5,736,772
			P (a)	6	14	769,029.96	8,324,115.06
			A	3	10	1,163,131.54	4,112,618.91
1.02	1.2 - Efetivos policiais capacitados em Policiamento Comunitário, atendimento à Comunidade, Direitos Humanos e Análise Criminal.	# of public officials	P	400	1,700	125,000	500,000
			P (a)	150	4,204	49,459	457,387.72
			A	912	3,324	-	6,667.82
1.03	1.3 - 30 núcleos de polícia comunitária implantados.	núcleos	P	-	108	-	9,921,875
			P (a)	1	30	-	5,382,843.74
			A	1	30	-	5,382,843.74
1.04	1.4 - Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica do Espírito Santo, desenhado, construído, equipado e em funcionamento.	Centro	P	-	2	-	11,450,173
			P (a)	-	2	-	11,148,703.39
			A	-	-	-	-
1.05	1.5 - Fóruns comunitários de Segurança nos Bairros do Programa fortalecidos e em funcionamento.	Fóruns	P	-	26	-	141,180
			P (a)	10	30	6,851	106,786.28
			A	7	21	-	1,786.28
1.06	1.6 - Certificação Semestral do funcionamento adequado do controle interno e externo da polícia nos territórios do programa.	Certificate	P	2	10	25,000	250,000
			P (a)	1	2	25,000	60,000
			A	-	-	-	-
1.07	1.7 - Reformas e ampliação do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (CIODES) Metropolitano e melhoria dos espaços de formação da Polícia Militar voltados à capacitação do efetivo em policiamento comunitário.	unidades	P	-	-	-	-
			P (a)	1	2	575,109	1,036,670.59
			A	-	1	291,396.2	291,396.2

Component Nbr. 2 Componente II - Prevenção Social da Violência para a População Jovem

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	2.1 - Rede de Centros de Cidadania Jovem de serviços de prevenção da violência juvenil nos 10 municípios do programa funcionando anualmente.	Redes	P	-	1	2,641,761	28,000,000
			P (a)	1	1	4,248,148	26,428,322.97
			A	1	1	5,316,924.57	7,651,906.71

Component Nbr. 3 Componente III - Modernização do Processo de Ressocialização

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
3.01	3.1 - Servidores públicos que atuam nos centros IASES capacitados.	servidores	P	350	2,570	107,294	907,400
			P (a)	350	4,738	30,925	129,000
			A	1,197	4,113	-	-
3.02	3.2. - Modelo de atendimento aos jovens infratores desenvolvido e implementado anualmente.	Modelo	P	1	5	-	9,692,600
			P (a)	1	8	599,147	10,337,892.49
			A	1	5	855,792.95	1,643,572.88

Component Nbr. 4 Administração do Projeto

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
4.01	4.1. - Administração, monitoramento e avaliação do Programa.	Consultorias	P	1	5	250,000	3,400,000
			P (a)	1	8	543,112	3,290,679.53
			A	1	5	299,795.19	728,345.8

Total Cost					
	Total Cost	P		3,149,055	70,000,000
		P (a)		6,846,780.96	66,702,401.77
		A		7,927,040.45	19,819,138.34

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	1.1 - Módulos de Delegacia Online DEON/BAON e BI para estatística e análise criminal e Observatório da Violência desenvolvidos e implementados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	1.2 - Efetivos policiais capacitados em Policiamento Comunitário, atendimento à Comunidade, Direitos Humanos e Análise Criminal.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/17/2023
	1.4 - Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica do Espírito Santo, desenhado, construído, equipado e em funcionamento.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/17/2023
	1.6 - Certificação Semestral do funcionamento adequado do controle interno e externo da polícia nos territórios do programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/24/2023
	1.7 - Reformas e ampliação do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (CIODES) Metropolitano e melhoria dos espaços de formação da Polícia Militar voltados à capacitação do efetivo em policiamento comunitário.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	2.1 - Rede de Centros de Cidadania Jovem de serviços de prevenção da violência juvenil nos 10 municípios do programa funcionando anualmente.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	2.1.11 - Acompanhamento dos jovens para permanência na escola realizado.	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/23/2023
	2.1.3 - Centros de Cidadania equipados.	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/17/2023
	2.1.6 - Jovens beneficiados em atividades escolares de aceleração e alfabetização (EJA)	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	2.1.7 - Jovens que recebem capacitação laboral.	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/17/2023
	3.1 - Servidores públicos que atuam nos centros IASES capacitados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	3.2. - Modelo de atendimento aos jovens infratores desenvolvido e implementado anualmente.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/17/2023
	3.2.1 -Atividades de esporte, cultura e recreação para jovens internados implementadas.	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	3.2.4 - Atividades de capacitação laboral para jovens internados implementadas.	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	3.2.5 - Construção da nova Unidade de Internação Socioeducativa - UNIS, espaço para servidores do IASES entregues e em funcionamento e humanização das Unidades Socioeducativas	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	3.2.6 - 13 Unidades IASES equipadas em quatro etapas.	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	3.2.9 - Modelo de escolarização específica para as Unidades de Internação e Internação Provisória	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
	4.1. - Administração, monitoramento e avaliação do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/21/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/17/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	1.02	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	2	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	4	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Inactive		Systems
	Response Actions		
	5.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	5.02	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Inactive		Political Environment		
	Response Actions				
	6	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Sustainability
	Response Actions		
	7	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Active		Technical Design		
	Response Actions				
	8	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Integrity
	Response Actions		
	9.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	9.02	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
10	Active		Technical Design		
	Response Actions				
	10	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Planning
	Response Actions		
	11.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	11.02	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
