


# PMR Public Report

Operation Number	UR-L1110	Chief of Operations Validation Date	04/25/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/01/23
Last Update	04/25/23	Country Representative Validation Date	05/02/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Support the National Integrated Care System	Loan Number	3706/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	BAGOLLE, ALEXANDRE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Tanto el MGAS como el PGAS de la operación no contemplan la nueva tipología de obras incluidas en el Programa, que consisten en remodelaciones o ampliaciones en centros existentes que atienden a infancia y adolescencia en situación de riesgo psicosocial. Hay una oportunidad de mejora realizando talleres de sensibilización en los centros donde se mantendrán los servicios mientras se realizan las obras. El equipo del ejecutor no cuenta con experiencia llevando adelante la gestión socioambiental de las obras en acuerdo con las políticas del Banco en la materia. No se reporta la gestión socioambiental al Banco.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1110	50,000,000	33,988,764	15,000,000	0	65,000,000	33,988,764	32,969,753.85	97.00%	1,019,010.15
Aggregated	50,000,000	33,988,764	15,000,000	0	65,000,000	33,988,764	32,969,753.85	97.00%	1,019,010.15
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

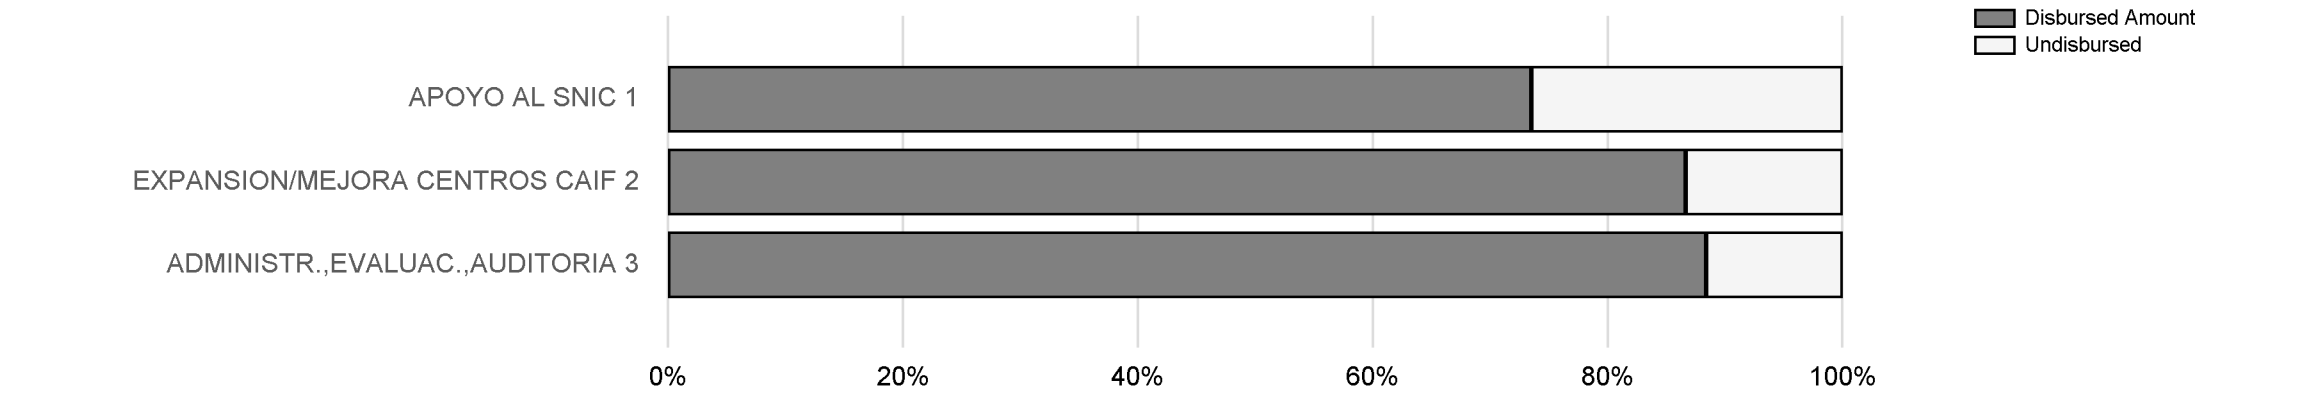

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Niños en nuevos centros CAIF con puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico.	% niños en nuevos centros CAIF	14	2016	2022	P	10
						A	-

Details

**Means of Verification:** Informes SNIC/DINEM-INAU

**Observations:** ASQ-3 es una herramienta de detección precoz de rezagos en el desarrollo infantil.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.1	Centros CAIF nuevos con puntaje ITERS-R entre 5 y 7.			% centros CAIF	0	2016	2022	P	80
								A	-
Details									

**Means of Verification:** Informes SNIC/DINEM-INAU

**Observations:** ITERS-R es un instrumento de medición de calidad en centros para niños.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.			hs semanales de trabajo	9	2016	2022	P	7
								A	-
Details									

**Means of Verification:** EUT 2013 y 2019

**Observations:** Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.3	Carga de trabajo no remunerado de cuidado infantil.			hs semanales de cuidado infantil	21.2	2016	2021	P	20
								A	-
Details									

**Means of Verification:** EUT 2013 y 2019

**Observations:** Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019. En el caso de este indicador, hay una línea de base y una meta para mujeres (21.2) y otra para varones (14.8)

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
			Mujeres		P	20	
					A	-	
			Varones		P	16	
					A	-	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del SNIC.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year			2019	2021	2023	EOP 2023
0.0	Porcentaje de cuidadores registrados en el RNC.	%	0	2016	P		25	50	-	50
					A		25	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year			2019	2021	2023	EOP 2023
0.1	Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios registradas en el RNC.	%	0	2016	P		75	100	-	100
					A		-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year			2019	2021	2023	EOP 2023
0.2	Porcentaje de usuarios registrados en el RNC.	%	0	2016	P		50	100	-	100
					A		-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year			2019	2021	2023	EOP 2023
0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0	2016	P		50	100	-	100
					A		100	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.4	Número de postulaciones para prestaciones.	#	0	2016	P	3,500	5,000	-	5,000
					A	10,000	-	-	-
Details									
Means of Verification: Sistemas de información del SNC									
Observations: Las prestaciones a considerar son: Asistente Personal, Tele asistencia, Centro de día, y Casa comunitaria Definir postulación como: beneficiario elegible (cumple requisitos) y está ingresado en el RNC.									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.5	Porcentaje de personas con conocimiento de derechos y prestaciones en el marco del SNIC.	%	0	2016	P	25	50	-	50
					A	46	-	-	-
Details									
Means of Verification: Informes SNIC									
Observations: Informe producido a partir de encuesta a ser realizada por la SNC									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.6	Porcentaje de trabajadores de CAIF nuevos, formados según nueva currícula.	%	0	2016	P	50	80	-	80
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Informes semestrales de avance, e informe específico sobre calidad de centros.									
Observations: Se mide sobre los centros CAIF nuevos operando en el momento de medición									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.7	Porcentaje de usuarios satisfechos por al pertinencia de las innovaciones del Pl.	%	60	2016	P	80	90	-	90
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Informes semestrales de avances del programa.									
Observations: Medición que forma parte de la agenda de conocimiento del SNIC									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.8	Porcentaje de niños de los CAIF pertenecientes a hogares elegibles para AFAM Plan de Equidad (condición de vulnerabilidad socioeconómica)	%	64	2016	P	68	72	-	72
					A	-	-	-	-
Details									

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2021	2023	EOP 2023
0.9	Tasa de matriculación de los nuevos centros CAIF (niños/cupos)			tasa niños/cupos	0	2016	P	85	95	-	95
							A	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Registros administrativos INAU

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Diseño del Portal de Cuidados aprobado por SNIC.	Portal	P	-	1	-	561,645
			P (a)	-	1	-	92,839.08
			A	-	1	-	92,839.08
1.02	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	# nuevas funcionalidades	P	-	5	-	4,036,083
			P (a)	4	5	1,949,431	9,948,801.23
			A	5	4	2,039,814	8,164,048.23
1.03	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Documento - disño RNC	P	-	1	-	150,898
			P (a)	-	2	-	-
			A	-	1	-	-
1.04	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	# módulos RNC	P	-	5	-	878,722
			P (a)	3	5	430,764	5,162,866.13
			A	3	3	354,225	4,187,065.13
1.05	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	# personas valoradas	P	-	10,500	-	1,544,144
			P (a)	2,000	19,381	166,895	1,059,166.19
			A	2,254	18,381	223,126	881,157.19
1.06	Campañas de comunicación implementadas.	# campañas de comunicación	P	-	4	-	3,318,400
			P (a)	-	5	-	703,915.47
			A	-	5	-	718,051.47
1.07	Encuestas de opinión realizadas.	# encuestas de opinión	P	-	5	-	85,400
			P (a)	-	3	-	78,023.1
			A	-	3	-	78,023.1
1.08	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	# iniciativas territoriales de comunicación	P	-	120	-	1,046,875
			P (a)	-	74	3,050	831,378.78
			A	-	74	3,173	831,501.78
1.09	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	# líneas de trabajo	P	-	15	-	1,007,573
			P (a)	1	13	-	1,090,466.72
			A	1	13	7,709	1,085,406.72
1.10	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	# estudios	P	-	12	-	1,197,186
			P (a)	1	9	50,000	179,791.58
			A	-	9	-	179,791.58

1.11	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	# informes de avance y resultados	P	-	3	-	339,484
			P (a)	-	4	-	343,862.98
			A	-	4	-	300,632.98
1.12	Prestaciones reguladas.	# prestaciones reguladas	P	-	28	-	880,418
			P (a)	-	23	186,780	944,898.87
			A	-	23	201,108	711,012.87
1.13	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	# of beneficiaries	P	-	1	-	133,379
			P (a)	-	-	-	101,127
			A	-	-	-	70,627
1.14	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	P	-	1	-	608,653
			P (a)	-	1	8,825	265,725.32
			A	-	1	-	265,725.32
1.15	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Documento - modelo de supervisión	P	-	1	-	442,491
			P (a)	-	1	27,582	282,643.11
			A	-	1	35,406	259,476.11
1.16	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	# de centros de educación y cuidado infantil	P	-	980	-	851,717
			P (a)	-	1,203	-	619,362.27
			A	-	1,203	49,511	573,026.27
1.17	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Documento - diseño instrumento de medición de calidad	P	-	1	-	61,000
			P (a)	-	2	-	51,350.76
			A	-	1	-	41,590.76
1.18	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	# centros de educación y cuidado infantil	P	-	980	-	91,500
			P (a)	230	980	122,000	61,000
			A	-	130	-	-
1.19	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	# pilotos de innovaciones	P	-	5	-	1,039,311
			P (a)	-	5	33,690	772,920.95
			A	-	5	18,547	750,282.95
1.20	Pilotos de innovaciones para Personas Mayores implementados	# pilotos de innovaciones	P	-	-	-	-
			P (a)	2	2	930,233	981,747
			A	2	2	622,773	622,773

Component Nbr. 2 Expansión y mejora de la calidad de Centros de Atención a la Infancia y Familia (CAIF)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	# centros CAIF	P	-	142	-	122,001
			P (a)	-	119	-	-
			A	86	77	-	-
2.02	Centros CAIF construidos.	# centros CAIF	P	-	50	-	37,939,310
			P (a)	-	25	-	19,107,097.43
			A	-	24	-	19,354,912.43
2.03	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	# centros CAIF	P	-	70	-	592,787
			P (a)	140	83	189,788	921,106.77
			A	160	124	104,633	801,223.77
2.04	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	# centros de educación y cuidado infantil	P	-	600	-	666,270
			P (a)	-	10	53,324	413,313.53
			A	-	10	48,611	390,919.53
2.05	Centros de protección y atención a niños, niñas y adolescentes de INAU con infraestructura mejorada.	# Centros de protección y atención	P	-	-	-	-
			P (a)	-	10	1,630,982	1,384,221
			A	1	1	1,142,772	1,142,772

Component Nbr. 3 Ejecución, evaluación y monitoreo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	# mediciones	P	-	3	-	915,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-

Other Cost				
	Administración y ejecución del proyecto	P		6,393,153
		P (a)	159,713	2,715,703.76
		A	155,795	2,520,720.76
	Evaluación y Auditoría	P		60,000
		P (a)	9,000	75,224.7
		A	10,894	55,224.7
	Fondos sin asignar	P		0
		P (a)		26,258,905.27
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	65,000,000
		P (a)	5,952,057	74,447,459
		A	5,018,097	44,078,804.73



CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	CARLOSFAC	4/13/2023
		Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Centros de protección y atención a niños, niñas y adolescentes de INAU con infraestructura mejorada.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	3/24/2023
	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Pilotos de innovaciones para Personas Mayores implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023
	Prestaciones reguladas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	3/23/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
1	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	1	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Inactive		Social Environment		
	Response Actions				
	2	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Materialized		Institutional Environment		
	Response Actions				
	4.01	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	
	4.02	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
5	Inactive		Social Environment		
	Response Actions				
	5	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	6.01	Management Strategy		Status	
		AVOID		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
7	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	7	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Inactive		Internal Processes		
	Response Actions				
	8	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
9	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	9	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	10.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy	
11	Inactive		Human Resources	
	Response Actions			
	11	Management Strategy		Status



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
