
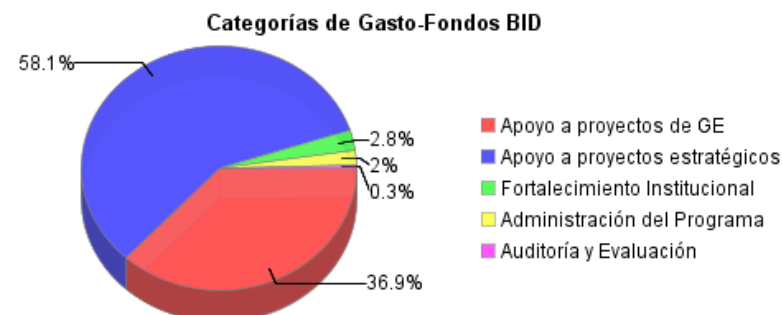



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE): AGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA Y LA SOCIEDAD DE					
Sector:					
Número(s) de Préstamo:	2591/OC-UR	Monto Aprobado Actual:	10.850.000,00	BID Original:	10.850.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	10.850.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	54,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1442	Saldo:	10.850.000,00	Co-financiamiento/País:	9.150.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	20.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 22-abr-2012 Validado por Representante de País: 02-may-2012

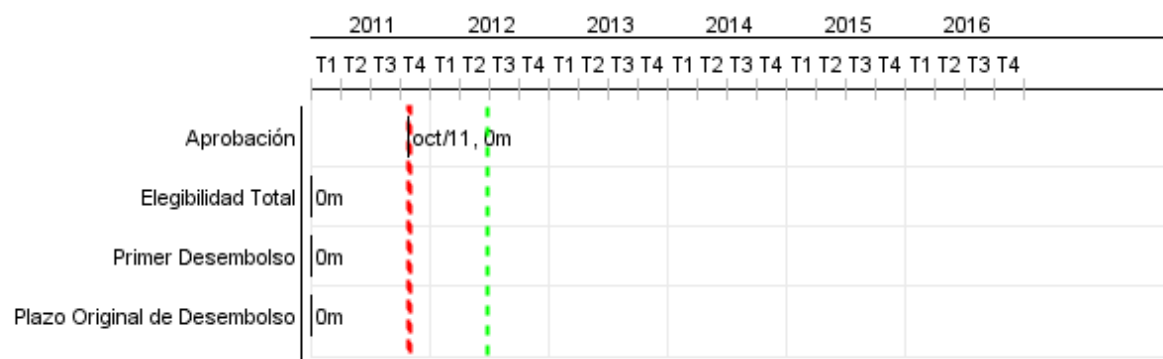

## Progreso Acumulado al 2011



## Resultados

**Resultado:** Mejora en la coordinación de los servicios públicos prestados por las unidades ejecutoras de la Administración Central.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Dependencias públicas involucradas en los trámites de exportación/importación.	Dependencias públicas	5.00	2011	P A			1.00	1,00
Dependencias públicas involucradas en los trámites de acceso a planes habitacionales.	Dependencias públicas	5.00	2011	P A			1.00	1,00

**Resultado:** Habilitación de nuevos trámites digitalizados.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Porcentaje de trámites que habilitan la posibilidad de realizarse en formato digital, ya sea de forma total o parcial a través de las Ventanillas Únicas, Páginas web de los organismos, Portales o aplicaciones para teléfonos celulares.	Porcentaje	15.00	2009	P A	25.00	35.00	60.00	60,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>C.1. Apoyo a proyectos de GE con alto impacto.</b>									
Proyectos de Fondos Concursables	Proyectos				60,00				7.000.000,00
<b>C.2. Apoyo a proyectos estratégicos de Gobierno Electrónico.</b>									
Soluciones Reutilizables de GE	Organismos con E-Constancias e E-Notificaciones implantadas				20,00				2.413.600,00
Plataforma de GE	Aplicaciones				30,00				1.231.688,00
e-Expedientes	Organismo				14,00				3.515.200,00
Ventanilla Única del Ciudadano	Servicio				30,00				850.538,00
Ventanilla de Comercio Exterior	Certificados MGAP vía VUCE / Total de Certificados MGAP				0,65				548.000,00
Seguridad Ciudadana	Vehículo patrullero				200,00				1.051.138,00
Factura Electrónica	Aplicaciones				1,00				435.836,00
e-Identidad	Organismos				3,00				1.000.000,00
Ventanilla Única de la Vivienda	Programas				13,00				454.000,00
<b>C.3 Fortalecimiento institucional de la AGESIC.</b>									
Capacitación	Funcionarios				440,00				920.000,00
Actividades de difusión y sensibilización desarrolladas.	Actividades				26,00				1.180.000,00
<b>Administración del Programa</b>									
<b>Gastos de Auditoría y Evaluación.</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>20.600.000,00</b>
