



Operation Number: **NI-L1067**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/4/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/06/2014**
Division Chief validation date: **06/23/2014**
Country Representative validation date: **07/08/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Sustainable Agricultural Productivity Development Program	Loan Number:	2738/BL-NI
Executing Agency (EA):	MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL		
Team Leader:	Llaguno Ribadeneira,Duval	Sector/Subsector:	AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	NICARAGUA
Borrower:	REPUBLICA DE NICARAGUA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
NI-L1067	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$42,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
NI-L1067	\$40,000,000.00	\$4,000,000.00	10.00%	\$36,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

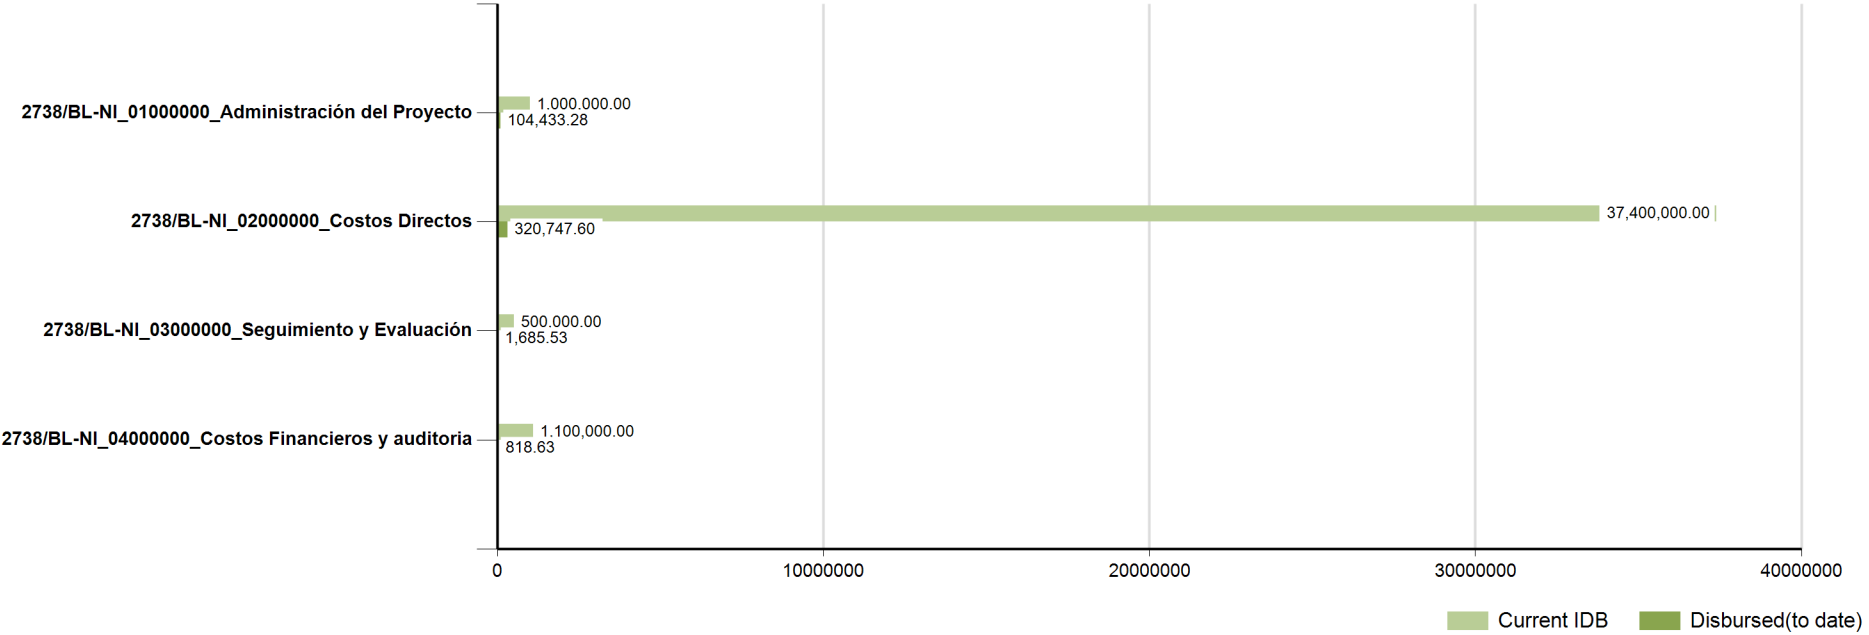

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Sostenibilidad productiva (económica, ambiental y social)							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferencia entre el cambio porcentual del índice de sostenibilidad productiva de los productores beneficiarios y de los no beneficiarios.		%	0.00	2012	Encuestas de hogares agropecuarios de beneficiarios y no beneficiarios en mayo 2013 (año agrícola 2012/13) y en mayo 2019 (año agrícola 2018/19).	La diferencia entre grupo de beneficiarios y grupo de control en la línea base es igual a cero. El proceso aleatorio de selección garantiza que las diferencias iniciales entre grupo de beneficiarios y de control sea igual a cero. En el Anexo 1 del Plan d	P	20.00
							P(a)	20.00
							A	

Impact:	2 Productividad agropecuaria							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Diferencia entre el cambio porcentual de rendimientos promedio por hectárea de rubros representativos entre los productores beneficiarios y no beneficiarios.		%	0.00	2012		Indicadores productividad previo al proyecto: Maíz: Zona seca: 20 quintales (qq) por manzana (mz), equivalente a 1,316 kilogramos (kg) por hectárea (ha); zona intermedia: 35qq/mz (2,304 kg/ha); zona humeda: 45 qq/mz (2,962 kg/ha). Frijol: Zona seca: 12	P	20.00
							P(a)	20.00
							A	

Impact:	3 Ingresos netos de familias rurales que provienen de actividades agropecuarias realizadas en sus fincas							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	

3.1 Diferencia entre el cambio porcentual de ingreso neto promedio por hectárea de las actividades agrícolas y ganaderas realizadas en las fincas de beneficiarias y el ingreso neto promedio agrícola y ganadero por hectárea de los no beneficiarios.		%	0.00	2012	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios en mayo 2013 y mayo 2019.	La diferencia entre grupo de beneficiarios y grupo de control en la línea de base es igual a cero. El proceso aleatorio garantiza que las diferencias iniciales entre grupo de beneficiarios y control sea igual a cero.	P	30.00
							P(a)	30.00
							A	
3.2 Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto promedio ganadero (ganado vacuno) por hectárea de las fincas de beneficiarios y el ingreso neto promedio agropecuario por hectárea de las fincas no beneficiarias.		%	0.00	2012	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios en mayo 2013 y mayo 2019.	Las diferencia entre grupo de beneficiarios y grupo de control en la línea de base es igual a cero. El proceso aleatorio garantiza que las diferencias iniciales entre grupo de beneficiarios y control sea igual a cero.	P	30.00
							P(a)	30.00
							A	

Impact:

4 Rechazos sanitarios y fitosanitarios

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.1 Rechazos de exportaciones de productos agropecuarios y sus derivados hacia los Estados Unidos de América y a la Unión Europea, por razones sanitarias y/o fitosanitarias (# de contenedores rechazados como % de contenedores totales exportados).		%	1.00	2012	Estadísticas oficiales de MIFIC, estadísticas del RASFF europeo y de las autoridades de EEUU.		P	1.00
							P(a)	1.00
							A	

Impact:


5 Prevalencia de agentes dañinos a la salud animal

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
5.1 Prevalencia cumulativa de tuberculosis en la población de ganado bovino, definida como el % de animales de finca infectados.		%	0.05	2012	Estadísticas oficiales de diagnóstico de DGPSA.		P	0.04
							P(a)	0.04
							A	
5.2 Prevalencia cumulativa de brucelosis en la población de ganado bovino, definida como el % de animales en finca infectados.		%	0.19	2012	Estadísticas oficiales de diagnóstico de la DGPSA.		P	0.15
							P(a)	0.15
							A	

Outcomes

Outcome:	1 Desempeño del servicio nacional de salud animal												
Observation:													
							2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
1.1 Puntaje total del servicio nacional de salud animal en las 4 competencias críticas (recursos humanos, físicos y financieros; autoridad y competencia técnica; interacción con las partes interesadas; y acceso a mercados), medidas con el instrumento "Desempe		%	34.00	2012	OIE (línea base); informe de la evaluación final.	Frecuencia de medición: 2012 (línea base); 2017 (final del programa).	P					73.00	73.00
	P(a)										73.00	73.00	
	A												
Outcome:	2 Desempeño de los servicios nacionales de sanidad vegetal												
Observation:													
							2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
2.1 Puntaje total del servicio nacional de protección fitosanitaria, en los 4 aspectos fundamentales (capacidad técnica; capital humano y financiero; interacción con el sector privado; y acceso a mercados), medidas usando el instrumento (DVE) de IICA.		%	34.00	2012	Informe de evaluación económica del programa (línea base); informe de la evaluación final.	Frecuencia de medición: 2012 (línea base); 2017 (final del programa).	P					76.00	76.00
	P(a)										76.00	76.00	
	A												
Outcome:	3 Certificación agroecológica												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	2017	EOP
3.1 Fincas certificadas en producción agroecológica, de las cuales 30% serán lideradas por mujeres.	 RF	Agricultores	0.00	2012	Registro de fincas agroecológicas del MAGFOR.		P	0.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,600.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	1,600.00
							A						
Outcome:	4 Aplicación de tecnologías												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	2017	EOP
4.1 Tasa promedio de aplicación por parte de los beneficiarios, de tecnologías transferidas bajo el programa.		%	0.00	2012	Sistema de seguimiento de la transferencia tecnológica; encuesta de adopción de tecnología (como parte de la evaluación final en 2017).	La "Tasa de Aplicación de Tecnología" se refiere al % de productos que están utilizando una tecnología que ha sido transferida bajo el programa en la misma modalidad y área original de la transferencia.	P					90.00	90.00
							P(a)					90.00	90.00
							A						
Outcome:	5 Adopción de tecnologías												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
5.1 Diferencia entre la tasa promedio de adopción por parte de los beneficiarios, tecnologías del programa y por parte de no beneficiarios.		%	0.00	2012	Encuesta de producción agroecológica de línea base levantada en mayo 2013 sobre el año agrícola 2012/13 (línea base). Encuesta en mayo 2019 (expost).	La "Tasa de Adopción de Tecnología" se refiere al % de recipientes de una tecnología que han incorporado la tecnología de forma permanente en el sistema de producción de finca.	P					50.00
							P(a)					50.00
							A					

Outcome:
6 Relación con cadenas productivas

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
6.1 Diferencia entre 2017 y 2012 en el % de producción por parte de los beneficiarios, de productos agropecuarios y sus derivados encadenados a la cadena de valor, y el % promedio de producción por parte de los no beneficiarios, de productos agropecuarios y su		%	0.00	2012	Encuesta de producción agroecológica de línea base levantada en mayo del 2013 sobre el año agrícola 2012/13 (línea base). Encuesta mayo 2019 (expost).		P					25.00
							P(a)					25.00
							A					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Apoyo a la gestión y fomento de la producción sostenible		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013	EOP	2013	EOP	
P.1 Edificio central de la DGPSA construida y operando adecuadamente.	Edificio	P	1.00	P	10,000.00	2,500,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	10,000.00	2,500,000.00
		A		A	7,238.88	7,238.88
P.2 Sistemas de gestión desarrollados e implementados.	Sistemas	P	2.00	P		550,000.00
		P(a)	2.00	P(a)		538,979.67
		A		A	0.00	0.00
P.3 Personas capacitadas.	Personas	P	85.00	P	25,366.46	380,000.00
		P(a)	85.00	P(a)	25,366.46	386,345.92
		A	120.00	A	12,344.11	12,344.11
P.4 Unidades de análisis y gestión de riesgo establecidas y operando.	Unidades de análisis y gestión	P	1.00	P	7,400.00	300,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	7,400.00	301,287.00
		A		A	23,391.30	23,391.30
P.5 Area cubierta bajo vigilancia pasiva: Fincas (F)	Fincas	P	666.00	P	86,680.00	537,111.00
		P(a)	666.00	P(a)	86,680.00	207,507.72
		A		A	98,227.50	98,227.50
P.6. Area bajo vigilancia pasiva: Sensores (S)	Sensores	P	740.00	P	86,680.00	537,111.00
		P(a)	740.00	P(a)	86,680.00	248,304.75
		A		A	77,143.00	77,143.00
P.7.- Area cubierta bajo vigilancia activa: Muestras de diagnóstico (M)	Muestras de diagnóstico	P	6,400.00	P	86,680.00	537,111.00
		P(a)	6,400.00	P(a)	86,680.00	1,096,830.76
		A		A	81,551.11	81,551.11
P.8.- Sistemas de registro y vigilancia medicamentos veterinarios y piensos establecidos.	Sistemas	P	1.00	P	27,411.30	198,903.00
		P(a)	1.00	P(a)	27,411.30	198,903.28
		A		A	48,253.72	48,253.72
P.9.- Personas capacitadas PPC, PPA y BPA avícola	Personas	P	420.00	P		84,000.00
		P(a)	420.00	P(a)		84,001.00
		A		A	349.85	349.85
P.10.- Personas capacitadas en registro de medicamentos y piensos y HACCP.	Personas	P	410.00	P		82,300.00
		P(a)	410.00	P(a)		129,427.97
		A	0.00	A	5,786.97	5,786.97
P.11.- Cantidad de productos trazados: Bovinos = Bo	Bovinos trazados	P	30,000.00	P	48,524.13	564,853.78
		P(a)	30,000.00	P(a)	48,524.13	536,559.20
		A	74,430.00	A	26,493.27	26,493.27
P.12.- Cantidad de productos trazados: Acuicola = Ac	Toneladas trazadas	P	5,000.00	P	37,924.50	164,225.19
		P(a)	5,000.00	P(a)	37,924.50	162,434.31
		A	6,208.00	A	33,234.07	33,234.07
P.13.- Cantidad de productos trazados: Apícolas = Ap	Apiarios trazados	P	40.00	P	36,040.00	285,772.00
		P(a)	40.00	P(a)	36,040.00	285,772.27
		A	77.00	A	17,278.50	17,278.50
P.14.- Area de país bajo vigilancia.	Has	P	60,000.00	P	257,631.75	1,282,226.00
		P(a)	60,000.00	P(a)	257,631.75	1,307,850.02
		A	98,875.00	A	228,577.72	228,577.72
P.15.- Libros y suscripciones técnicas obtenidos.	Libros y suscripciones	P	4.00	P	25,833.00	115,003.00
		P(a)	4.00	P(a)	25,833.00	118,668.66
		A	4.00	A	19,451.63	19,451.63
P.16.- Unidades especializadas en agroecología.	Unidades especializadas	P	1.00	P	24,757.10	971,654.00
		P(a)	1.00	P(a)	24,757.10	1,221,654.97
		A		A	147,497.28	147,497.28

P.17.- Puestos de inspección contruidos.	Puestos de inspección	P		1.00	P	20,000.00	326,917.00
		P(a)		1.00	P(a)	20,000.00	283,218.00
		A			A	31,377.63	31,377.63
P.18.- Estaciones cuarentenarias pre-operacionales.	Estaciones cuarentenarias	P		2.00	P		226,918.00
		P(a)		2.00	P(a)		216,918.00
		A			A	0.00	0.00
P.19.- Puestos cuarentenarios readecuados.	Puestos cuarentenarios	P		4.00	P		326,917.00
		P(a)		4.00	P(a)		2,059,478.00
		A			A	31,377.63	31,377.63
P.20.- Estaciones cuarentenarias para especies menores construidas.	Estaciones cuarentenarias	P		1.00	P	12,000.00	226,918.00
		P(a)		1.00	P(a)	12,000.00	254,827.63
		A			A	31,377.64	31,377.64
P.21.- Laboratorio de diagnóstico de sanidad animal adecuado.	Laboratorio Sanidad Animal	P		1.00	P	10,000.00	2,071,568.60
		P(a)		1.00	P(a)	10,000.00	2,308,268.57
		A			A	7,175.43	7,175.43
P.22.- Laboratorio de diagnóstico vegetal construido.	Laboratorio Sanidad Vegetal	P		1.00	P	1,924.00	2,056,890.60
		P(a)		1.00	P(a)	1,924.00	2,501,279.72
		A			A	88,078.25	88,078.25
P.23.- Laboratorio de diagnóstico de residuos biológicos construido.	Laboratorio residuos biológicos	P		1.00	P		2,373,600.83
		P(a)		1.00	P(a)		2,736,481.82
		A			A	2,851.74	2,851.74
P.24.- Estudios de caracterización de zonas agroecológicas.	Estudios	P		3.00	P	120,000.00	360,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	120,000.00	220,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.25.- Planes de ordenamiento territorial con modelos de proudcción sostenible.	Planes	P		3.00	P	48,000.00	120,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	48,000.00	120,000.00
		A			A	23,391.30	23,391.30
P.26.- Propuestas de desarrollo para la producción agroecológica.	Propuestas	P		10.00	P	61,500.00	220,000.00
		P(a)		10.00	P(a)	61,500.00	140,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.27.- Estudios de oportunidad de mercado.	Estudios	P		3.00	P		60,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		50,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.28.- Proyectos modelo a nivel de finca.	Proyectos	P		3.00	P		45,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		45,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.29.- Encuestas de producción agroecológica a nivel nacional (NTON)	Encuestas	P		1.00	P	112,000.00	152,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	112,000.00	180,000.00
		A			A	41,350.00	41,350.00
P.30.- Estudios de biodiversidad, captura de carbono y calidad de suelos en fincas integrales demostrativas.	Estudios	P		2.00	P	40,000.00	100,000.00
		P(a)		2.00	P(a)	40,000.00	10,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.31.- Talleres para comunicadores sociales del MAGFOR y periodistas.	Talleres	P	6.00	36.00	P	40,280.00	161,120.00
		P(a)	6.00	36.00	P(a)	40,280.00	70,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.32.- Maestrías realizadas (40% son mujeres)	Maestrías	P		8.00	P		200,000.00
		P(a)		16.00	P(a)		354,000.00
		A			A	48,000.00	48,000.00
P.33.- Gestión y fomento de la producción agroecológica.- b) Capacitación MAGFOR.- Postgrados realizados (mínimo 40% mujeres)	Postgrados	P	1.00	10.00	P	25,000.00	100,000.00
		P(a)	1.00	200.00	P(a)	25,000.00	436,000.00
		A			A	90,000.00	90,000.00

P.34.- Capacitación MAGFOR.- Eventos de capacitación en producción agroecológica, con participación equitativa de género.	Eventos de capacitación	P	10.00	90.00	P	60,086.94	383,815.00
		P(a)	10.00	100.00	P(a)	60,086.94	1,083,951.56
		A	13.00	13.00	A	328,335.81	328,335.81
P.35.- Gestión y fomento de la producción agroecológica.- c) Comunicación.- Campañas de comunicación realizadas.	Campañas de comunicación	P	1.00	4.00	P	31,625.00	120,175.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	31,625.00	120,175.51
		A	1.00	1.00	A	4,547.51	4,547.51
P.36.- Gestión y fomento de la producción agroecológica.- d) Modernización de sistemas de información.- Sistema de información geográfico fortalecido.	Sistema	P		1.00	P	189,600.00	236,700.00
		P(a)		1.00	P(a)	189,600.00	247,563.69
		A			A	79,316.89	79,316.89
P.37.- Modernización de sistemas de información.- Sistema de información y comunicación fortalecido.	Sistema	P		1.00	P		319,600.00
		P(a)		1.00	P(a)		706,720.00
		A			A		
P.38.- Gestión y fomento de la producción agroecológica.- e) Construcciones y equipo de transporte.- Oficinas y salas remodeladas y equipadas.	Oficinas y salas	P		8.00	P	26,118.00	321,590.00
		P(a)		8.00	P(a)	26,118.00	1,531,590.00
		A			A	60,035.92	60,035.92
Fortalecimiento de la innovación tecnológica agropecuaria		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
P.39 INTA/Centros de desarrollo tecnológico, estaciones experimentales y oficinas de innovación rehabilitadas.	Centros de desarrollo	P		6.00	P	446,227.00	7,841,236.50
		P(a)		25.00	P(a)	446,227.00	12,418,232.00
		A			A	495,009.24	495,009.24
P.40 INTA/Doctorados (al menos 1 será mujer).	Doctorados	P		4.00	P	42,000.00	332,000.00
		P(a)		4.00	P(a)	42,000.00	150,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.41 INTA/ Maestrías (al 5 serán mujeres).	Maestrías	P		13.00	P	40,000.00	520,000.00
		P(a)		13.00	P(a)	40,000.00	320,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.42 INTA/ Diplomados (al menos 14 serán mujeres).	Diplomados	P		36.00	P		205,299.00
		P(a)		36.00	P(a)		250,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.43 INTA/- Cursos de actualización técnica realizados.	Cursos	P	10.00	100.00	P	36,000.00	226,500.00
		P(a)	10.00	100.00	P(a)	36,000.00	165,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.44 INTA/ Giras internacionales de aprendizajes para productores y técnicos.	Giras internacionales	P		12.00	P		144,000.00
		P(a)		12.00	P(a)		70,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.45 INTA/ Giras de aprendizaje para productores-técnicos.	Giras de aprendizaje	P		16.00	P		80,000.00
		P(a)		16.00	P(a)		97,600.00
		A			A	17,494.46	17,494.46
P.46 INTA/Participación en eventos de investigación y visitas a centros de investigación internacional.	Eventos de investigación y visitas a centros de investigación	P		40.00	P		100,000.00
		P(a)		40.00	P(a)		35,500.00
		A			A	0.00	0.00
P.47 INTA/ Participaciones en congresos internacionales.	Congresos internacionales	P		20.00	P		82,500.00
		P(a)		20.00	P(a)		46,000.00
		A			A	0.00	0.00
P.48 INTA/Congresos realizados en Nicaragua.	Congresos en Nicaragua	P		4.00	P		75,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		110,000.00
		A			A	0.00	0.00

P.49 INTA/- Membresías y convenios establecidos.	Membresías y convenios	P		16.00	P		160,000.00
		P(a)		16.00	P(a)		20,000.00
		A			A		
P.50 INTA/ Redes de investigación establecidas.	Redes de investigación	P		3.00	P		160,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		20,000.00
		A			A		
P.51 INTA/- Escenarios de fincas virtuales construidas.	Escenarios de fincas virtuales	P		200.00	P		150,000.00
		P(a)		200.00	P(a)		25,000.00
		A			A		
P.52 INTA/Proyectos de investigación en generación de tecnologías en Centros de Desarrollo Tecnológicos (CDT), de los cuales, al menos 30% contienen análisis de género.	Proyectos de investigación	P		244.00	P	140,045.00	1,014,090.00
		P(a)		244.00	P(a)	140,045.00	1,387,977.00
		A			A	24,760.39	24,760.39
P.53 INTA/Proyectos de investigación adaptativa y validación de tecnologías en Fincas Integrales Demostrativas (FID), de las cuales al menos 30% contienen consideraciones de género.	Proyectos de investigación ejecutado	P		205.00	P	150,000.00	1,365,090.00
		P(a)		205.00	P(a)	150,000.00	719,820.00
		A	0.00	0.00	A	10,641.91	10,641.91
P.54 INTA/ Técnicos contratados para equipos territoriales.	Técnicos	P	14.00	14.00	P	94,080.00	537,600.00
		P(a)	14.00	34.00	P(a)	94,080.00	492,500.00
		A	14.00	14.00	A	40,971.68	40,971.68
P.55 INTA/ Técnicos contratados para investigación en cultivos, ganadería y semilla.	Técnicos	P	10.00	10.00	P	96,000.00	576,000.00
		P(a)	10.00	10.00	P(a)	96,000.00	636,782.99
		A	8.00	8.00	A	36,624.69	36,624.69
P.56 INTA/ Bancos comunitarios de semillas	Hectáreas establecidas para producción	P		1,127.00	P	59,922.00	893,568.00
		P(a)		1,127.00	P(a)	59,922.00	502,940.00
		A	0.00	0.00	A	20,651.21	20,651.21
P.57 INTA/Capacitación a promotores.	Eventos (jornadas)	P		523.00	P	58,000.00	672,538.50
		P(a)		523.00	P(a)	58,000.00	262,168.00
		A	0.00	0.00	A	7,423.93	7,423.93
P.58 INTA/ Especialista en postcosecha contratado.	Meses de especialista contratado	P	6.00	48.00	P	7,560.00	60,480.00
		P(a)	6.00	48.00	P(a)	7,560.00	60,480.00
		A			A	0.00	0.00
P.59 INTA/ Fincas Integrales Demostrativas (FID) establecidas, al menos 30% lideradas por mujeres.	Fincas Integrales Demostrativas	P		188.00	P	48,500.00	613,398.00
		P(a)		330.00	P(a)	48,500.00	1,002,730.01
		A	0.00	0.00	A	3,879.43	3,879.43
P.60 INTA/ Fincas receptoras de tecnologías establecidas, al menos el 30% lideradas por mujeres.	Fincas	P		940.00	P		1,527,812.00
		P(a)		1,650.00	P(a)		4,657,570.00
		A			A	0.00	0.00
P.61 INTA/ Capacitación a productores.	Agricultores	P		5,032.00	P	169,000.00	1,312,888.00
		P(a)		5,214.00	P(a)	169,000.00	449,700.00
		A	0.00	0.00	A	5,956.96	5,956.96
P.62 INTA/ Núcleos de intervención (NI) capacitados en desarrollo empresarial y fomento a la asociatividad.	Núcleos de intervención	P		100.00	P	50,000.00	750,000.00
		P(a)		100.00	P(a)	50,000.00	100,000.00
		A			A	0.00	0.00
Administración del Programa							
Seguimiento y evaluación							
Costos financieros y auditorías							

Other Cost		2013	Cost
1,400,000	P	\$250,840.00	\$1,400,000.00
	P(a)	\$250,840.00	\$1,400,000.00
	A	\$176,048.92	\$176,048.92
500,000	P	\$102,000.00	\$500,000.00
	P(a)	\$102,000.00	\$500,000.00
	A	\$6,587.19	\$6,587.19
1,100,000	P	\$20,000.00	\$1,100,000.00
	P(a)	\$20,000.00	\$1,100,000.00
	A	\$2,602.06	\$2,602.06
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$3,369,236.18	\$42,000,000.00
	P(a)	\$3,369,236.18	\$32,946,928.33
	A	\$2,542,686.73	\$2,542,686.73

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output		Centros de Desarrollo Tecnológicos rehabilitados	Create Milestone	Idem a los anteriores.	5/15/2014	5/19/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
