

ID	Task Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
0		PROGRAMA APOYO A POBLACIONES VULNERABLES POR CORONAVIRUS (BO-L1219)	534 days	Mon 1/2/23	Thu 1/16/25	0%	\$500,000,000.00	\$347,340,000.00	\$152,660,000.00
1		Condiciones previas	51 days	Mon 1/2	Mon 3/13	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2		Conformacion Equipo Clave del MEFP (Equipo Clave)	29 days	Wed 2/1/23	Mon 3/13/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3		Elaboración de Terminos de Referencia	5 days	Wed 2/1	Tue 2/7/2	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4		Elaboracion de Documento SP	1 day	Wed 2/8	Wed 2/8/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5		Solicitud de No Objeción	1 day	Thu 2/9/	Thu 2/9/2	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6		No Objeción del BID	2 days	Fri 2/10/	Mon 2/13	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7		Presentacion 3 CVs	5 days	Tue 2/14	Mon 2/20	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8		Informe de calificacion	3 days	Tue 2/21	Thu 2/23/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9		Solicitud de No Objeción	1 day	Fri 2/24/	Fri 2/24/2	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10		No Objeción del BID	2 days	Mon 2/2	Tue 2/28/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11		Adjudicación	1 day	Wed 3/1	Wed 3/1/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12		Presentacion documentos	3 days	Thu 3/2/	Mon 3/6/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13		Elaboracion y firma de contratos	5 days	Tue 3/7/	Mon 3/13	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14		Aprobacion ROP	20 days	Tue 1/10	Mon 2/6/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15		Elaboracion documento	12 days	Tue 1/10	Wed 1/25	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16		Socializacion y ajustes	3 days	Thu 1/26	Mon 1/30	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17		Solicitud No Objecion	1 day	Tue 1/31	Tue 1/31/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18		No Objecion	2 days	Wed 2/1	Thu 2/2/2	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19		Aprobacion mediante instrumento norm	2 days	Fri 2/3/2	Mon 2/6/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

ID	Task Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
39		Componente 1: Proteccion de la poblacion vulnerable mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes	140 days	Wed 2/15/23	Tue 8/29/23	0%	\$250,000,000.00	\$250,000,000.00	\$0.00
40		Producto 1. Bono Contra el Hambre pagac	140 days	Wed 2/15/23	Tue 8/29/23	0%	\$250,000,000.00	\$250,000,000.00	\$0.00
41		Reembolso gastos por pago del BCH	40 days	Wed 2/15/23	Tue 4/11/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42		Preparacion de los documentos (Fase	20 days	Wed 2/15/23	Tue 3/14/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43		Preparacion de los documentos (Fase	20 days	Wed 3/1/23	Tue 4/11/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44		Reembolso costo de comision por transferencia	20 days	Wed 4/12/23	Tue 5/9/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45		Preparacion de la documentacion	20 days	Wed 4/12/23	Tue 5/9/23	20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
46		Gastos reembolsados	80 days	Wed 5/1/23	Tue 8/29/23	0%	\$250,000,000.00	\$250,000,000.00	\$0.00
47		Ejecucion	80 days	Wed 5/1/23	Tue 8/29/23	0%	\$250,000,000.00	\$250,000,000.00	\$0.00
48		Componente 2: Reduccion de la Morbi-mortalidad causada por el COVID 19 y mitigacion de los efectos indirectos de la pandemia sobre el sistema de salud	529 days	Sat 1/7/23	Thu 1/16/25	0%	\$243,700,000.00	\$94,440,000.00	\$149,260,000.00
49		Subcomponente 2.1. Fortalecimiento de la conduccion de la respuesta a nivel del	456 days	Sun 4/2/23	Mon 12/30/24	0%	\$10,100,000.00	\$5,400,000.00	\$4,700,000.00
50		Producto 2.1.1 Nueva arquitectura del Sistema Unico de Informacion en Salud (SUIS) desarrollada e implementada	378 days	Sun 4/2/23	Wed 9/11/24	0%	\$7,100,000.00	\$4,900,000.00	\$2,200,000.00
51		Adquisicion de equipamiento informatico (Hardware y Software)	180 days	Sun 4/2/23	Fri 12/8/23	0%	\$2,000,000.00	\$1,500,000.00	\$500,000.00
52		Proceso de contratación	76 days	Sun 4/2/23	Mon 7/1/23	170%	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3

ID	Task Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
72		Elaboracion tdrs y especificaciones tecnicas	25 days	Tue 5/2/23	Mon 6/5/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73		Certificación Presupuestaria y POA	2 days	Tue 6/6/	Wed 6/7/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74		Solicitud NO	1 day	Thu 6/8/	Thu 6/8/20	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75		No objecion del Banco	2 days	Fri 6/9/2	Mon 6/12/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76		Publicacion SICOES y DB	2 days	Tue 6/13	Wed 6/14/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
77		Presentacion de propuestas	20 edays	Wed 6/1	Tue 7/4/2	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78		Recepcion y apertura de propuesta	1 day	Wed 7/5	Wed 7/5/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79		Evaluacion de propuestas	15 days	Thu 7/6/	Wed 7/26/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
80		Solicitud NO BID	1 day	Thu 7/27	Thu 7/27/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81		No objecion del Banco	2 days	Fri 7/28/	Mon 7/31/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82		Adjudicacion	5 days	Tue 8/1/	Mon 8/7/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83		Presentacion de documentos	5 days	Tue 8/8/	Mon 8/14/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84		Elaboracion y firma de Contrato	5 days	Tue 8/15	Mon 8/21/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
85		Registro PRISM	1 day	Tue 8/22	Tue 8/22/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
86		Ejecucion	80 days	Tue 8/22	Mon 12/10	0%	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
87		Servidores entregados por la em	60 days	Tue 8/22	Mon 11/1/	10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
88		Informe de aprobacion de la comision de recepcion	10 days	Tue 11/14/23	Mon 11/27/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
89		Pago y revisión de la documentación del área	10 days	Tue 11/28/23	Mon 12/11/23	0%	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
90		Adquisicion de licencias, certificacion y produccion de	348 days	Mon 5/15/23	Wed 9/11/24	0%	\$1,800,000.00	\$1,000,000.00	\$800,000.00

Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

ID	Task Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
110		Capacitación al personal del SNIS para la implementación de	100 days	Fri 7/21/23	Thu 12/7/23	0%	\$750,000.00	\$500,000.00	\$250,000.00
111		Presentación informe final	1 day	Fri 12/8/23	Fri 12/8/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112		Gastos operacionales y logísticos para movilizacion de personal	105 days	Mon 10/2/23	Fri 2/23/24	0%	\$800,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00
113		Planificacion y requerimientos	15 days	Mon 10/2/23	Fri 10/20/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
114		Adquisicion y distribucion	90 days	Mon 10/2/23	Fri 2/23/24	0%	\$800,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00
115		Producto 2.1.2 Plataforma de Business Intelligence desarrollada e	251 days	Mon 1/15/24	Mon 12/30/24	0%	\$3,000,000.00	\$500,000.00	\$2,500,000.00
116		Proceso de contratación	161 days	Mon 1/1/24	Mon 8/26/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
117		Expresiones de interes (EdI)	38 days	Mon 1/1/24	Wed 3/6/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
118		Elaboración de la convocatoria y formularios	5 days	Mon 1/15/24	Fri 1/19/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
119		Convocatoria publica internacio	23 days	Mon 1/22/24	Wed 2/21/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
120		Revisión de EdI y conformación de lista corta	10 days	Thu 2/22/24	Wed 3/6/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
121		Elaboración DSP, convocatoria y firma de contrato	123 days	Thu 3/7/24	Mon 8/26/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
122		Elaboración de las EETT+DSP	36 days	Thu 3/7/24	Thu 4/25/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
123		No Objeción del Financiador (lista corta, DSP, Carta de	5 edays	Thu 4/25/24	Tue 4/30/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
124		Solicitud de propuestas (a la lista	42 edays	Tue 4/30/24	Tue 6/11/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
125		Evaluación de propuestas Técnicas	15 edays	Tue 6/11/24	Wed 6/26/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
126		Solicitud y No Objeción	5 days	Thu 6/27/24	Wed 7/3/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proyecto: PROGRAMA APOYO

Fecha: Tue 11/29/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas






















División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 7















ID	Tas Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
127		Evaluación de propuesta econón	15 edays	Wed 7/3	Thu 7/18/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
128		Evaluación combinada técnico y	5 days	Fri 7/19/	Thu 7/25/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
129		No Objeción	5 days	Fri 7/26/	Thu 8/1/2	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
130		Adjudicación	2 days	Fri 8/2/2	Mon 8/5/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
131		Solicitud de Documentación lega	10 days	Tue 8/6/	Mon 8/19	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
132		Elaboracion y firma de contrato	5 days	Tue 8/20	Mon 8/26	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
133		Ejecucion	90 days	Tue 8/27	Mon 12/30	0%	\$3,000,000.00	\$500,000.00	\$2,500,000.00
134		Ejecucion y capacitacion	90 days	Tue 8/27	Mon 12/3	0%	\$3,000,000.00	\$500,000.00	\$2,500,000.00
135		Subcomponente 2.2. Apoyo a iniciativas para interrumpir la cadena de transmision de la enfermedad	269 days	Thu 2/2/23	Tue 2/13/24	0%	\$6,500,000.00	\$3,000,000.00	\$3,500,000.00
136		Planes estrategicos de comunicación y de participacion comunitaria para el cambio de comportamiento social elaborados e implementados	269 days	Thu 2/2/23	Tue 2/13/24	0%	\$6,500,000.00	\$3,000,000.00	\$3,500,000.00
137		Proceso de contratación	169 days	Thu 2/2/	Tue 9/26/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
138		Expresiones de interes (Edl)	53 days	Thu 2/2/	Mon 4/17	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
139		Elaboración de la convocatoria y formularios	20 days	Thu 2/2/23	Wed 3/1/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
140		Convocatoria publica internacion	23 days	Thu 3/2/	Mon 4/3/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
141		Revisión de Edl y conformación de lista corta	10 days	Tue 4/4/23	Mon 4/17/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
142		Elaboración DSP, convocatoria y firma de contrato	116 days	Tue 4/18/23	Tue 9/26/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00






















<div>Proyecto: PROGRAMA APOYO</div> <div>Fecha: Tue 11/29/22</div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


ID	Tarea Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
143		Elaboración de las EETT+DSP	20 days	Tue 4/18	Mon 5/15	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
144		No Objeción del Financiador (lista corta, DSP, Carta de	5 edays	Mon 5/15/23	Sat 5/20/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
145		Solicitud de propuestas	42 edays	Sat 5/20/23	Sat 7/1/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
146		Evaluación de propuestas Técnicas	15 days	Mon 7/3/23	Fri 7/21/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
147		No Objeción	5 days	Mon 7/2/23	Fri 7/28/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
148		Evaluación de propuesta económica	10 days	Mon 7/3/23	Fri 8/11/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
149		Evaluación combinada técnico y económica	5 days	Mon 8/1/23	Fri 8/18/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
150		No Objeción del Financiador	5 days	Mon 8/2/23	Fri 8/25/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151		Adjudicación	2 days	Mon 8/2/23	Tue 8/29/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
152		Presentacion de documentación y firma consultora	15 days	Wed 8/30/23	Tue 9/19/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
153		Elaboracion y firma de contrato	5 days	Wed 9/2/23	Tue 9/26/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
154		Ejecucion	100 days	Wed 9/2/23	Tue 2/13/24	0%	\$6,500,000.00	\$3,000,000.00	\$3,500,000.00
155		Ejecucion consultoria	80 days	Wed 9/2/23	Tue 1/16/24	0%	\$6,500,000.00	\$3,000,000.00	\$3,500,000.00
156		Vacunacion	100 days	Wed 9/2/23	Tue 2/13/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
157		Subcomponente 2.3 Mejoramiento de la capacidad de provision de servicios - continuidad de la atencion esencial	349 days	Wed 2/15/23	Mon 6/17/24	0%	\$131,800,000.00	\$47,920,000.00	\$83,880,000.00
158		Producto 2.3.1. Establecimientos de salud ambulatorios fortalecidos con equipamiento medico-asistencial y/o	300 days	Wed 2/15/23	Tue 4/9/24	0%	\$110,000,000.00	\$40,550,000.00	\$69,450,000.00
159		Adquisicion equipamiento medico	273 days	Wed 2/1/24	Fri 3/1/24	40%	\$59,247,500.00	\$20,200,000.00	\$39,047,500.00
160		Proceso de contratación LPI (Por Lot	135 days	Wed 2/1/24	Tue 8/22/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00






















Proyecto: PROGRAMA APOYO
 Fecha: Tue 11/29/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

ID	Tarea	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
161		Elaboracion Especificaciones Tec	40 days	Wed 2/1	Tue 4/11/0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
162		Elaboracion del DDL	5 days	Wed 4/1	Tue 4/18/0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
163		Solicitud de No Objeción	1 day	Wed 4/1	Wed 4/190%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
164		No Objeción del BID	3 days	Thu 4/20	Mon 4/240%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
165		Publicacion en el UNDB, Sicoes, p	1 day	Tue 4/25	Tue 4/25/0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
166		Recepción de propuestas	49 edays	Tue 4/25	Tue 6/13/0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
167		Evaluación de ofertas	20 days	Wed 6/1	Tue 7/11/0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
168		Solicitud de No Objeción	2 days	Wed 7/1	Thu 7/13/0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
169		No Objeción del BID	3 days	Fri 7/14/	Tue 7/18/0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
170		Adjudicación	3 days	Wed 7/1	Fri 7/21/20%	20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
171		Presentacion de documentos	10 days	Mon 7/2	Fri 8/4/230%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
172		Firma del contrato	10 days	Mon 8/7/	Fri 8/18/20%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
173		Registro PRISM	2 days	Mon 8/2	Tue 8/22/0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
174		Ejecucion	138 days	Tue 8/22	Fri 3/1/240%	0%	\$59,247,500.00	\$20,200,000.00	\$39,047,500.00
175		Equipos entregados	60 edays	Tue 8/22	Sat 10/21,0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
176		Informe de aprobacion de la comision de recepcion	10 days	Mon 10/23/23	Fri 11/3/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
177		Pago y revisión de la documentación del área	10 days	Mon 11/6/23	Fri 11/17/23	0%	\$58,817,500.00	\$20,000,000.00	\$38,817,500.00
178		Instalacion en 100 centros	30 days	Mon 11/	Fri 12/29/0%	0%	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
179		Instalacion en 115 centros	45 days	Mon 1/1/	Fri 3/1/240%	0%	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
180		Adquisicion equipamiento Telesalud	287 days	Mon 3/6	Tue 4/9/20%	20%	\$50,752,500.00	\$20,350,000.00	\$30,402,500.00
181		Proceso de contratación LPI (Por Lot	135 days	Mon 3/6	Fri 9/8/230%	230%	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proyecto: PROGRAMA APOYO Fecha: Tue 11/29/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

ID	Tarea	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
220		Pago y revisión de la documentación del área	10 days	Tue 1/2/24	Mon 1/15/24	0%	\$8,820,000.00	\$2,820,000.00	\$6,000,000.00
221		Instalacion en 15 hospitales	30 days	Tue 1/16	Mon 2/26	0%	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
222		Instalacion en 22 hospitales	80 days	Tue 2/27	Mon 6/17	0%	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
223		Adquisicion equipamiento Telesalud	287 days	Mon 3/6	Tue 4/9/20	20%	\$10,750,000.00	\$4,350,000.00	\$6,400,000.00
224		Proceso de contratación LPI (Por Lot	135 days	Mon 3/6	Fri 9/8/23	30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
225		Elaboracion Especificaciones Tec	40 days	Mon 3/6	Fri 4/28/20	20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
226		Elaboracion del DDL	5 days	Mon 5/1	Fri 5/5/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
227		Solicitud de No Objeción	1 day	Mon 5/8	Mon 5/8/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
228		No Objeción del BID	3 days	Tue 5/9/	Thu 5/11/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
229		Publicacion en el UNDB, Sicoes, r	1 day	Fri 5/12/	Fri 5/12/20	20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
230		Recepción de propuestas	49 edays	Fri 5/12/	Fri 6/30/20	20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
231		Evaluación de ofertas	20 days	Mon 7/3	Fri 7/28/20	20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
232		Solicitud de No Objeción	2 days	Mon 7/3	Tue 8/1/20	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
233		No Objeción del BID	3 days	Wed 8/2	Fri 8/4/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
234		Adjudicación	3 days	Mon 8/7	Wed 8/9/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
235		Presentacion de documentos	10 days	Thu 8/10	Wed 8/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
236		Firma del contrato	10 days	Thu 8/24	Wed 9/6/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
237		Registro PRISM	2 days	Thu 9/7/	Fri 9/8/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
238		Ejecucion	152 days	Fri 9/8/2	Tue 4/9/20	20%	\$10,750,000.00	\$4,350,000.00	\$6,400,000.00
239		Equipos entregados	60 edays	Fri 9/8/2	Tue 11/7/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240		Informe de aprobacion de la comisión de recepcion	10 days	Wed 11/8/23	Tue 11/21/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proyecto: PROGRAMA APOYO Fecha: Tue 11/29/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
	Página 13					

ID	Tarea Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
241		Pago y revisión de la documentación del área	10 days	Wed 11/22/23	Tue 12/5/23	0%	\$10,000,000.00	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00
242		Instalacion en 15 hospitales	30 days	Wed 12/13/23	Tue 1/16/24	0%	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
243		Instalacion en 22 hospitales	60 days	Wed 1/10/24	Tue 4/9/24	0%	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
244		Producto 2.3.3. Hospitales de Tercer Nivel fortalecidos con equipamiento medico asistencial y/o de TLM	95 days	Tue 12/19/23	Mon 4/29/24	0%	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
245		Ejecucion	95 days	Tue 12/19/23	Mon 4/29/24	0%	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
246		Pago equipamiento medico y telesalud	15 days	Tue 12/19/23	Mon 1/8/24	0%	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
247		Instalacion en 2 hospitales del equipamiento medico	40 days	Tue 1/9/24	Mon 3/4/24	0%	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
248		Instalacion en 2 hospitales del equipamiento Telesalud	40 days	Tue 3/5/24	Mon 4/29/24	0%	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
249		Subcomponente 2.4 Mejoramiento de la capacidad de provision de servicios-atencion a pacientes COVID 19 y apoyo operativo a hospitales de Tercer	529 days	Sat 1/7/23	Thu 1/16/25	0%	\$95,300,000.00	\$38,120,000.00	\$57,180,000.00
250		Producto 2.4.1 Hospitales puestos en funcionamiento y/o ampliados con el 80% o mas de la dotacion del RHS con	529 days	Sat 1/7/23	Thu 1/16/25	0%	\$95,300,000.00	\$38,120,000.00	\$57,180,000.00
251		Contratacion de RHS	52 days	Sat 1/7/23	Tue 3/21/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
252		Elaboración de Terminos de Referencia	20 days	Sat 1/7/23	Thu 2/2/24	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
253		Elaboracion de Documento Base de Contratación	1 day	Fri 2/3/23	Fri 2/3/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254		Solicitud de No Objeción	1 day	Mon 2/6/23	Mon 2/6/23	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proyecto: PROGRAMA APOYO
 Fecha: Tue 11/29/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

ID	Tarea Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Com	Costo Total Programado	Programado 2023	Programado 2024
255		No Objeción del BID	2 days	Tue 2/7/	Wed 2/8/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
256		Publicacion en el SICOES	5 days	Thu 2/9/	Wed 2/15/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
257		Recepción y apertura de ofertas	1 day	Thu 2/16/	Thu 2/16/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
258		Informe de evaluación de propuestas	10 days	Fri 2/17/	Thu 3/2/2	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
259		Solicitud de No Objeción	1 day	Fri 3/3/2	Fri 3/3/2	30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260		No Objeción del BID	2 days	Mon 3/6/	Tue 3/7/2	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
261		Adjudicación	2 days	Wed 3/8/	Thu 3/9/2	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
262		Presentacion documentos	3 days	Fri 3/10/	Tue 3/14/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
263		Elaboracion y firma de contratos	5 days	Wed 3/1/	Tue 3/21/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
264		Ejecucion	477 days	Wed 3/2	Thu 1/16/	0%	\$95,300,000.00	\$38,120,000.00	\$57,180,000.00
265		Pago honorarios	450 days	Wed 3/2	Tue 12/10/	0%	\$95,300,000.00	\$38,120,000.00	\$57,180,000.00
266		Dotacion de items	120 days	Fri 8/2/2	Thu 1/16/	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
267		Componente 3. Apoyo a la gestion, monitoreo y evaluacion	522 days	Mon 1/2/23	Tue 12/31/24	0%	\$6,300,000.00	\$2,900,000.00	\$3,400,000.00
268		Subcomponente 3.1 Administracion MEFP	522 days	Mon 1/2	Tue 12/31/	10%	\$300,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
269		Pago honorarios Equipo Clave	522 days	Mon 1/2/	Tue 12/31/	10%	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
270		Auditorias				0%	\$100,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
271		Subcomponente 3.2 Administracion UEP (522 days	Mon 1/2	Tue 12/31/	10%	\$6,000,000.00	\$2,750,000.00	\$3,250,000.00
272		Conformacion Unidad Ejecutora (Pago honorarios, equipos, mobiliario y gastos operativos)	522 days	Mon 1/2/23	Tue 12/31/24	0%	\$5,400,000.00	\$2,500,000.00	\$2,900,000.00
273		Auditorias				0%	\$100,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
274		Monitoreo y evaluacion				0%	\$500,000.00	\$200,000.00	\$300,000.00

Proyecto: PROGRAMA APOYO

Fecha: Tue 11/29/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Tareas críticas

División crítica


Progreso

Progreso manual

Página 15

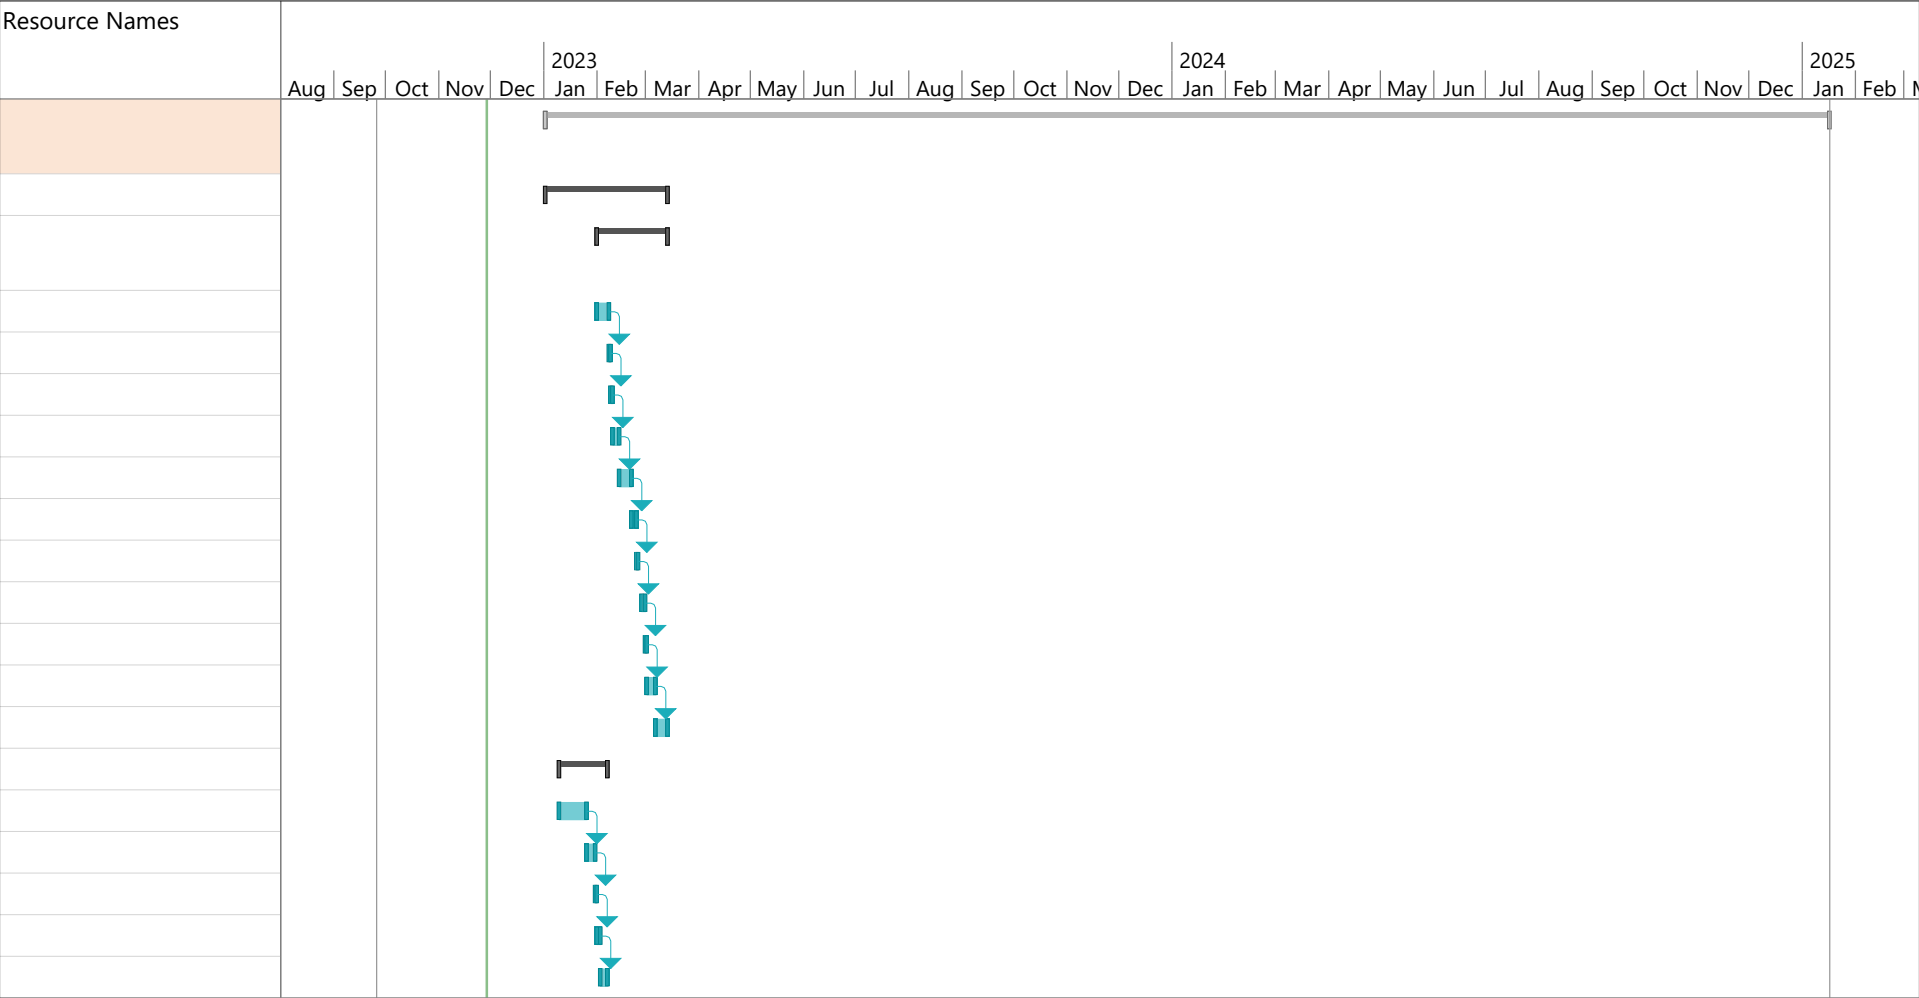


<div>Proyecto: PROGRAMA APOYO</div> <div>Fecha: Tue 11/29/22</div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

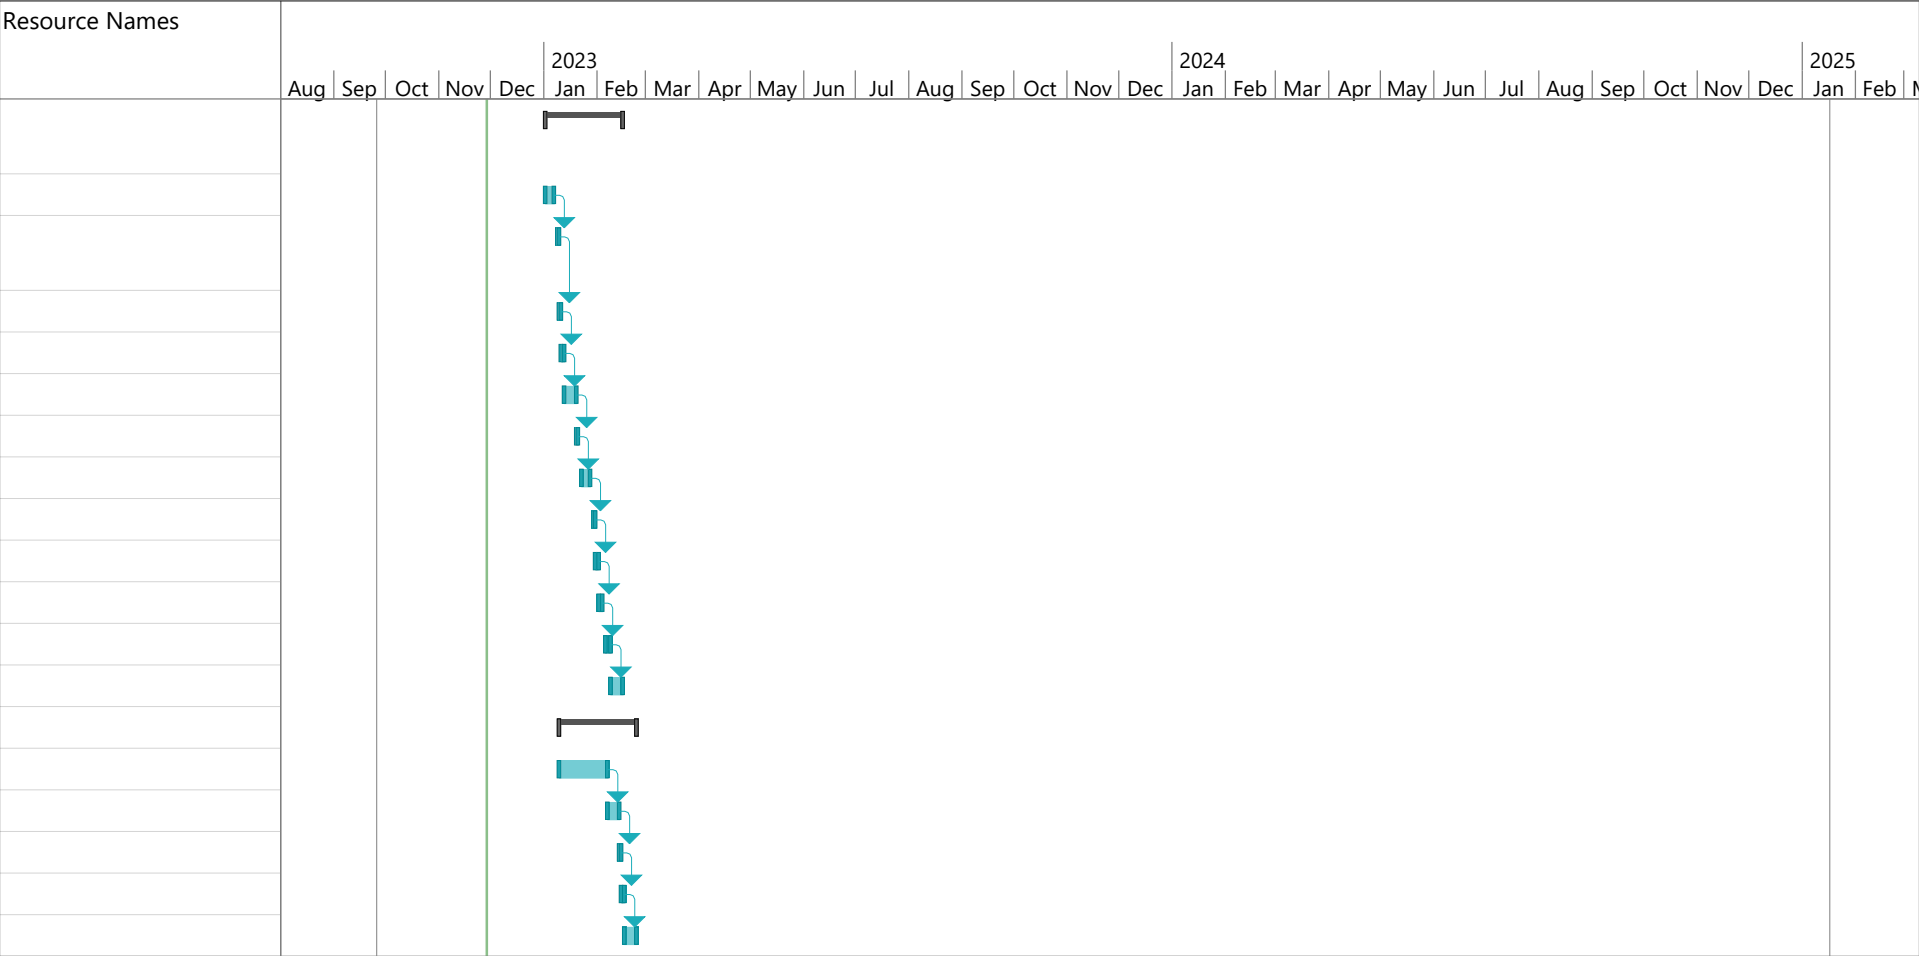


Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

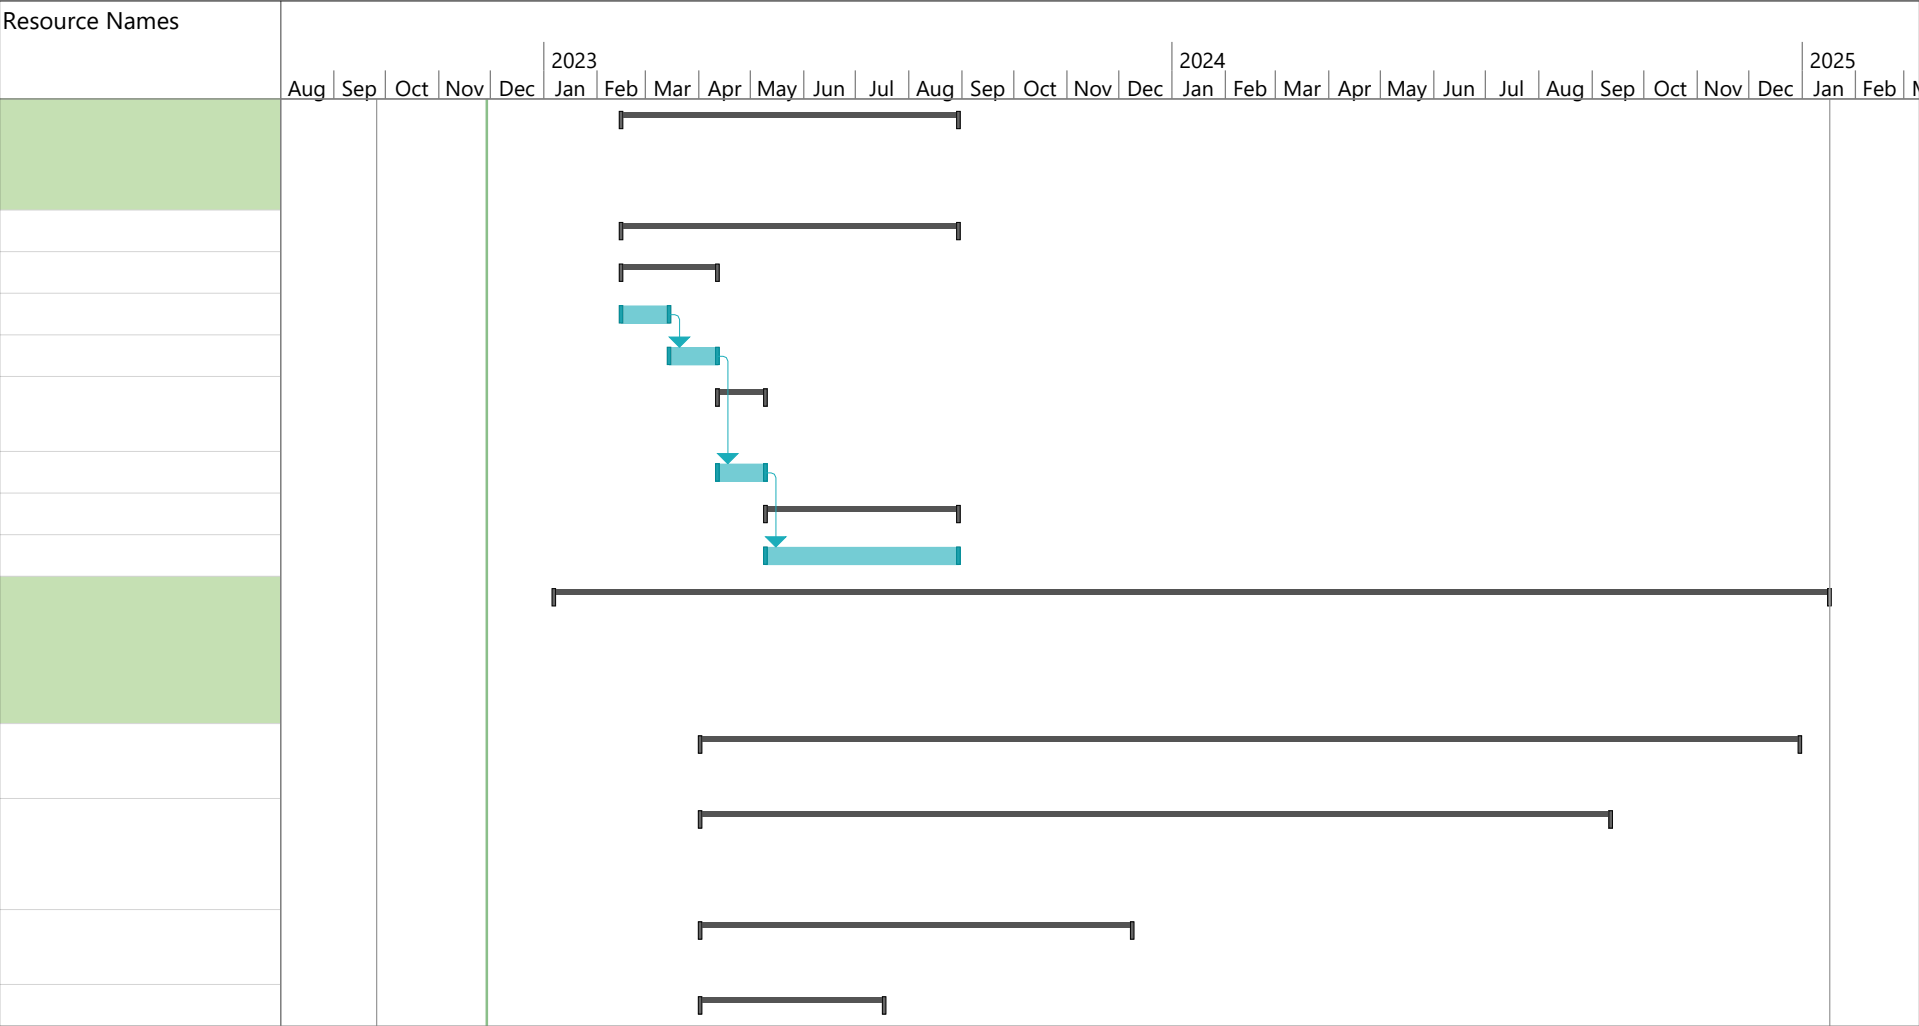


Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

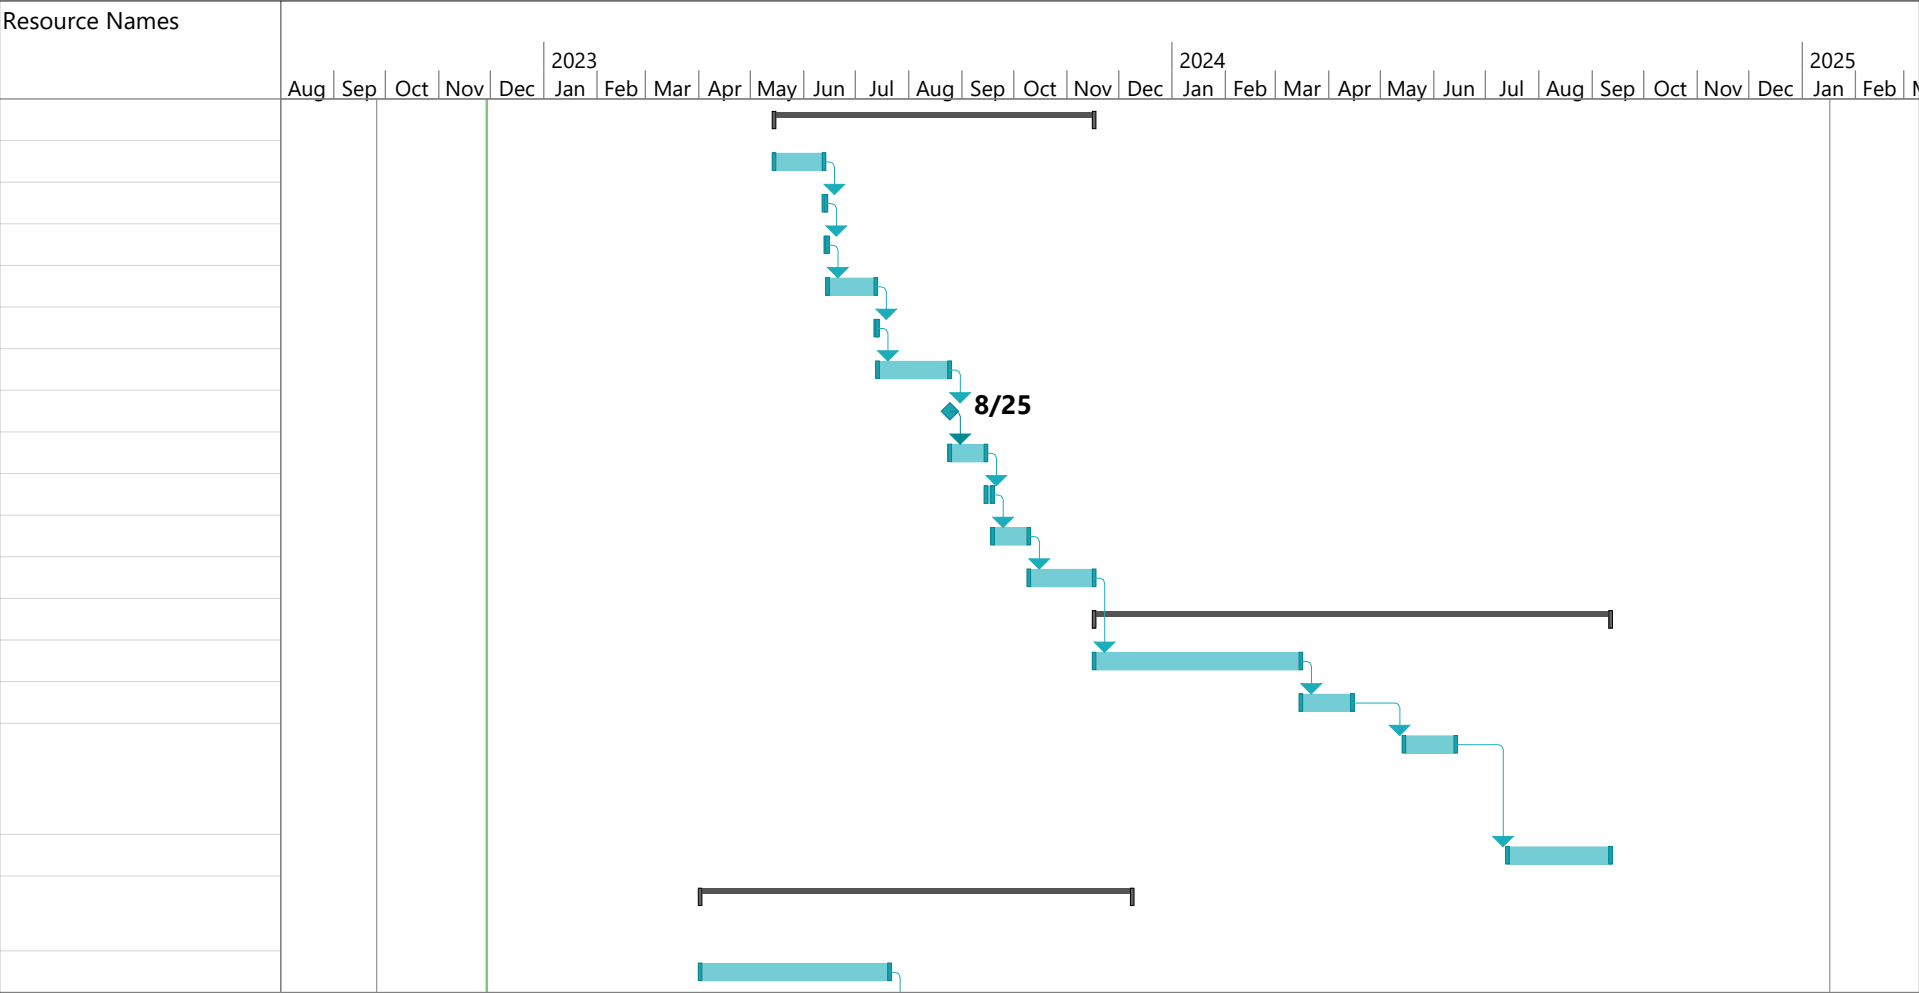


Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

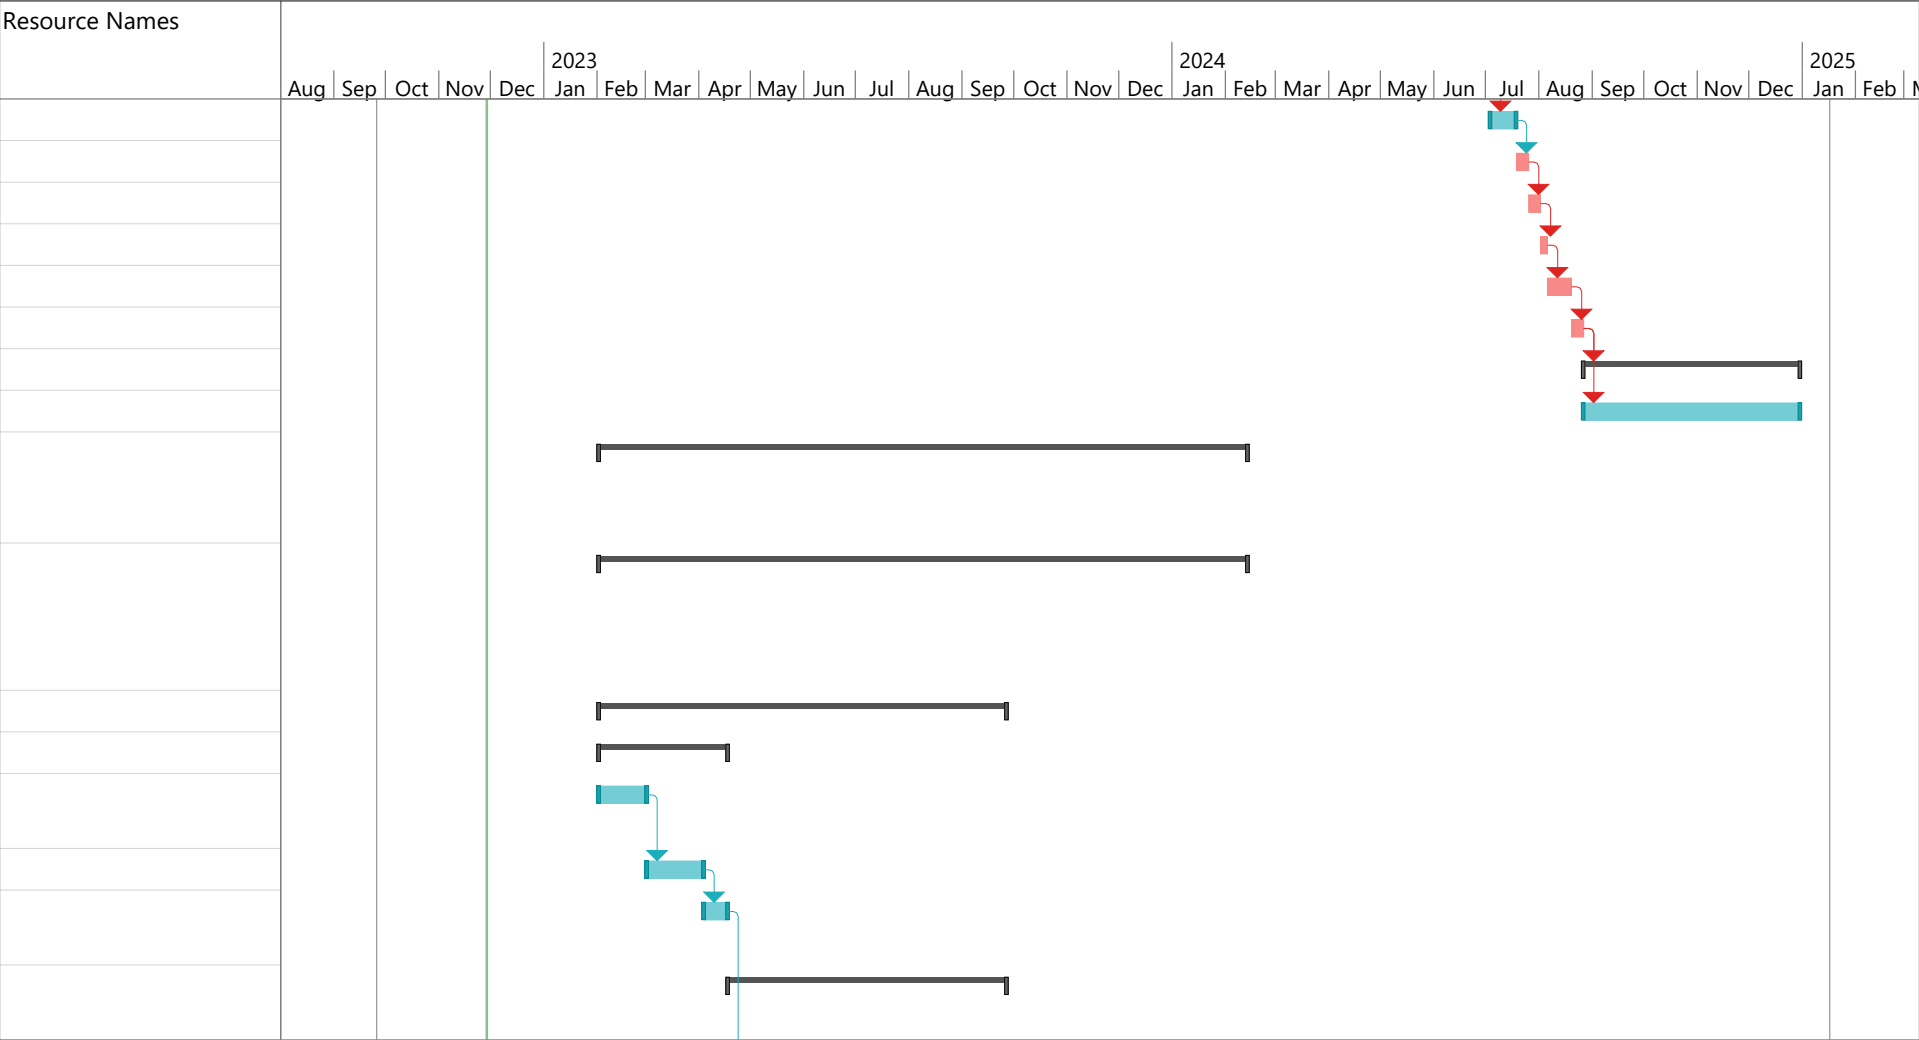


Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

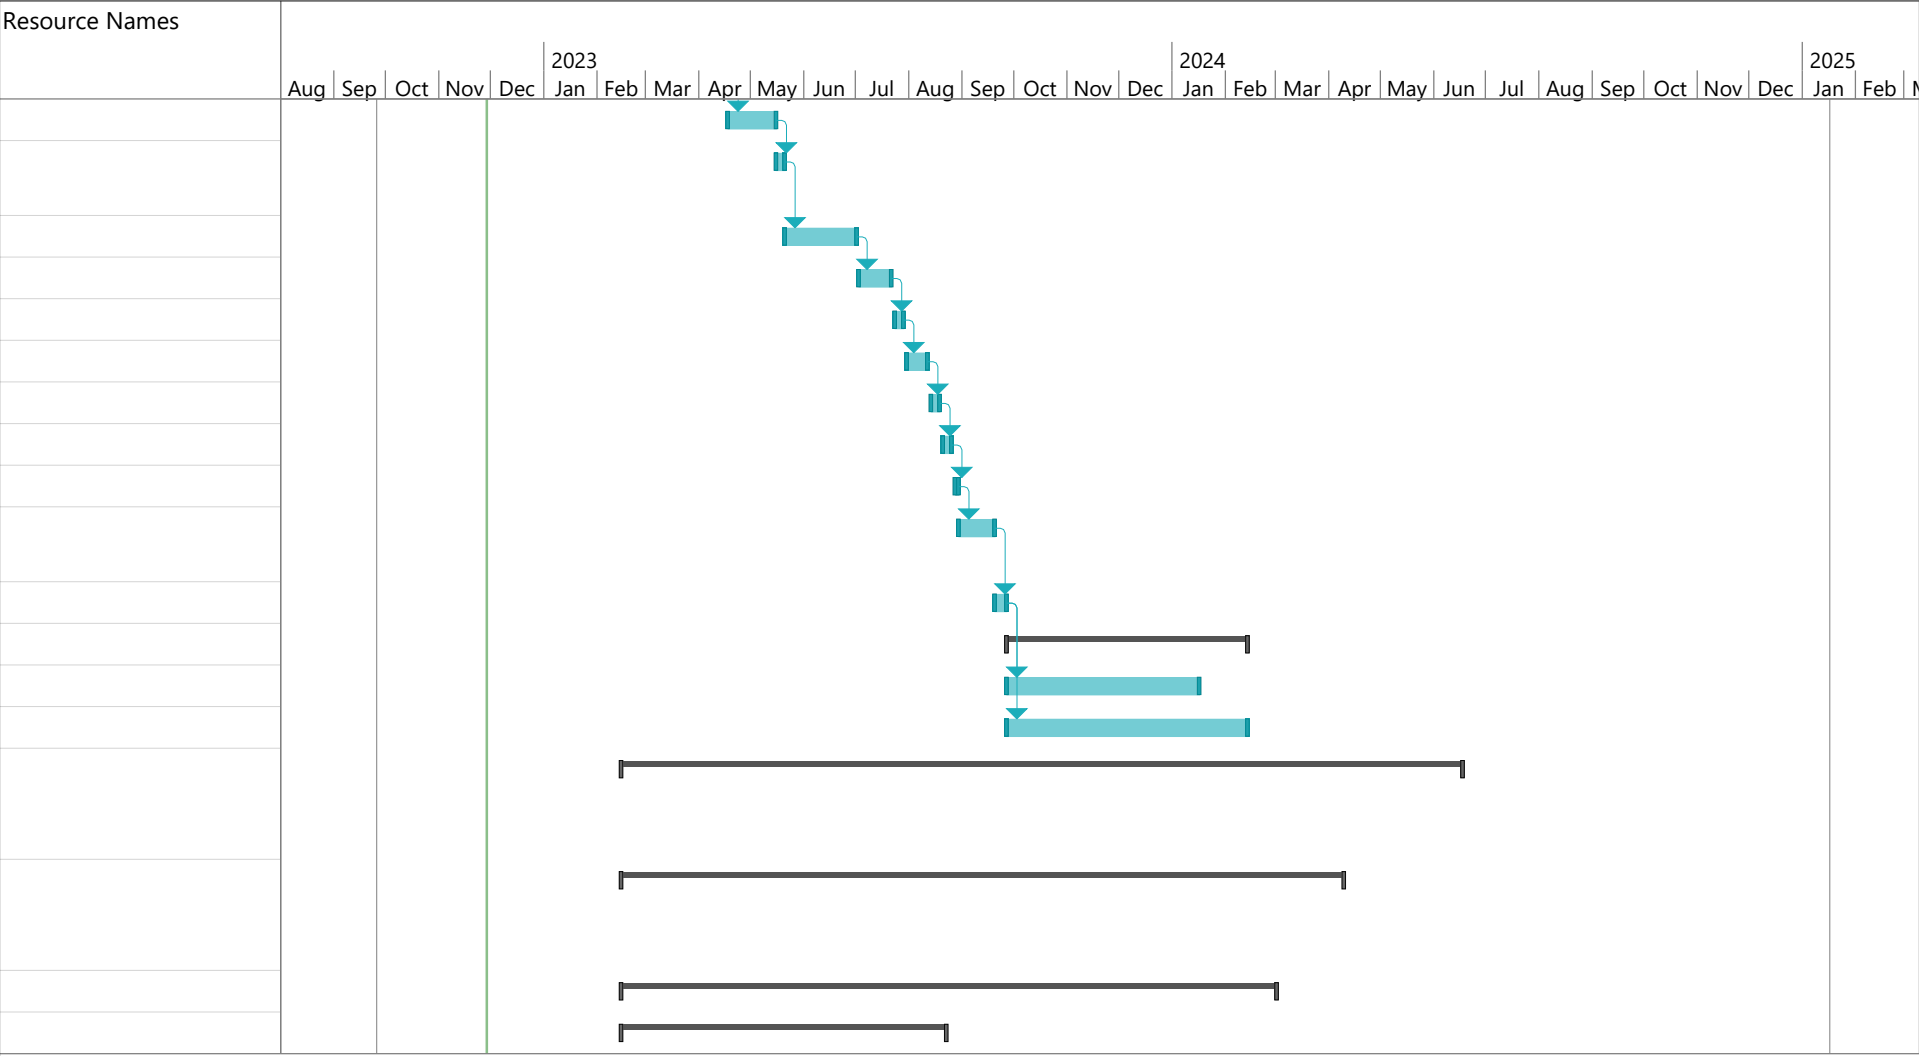


Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

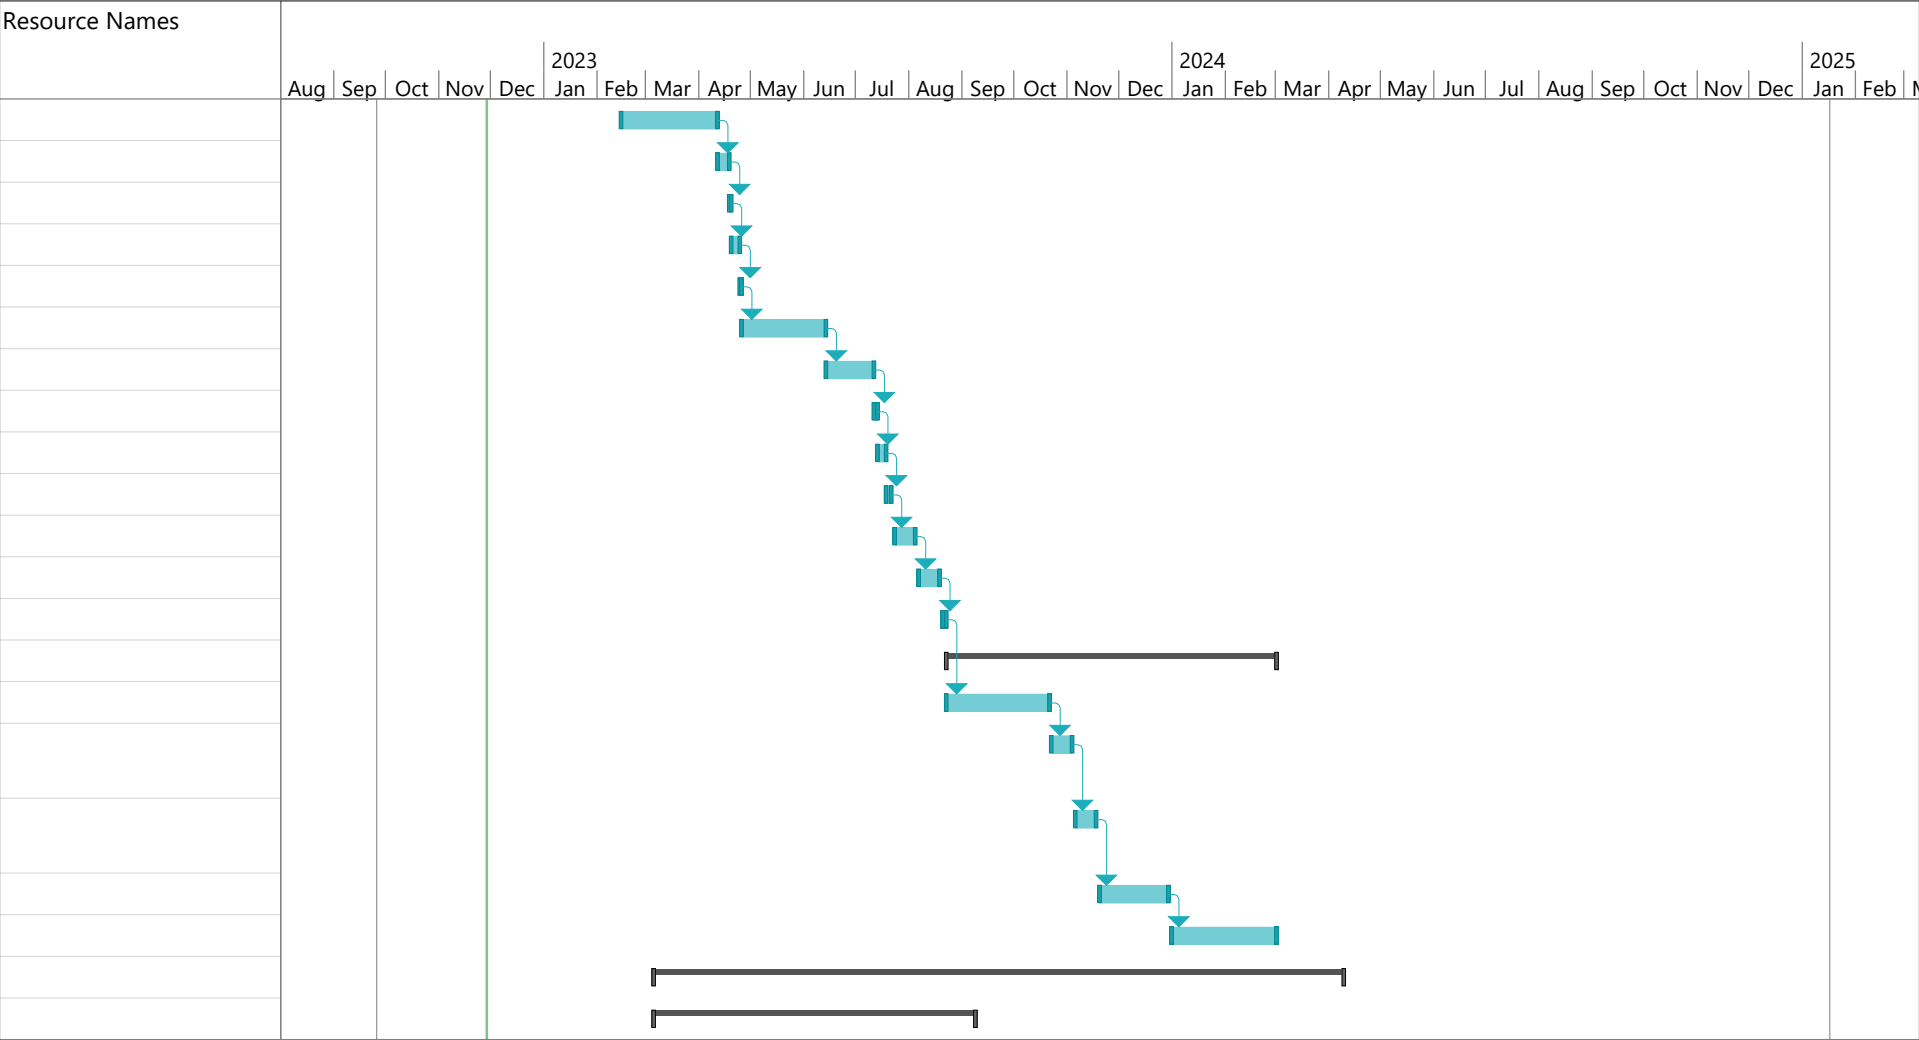


Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

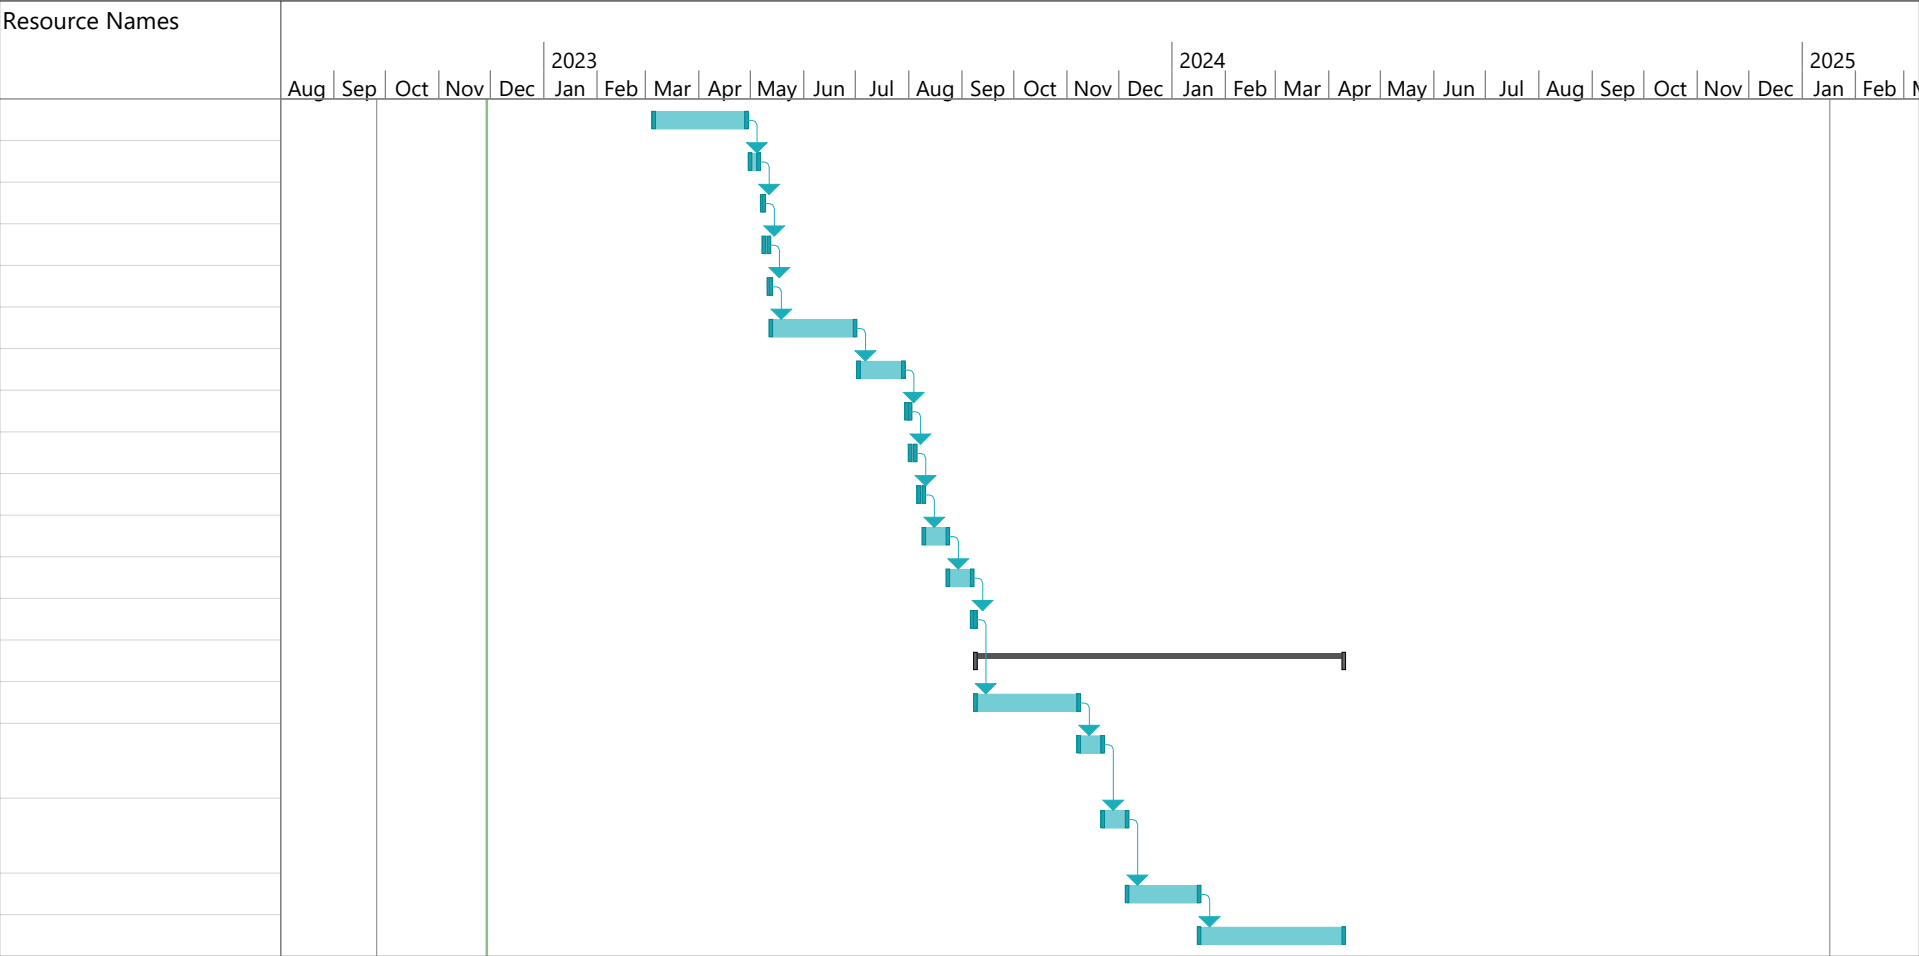


<div>Proyecto: PROGRAMA APOYO</div> <div>Fecha: Tue 11/29/22</div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

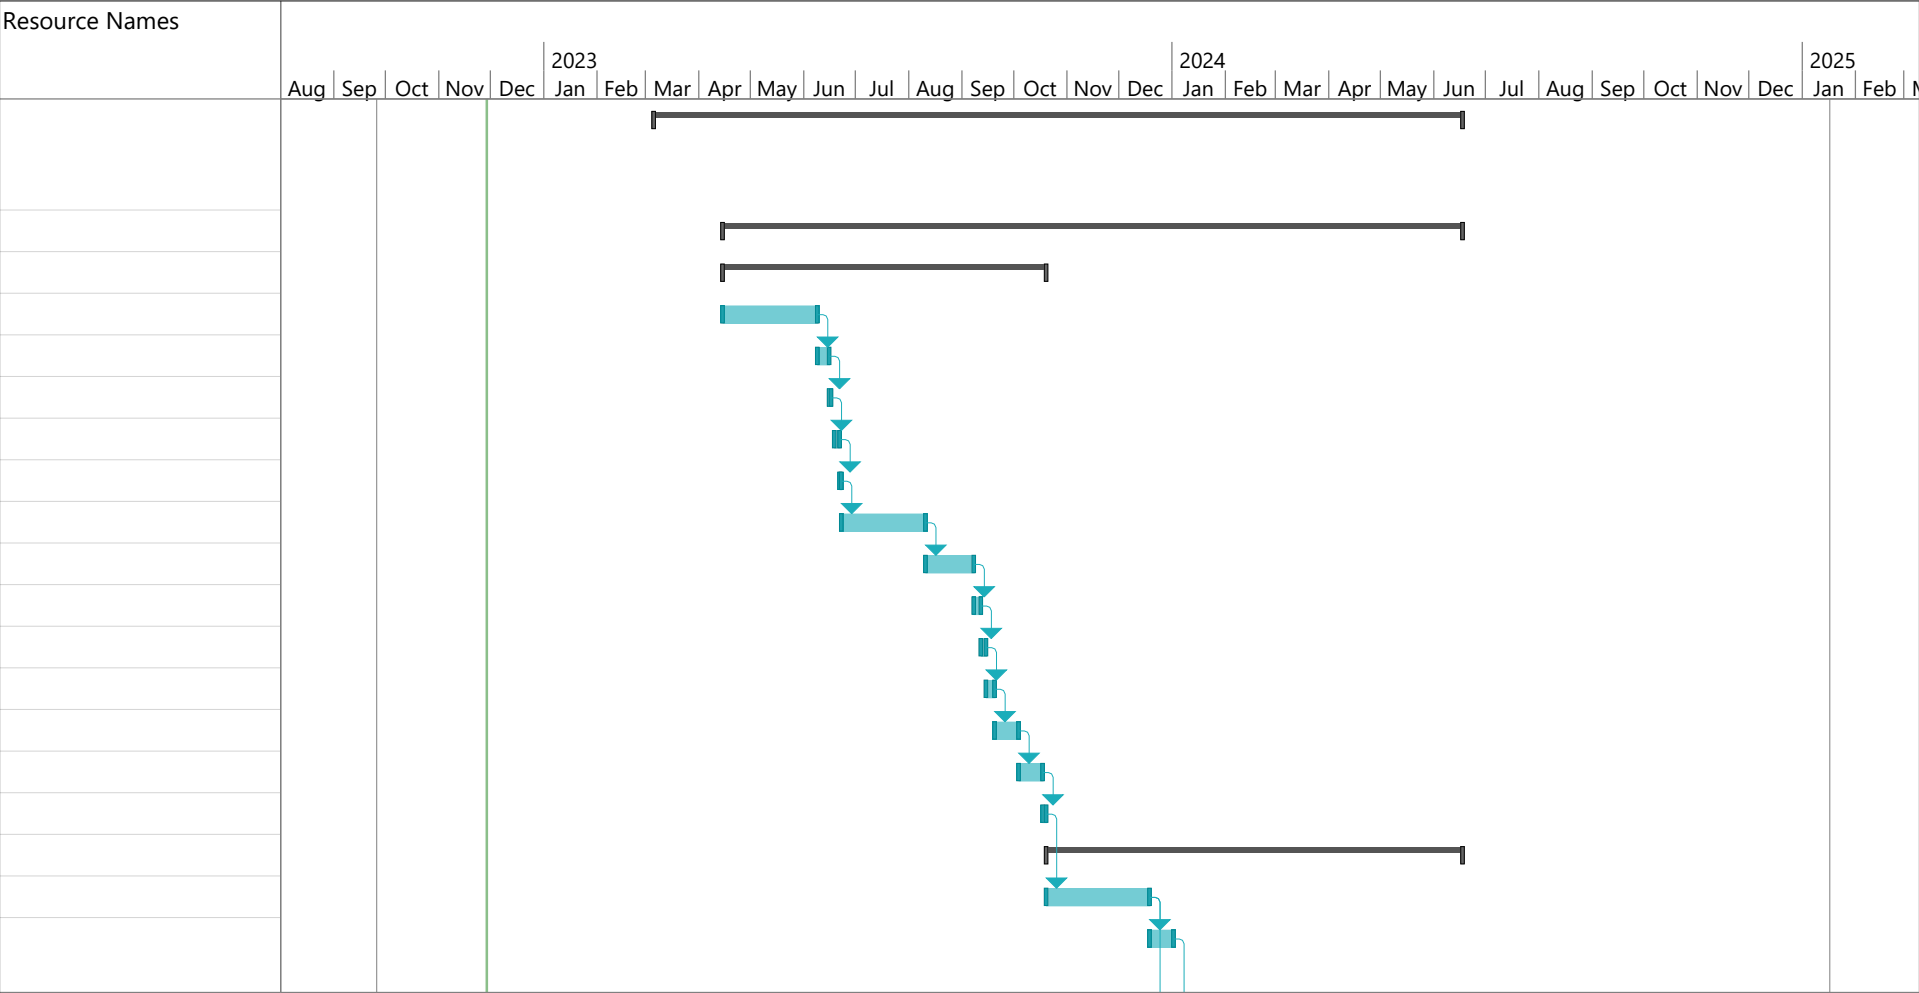

Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

[illegible]

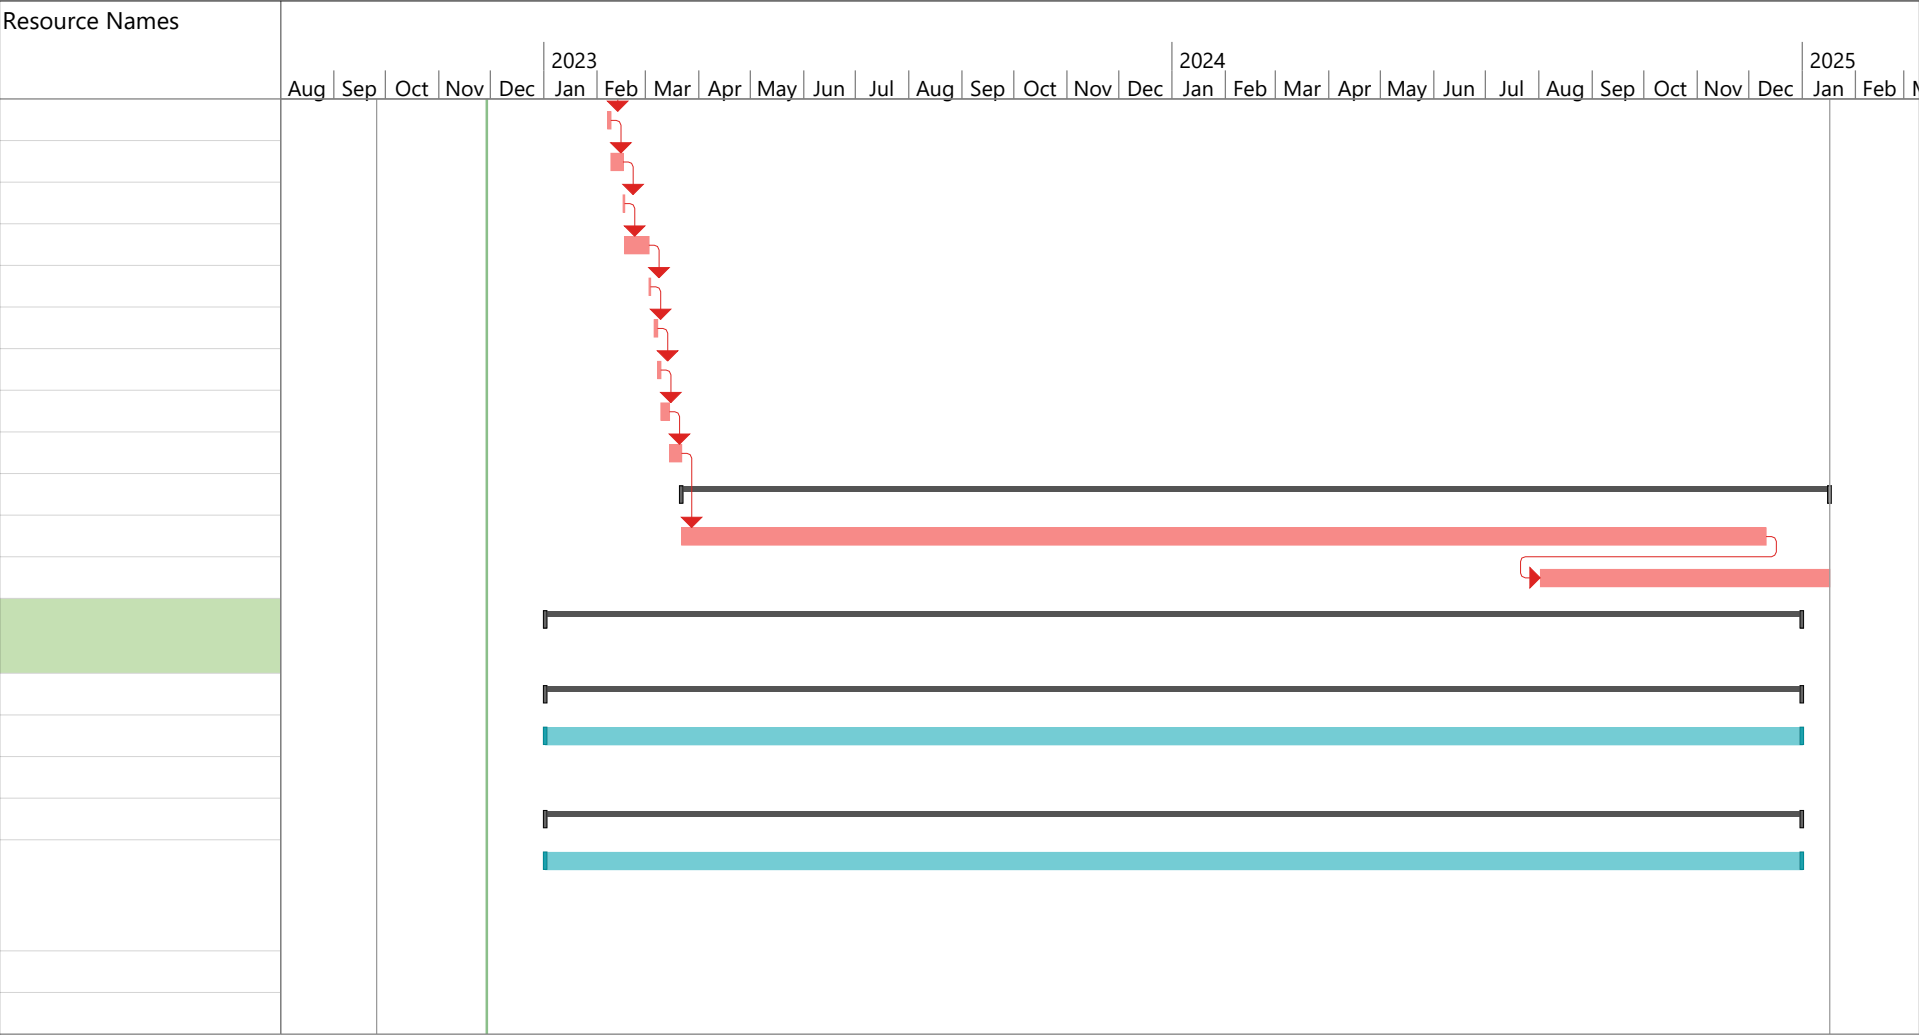

Proyecto: PROGRAMA APOYO
Fecha: Tue 11/29/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
