
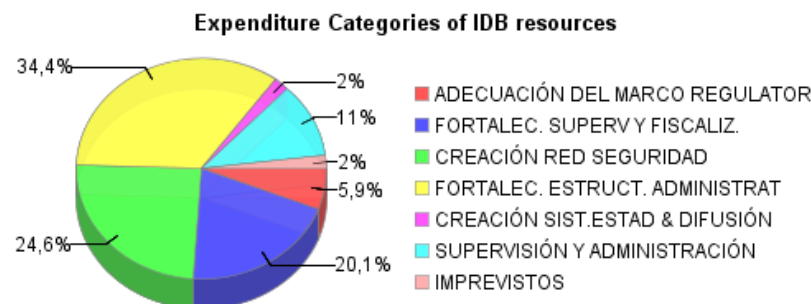
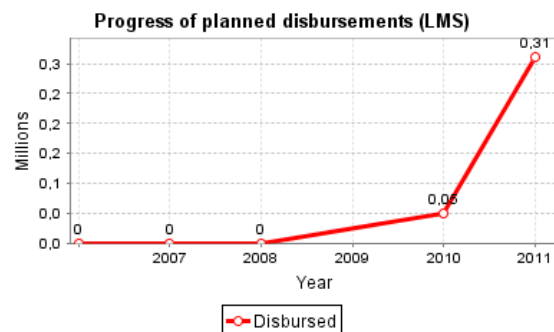



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA				
Sector:	CAPITAL MARKETS-FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	1818/OC-PR	Current Approved Amount:	3.600.000,00	Original IDB:	3.600.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	242.937,92	Current IDB:	3.600.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	6,75	Pari-passu:	73,00
Related Operation(s):		Balance:	3.357.062,08	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	SEF - Sector Facility			Original Estimate:	3.600.000,00
				Amortization Period (months):	210

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 27, 2011 Validated by Country Representative: Oct 20, 2011

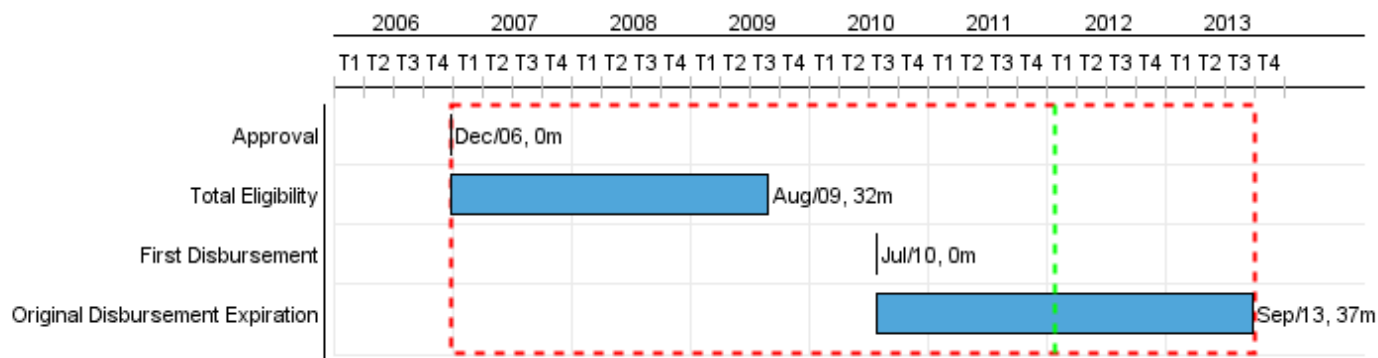

Accumulated Progress as of 2011

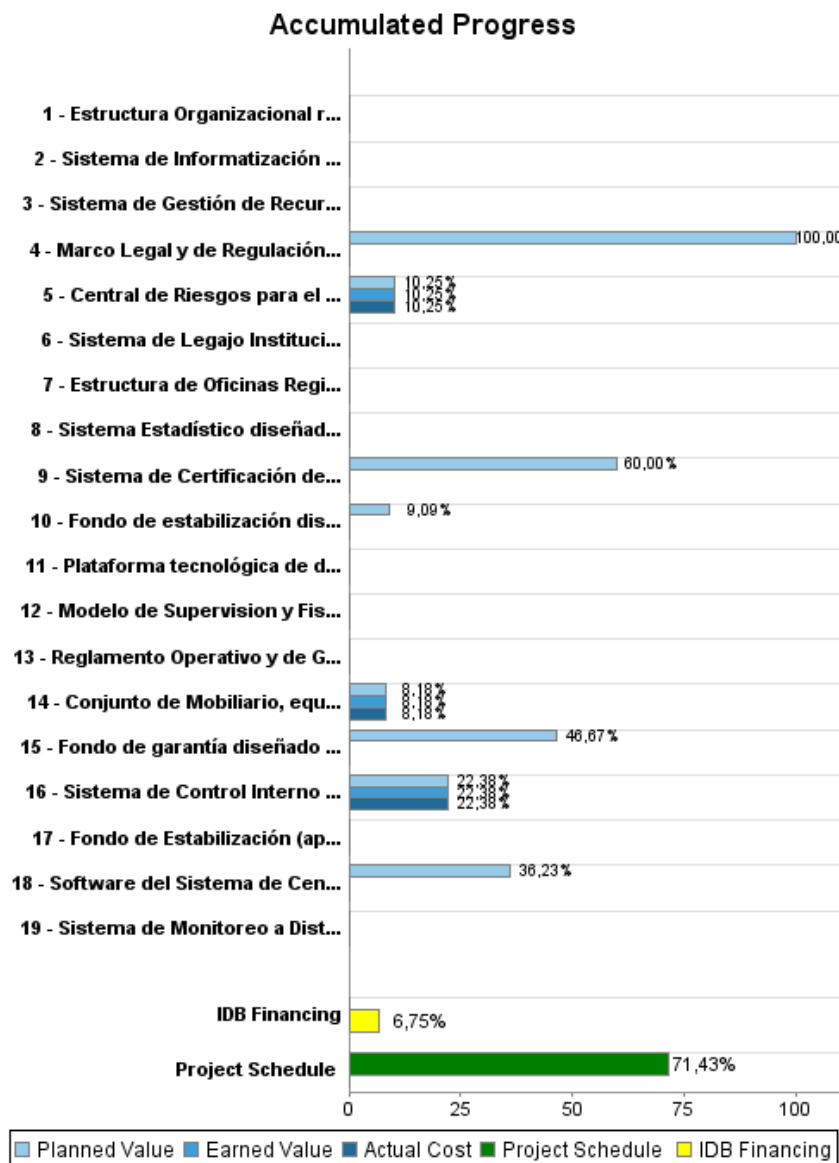

Outcomes

Outcome:	Sector Cooperativo Paraguayo mas Sostenible
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada	Cantidad	5,00	2010	P	15,00
				A	
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye	Cantidad	10,00	2010	P	4,00
				A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado									
Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado	Ley/Reglamentación	1,00			1,00	80.000,00			80.000,00
Sistema de Informatización de Sumarios operando	Sistema				1,00				40.000,00
Componente II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados									
Modelo de Supervisión y Fiscalización General diseñado, propuesto y aprobado y diseño de supervisión in-situ y extra-situ definidos y propuestos y Modelo de Supervisión Auxiliar Diseñado, propuesto e implementado.	Modelo				1,00				250.000,00
Sistema de Monitoreo a Distancia creado e implementado que incluye el modelo y reglamento operativo de gestión de riesgos diseñado para el INCOOP y en las Cooperativas asociadas implementado.	Sistema				1,00				120.000,00
Sistema de Legajo Institucional creado e implementado	Sistema				1,00				28.000,00
Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado	Sistema	1,00			1,00	18.000,00			30.000,00
Reglamento Operativo y de Gestión de Riesgos Diseñado	Reglamento				1,00				90.000,00
Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado	Software				1,00	100.000,00			276.000,00
Central de Riesgos para el sector cooperativo paraguayo creado, implementado e interconectado con la central de riesgos de Banco Central del Paraguay y al sistema de estadísticas judiciales.	sistema				1,00		5.946,00		58.000,00
Estructura de Oficinas Regionales Definidos y Propuestos	estructura				1,00				30.000,00
Componente III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación									
Fondo de garantía diseñado y propuesto, incluyendo su capacitación	Modelo	1,00			1,00	35.000,00			75.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fondo de estabilización diseñado y propuesta de implementación y capacitación que incluye reglamento de fusiones e incorporaciones, operando del Programa.	Modelo	1,00			1,00	80.000,00			880.000,00
Fondo de Estabilización (aporte paripassu)	Fondo				1,00				800.000,00
Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada									
Sistema de Control Interno implementado	Sistema				1,00		6.713,00		30.000,00
Estructura Organizacional rediseñada e implementada con perfiles de personal definidos.	Estructura Organizacional definida				1,00				80.000,00
Conjunto de Mobiliario, equipos e Instalaciones físicas dotado, automóviles adquiridos y sistema de comunicación e información adquirido	implementación de las mejoras				1,00		67.697,00		827.297,00
Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y operando que incluye los equipamientos;	Estructura equipada				1,00				742.000,00
Sistema de Gestión de Recursos Humanos diseñado e implementado con evaluación de desempeño, plan de carrera y evaluación de puestos.	Sistema				1,00				35.000,00
Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado									
Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado +manuales de procedimientos+capacitación)	Sistema				1,00				72.000,00
Componente VI - Gerencia del Proyecto									
TOTAL						313.000,00	80.356,00		4.543.297,00
