

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA
Sector:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo:	1818/OC-PR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	3.600.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	644.443,36
% Desembolsado:	17,90
Saldo:	2.955.556,64

Costo total y Fuente

BID Original:	3.600.000,00
Actual BID:	3.600.000,00
Pari-passu:	73,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	3.600.000,00
Período de Amortización (meses):	210

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 12-abr-2013
Validado por Representante de País: 15-abr-2013

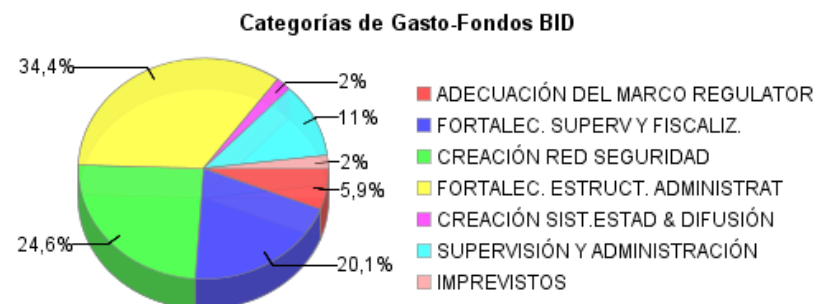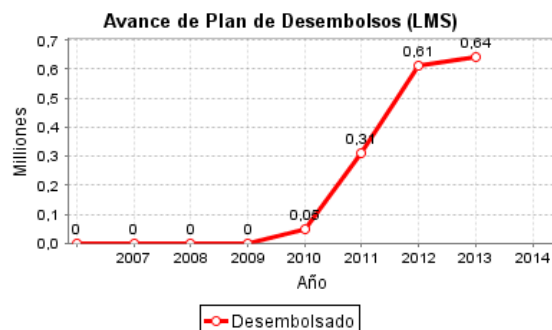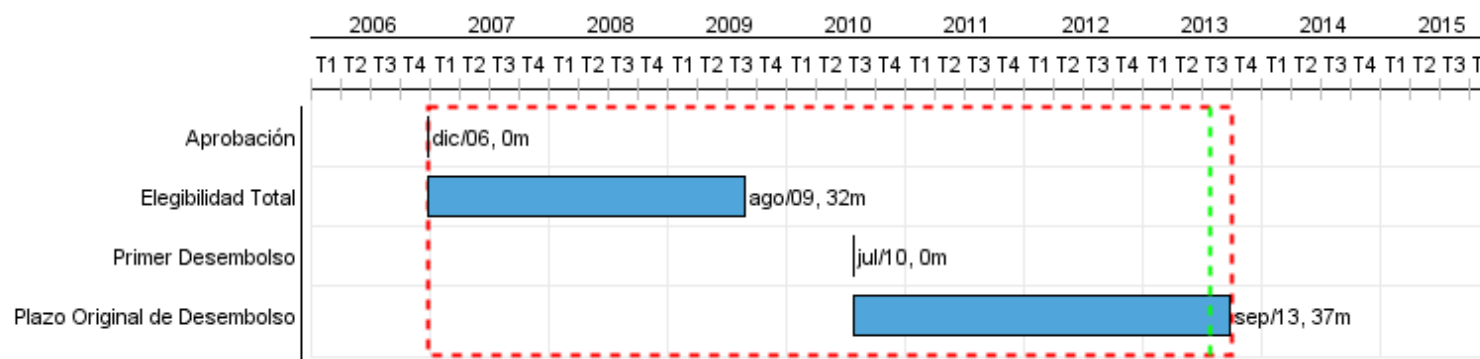

Progreso Acumulado al 2012

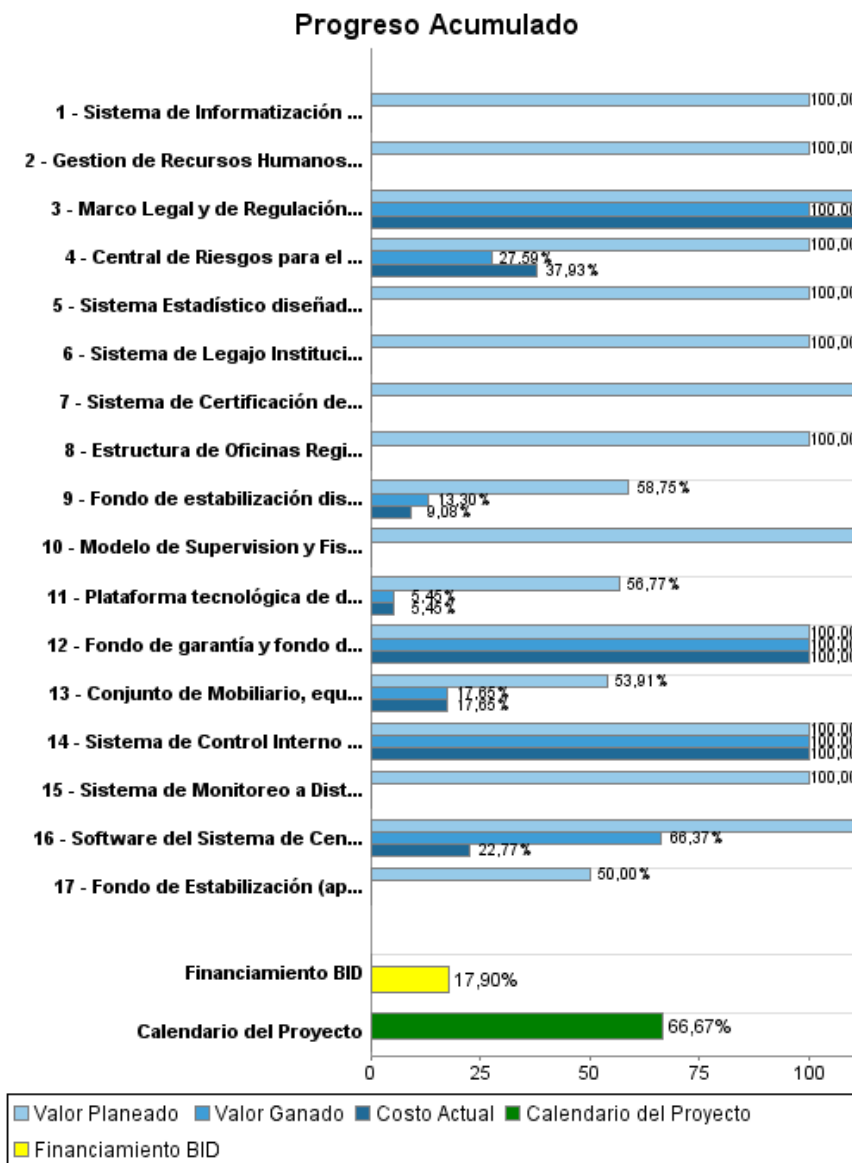

Resultados

Resultado:	Sector Cooperativo Paraguayo mas Sostenible
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada	Cantidad	5,00	2010	P	15,00
				A	
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye	Cantidad	10,00	2010	P	4,00
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado									
Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado	Ley/Reglamentación	1,00	1,00		1,00	80.000,00	93.664,00		80.000,00
Sistema de Informatización de Sumarios operando	Sistema				1,00				20.000,00
Componente II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados									
Modelo de Supervisión y Fiscalización General diseñado, propuesto y aprobado y diseño de supervisión in-situ y extra-situ definidos y propuestos y Modelo de Supervisión Auxiliar Diseñado, propuesto e implementado.	Modelo	1,00			1,00	250.000,00			250.000,00
Sistema de Monitoreo a Distancia creado e implementado que incluye el modelo y reglamento operativo de gestión de riesgos diseñado para el INCOOP y en las Cooperativas asociadas implementado.	Sistema				1,00				120.000,00
Sistema de Legajo Institucional creado e implementado	Sistema				1,00	10.000,00			20.000,00
Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado	Sistema	1,00			1,00	20.000,00			20.000,00
Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado	Software	1,00	1,00		1,00	150.000,00	51.452,00		226.000,00
Central de Riesgos para el sector cooperativo paraguayo creado, implementado e interconectado con la central de riesgos de Banco Central del Paraguay y al sistema de estadísticas judiciales.	sistema	1,00			2,00	42.000,00	6.000,00		58.000,00
Estructura de Oficinas Regionales Definidos y Propuestos	estructura				1,00				10.000,00
Componente III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación									
Fondo de garantía y fondo de estabilización diseñado y propuesto, incluyendo su capacitación	Modelo		1,00		1,00	40.000,00	40.000,00		75.000,00
Fondo de estabilización diseñado y propuesta de implementación y capacitación que incluye reglamento de fusiones e incorporaciones, operando del Programa.	Modelo		1,00		1,00	37.000,00	37.000,00		880.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PR-L1011 - Fortalecimiento Institucional del INCOOP

2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 03/04/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fondo de Estabilización (aporte paripassu)	Fondo				1,00				800.000,00
Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada									
Sistema de Control Interno implementado	Sistema	1,00	1,00		1,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
Gestión de Recursos Humanos, evaluación y Plan de carrera implementado. Estructura Organizacional rediseñada e implementada con perfiles de personal definidos.	Estructura Organizacional definida				1,00				80.000,00
Conjunto de Mobiliario, equipos e Instalaciones físicas dotado, automóviles adquiridos y sistema de comunicación e información adquirido	implementación de las mejoras				1,00				827.297,00
Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y operando que incluye los equipamientos;	Estructura equipada				1,00		56.000,00		1.027.000,00
Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado									
Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado +manuales de procedimientos+capacitación)	Sistema				1,00				20.000,00
Componente VI - Gerencia del Proyecto									
Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos	N/A					130.000,00	108.387,00		407.000,00
TOTAL						769.000,00	402.503,00		4.950.297,00
