
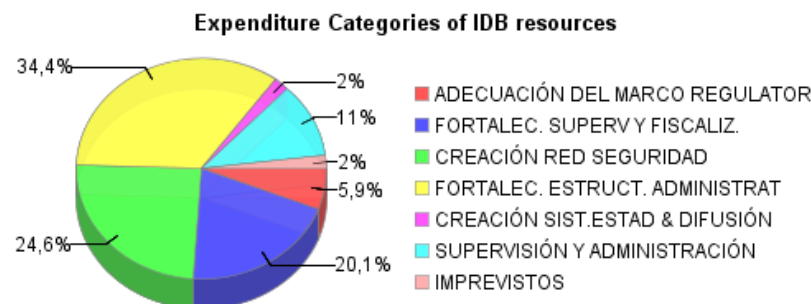
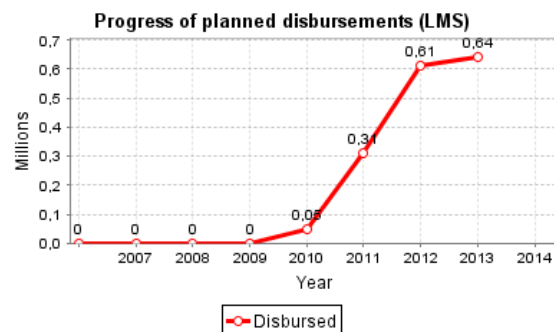



Summary Report

| Basic Data | | Available Funds (US\$) | | Total Cost and Source | |
|------------------------|--|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Executing Agency (EA): | UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA | | | | |
| Sector: | FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT | | | | |
| Loan Number(s): | 1818/OC-PR | Current Approved Amount: | 3.600.000,00 | Original IDB: | 3.600.000,00 |
| Stage: | Approved | Disbursed Amount to Date: | 644.443,36 | Current IDB: | 3.600.000,00 |
| Operation Type: | INV - Investment | % Disbursed: | 17,90 | Pari-passu: | 73,00 |
| Related Operation(s): | | Balance: | 2.955.556,64 | Co-Financing/Country: | |
| Operation Subtype: | SEF - Sector Facility | | | Original Estimate: | 3.600.000,00 |
| | | | | Amortization Period (months): | 210 |

| Project Environmental and Social Impact Category | Reformulation | Validation |
|--|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B13(R) | () Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 12-abr-2013 Validated by Country Representative: 15-abr-2013 |

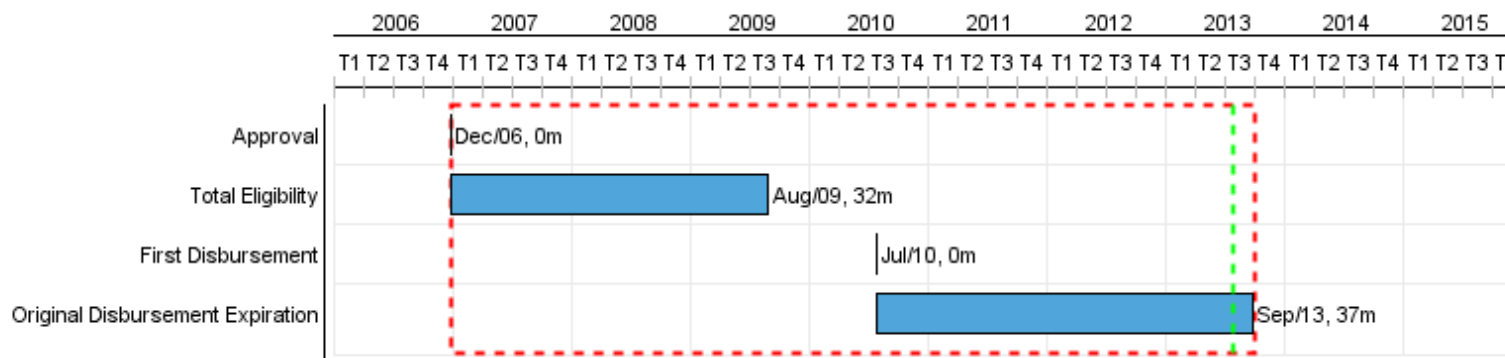

Accumulated Progress as of 2012

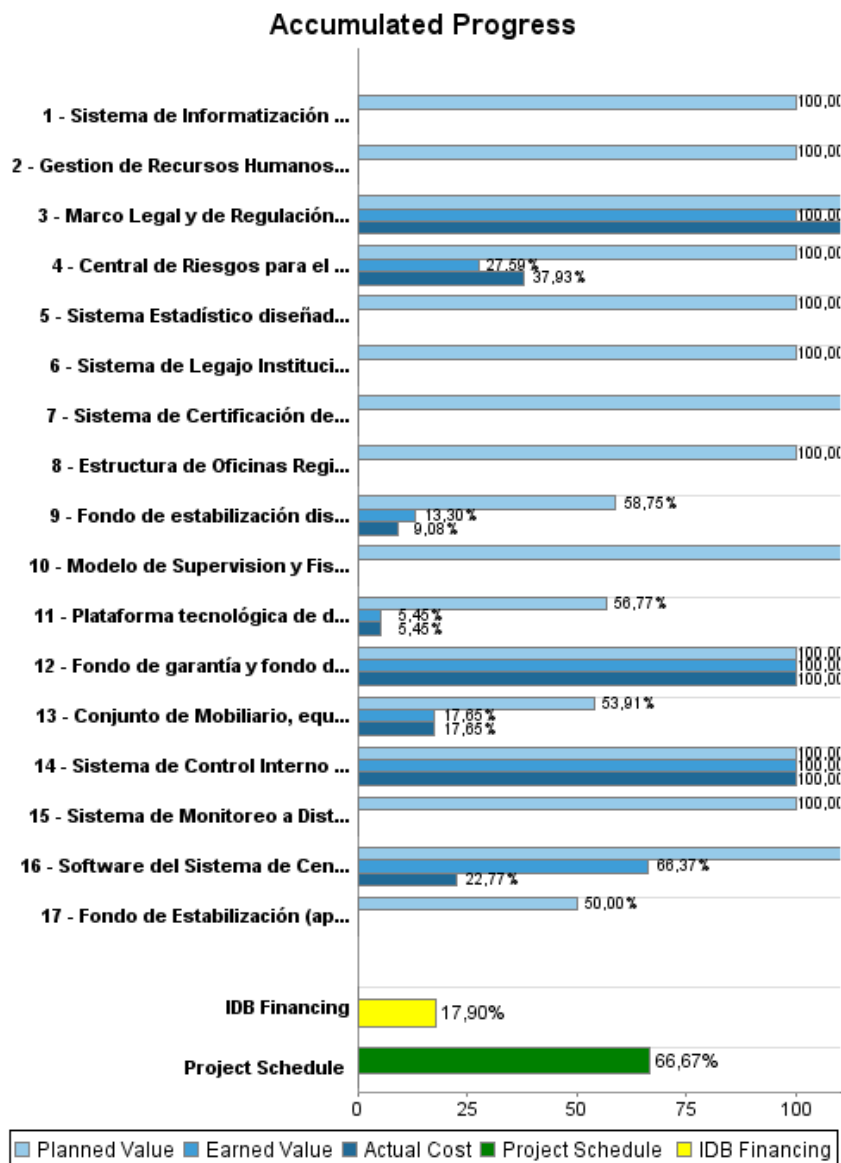

Outcomes

| | |
|-----------------|---|
| Outcome: | Sector Cooperativo Paraguayo mas Sostenible |
|-----------------|---|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|----------------|
| Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada | Cantidad | 5,00 | 2010 | P | 15,00 |
| | | | | A | |
| Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye | Cantidad | 10,00 | 2010 | P | 4,00 |
| | | | | A | |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|---|--------------------|----------|--------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Componente I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado | | | | | | | | | |
| Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado | Ley/Reglamentación | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 80.000,00 | 93.664,00 | | 80.000,00 |
| Sistema de Informatización de Sumarios operando | Sistema | | | | 1,00 | | | | 20.000,00 |
| Componente II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados | | | | | | | | | |
| Modelo de Supervisión y Fiscalización General diseñado, propuesto y aprobado y diseño de supervisión in-situ y extra-situ definidos y propuestos y Modelo de Supervisión Auxiliar Diseñado, propuesto e implementado. | Modelo | 1,00 | | | 1,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| Sistema de Monitoreo a Distancia creado e implementado que incluye el modelo y reglamento operativo de gestión de riesgos diseñado para el INCOOP y en las Cooperativas asociadas implementado. | Sistema | | | | 1,00 | | | | 120.000,00 |
| Sistema de Legajo Institucional creado e implementado | Sistema | | | | 1,00 | 10.000,00 | | | 20.000,00 |
| Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado | Sistema | 1,00 | | | 1,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado | Software | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 150.000,00 | 51.452,00 | | 226.000,00 |
| Central de Riesgos para el sector cooperativo paraguayo creado, implementado e interconectado con la central de riesgos de Banco Central del Paraguay y al sistema de estadísticas judiciales. | sistema | 1,00 | | | 2,00 | 42.000,00 | 6.000,00 | | 58.000,00 |
| Estructura de Oficinas Regionales Definidos y Propuestos | estructura | | | | 1,00 | | | | 10.000,00 |
| Componente III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación | | | | | | | | | |
| Fondo de garantía y fondo de estabilización diseñado y propuesto, incluyendo su capacitación | Modelo | | 1,00 | | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 75.000,00 |
| Fondo de estabilización diseñado y propuesta de implementación y capacitación que incluye reglamento de fusiones e incorporaciones, operando del Programa. | Modelo | | 1,00 | | 1,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | | 880.000,00 |

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|--|------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Fondo de Estabilización (aporte paripassu) | Fondo | | | | 1,00 | | | | 800.000,00 |
| Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada | | | | | | | | | |
| Sistema de Control Interno implementado | Sistema | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 30.000,00 |
| Gestión de Recursos Humanos, evaluación y Plan de carrera implementado. Estructura Organizacional rediseñada e implementada con perfiles de personal definidos. | Estructura Organizacional definida | | | | 1,00 | | | | 80.000,00 |
| Conjunto de Mobiliario, equipos e Instalaciones físicas dotado, automóviles adquiridos y sistema de comunicación e información adquirido | implementación de las mejoras | | | | 1,00 | | | | 827.297,00 |
| Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y operando que incluye los equipamientos; | Estructura equipada | | | | 1,00 | | 56.000,00 | | 1.027.000,00 |
| Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado | | | | | | | | | |
| Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado +manuales de procedimientos+capacitación) | Sistema | | | | 1,00 | | | | 20.000,00 |
| Componente VI - Gerencia del Proyecto | | | | | | | | | |
| Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos | N/A | | | | | 130.000,00 | 108.387,00 | | 407.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 769.000,00 | 402.503,00 | | 4.950.297,00 |
