



Operation Number: **BR-L1053**  
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**  
Last Update: **5/30/2014**  
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **06/11/2014**  
Division Chief validation date: **06/25/2014**  
Country Representative validation date: **07/11/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Apoyo a las Reformas Sociales de Ceará - PROARES Fase II	Loan Number:	2230/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS CEARA		
Team Leader:	Ochoa,Francisco Jose	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1053	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00	\$19,260,000.00	\$0.00	\$64,260,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1053	\$45,000,000.00	\$32,835,247.42	72.97%	\$12,164,752.58


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

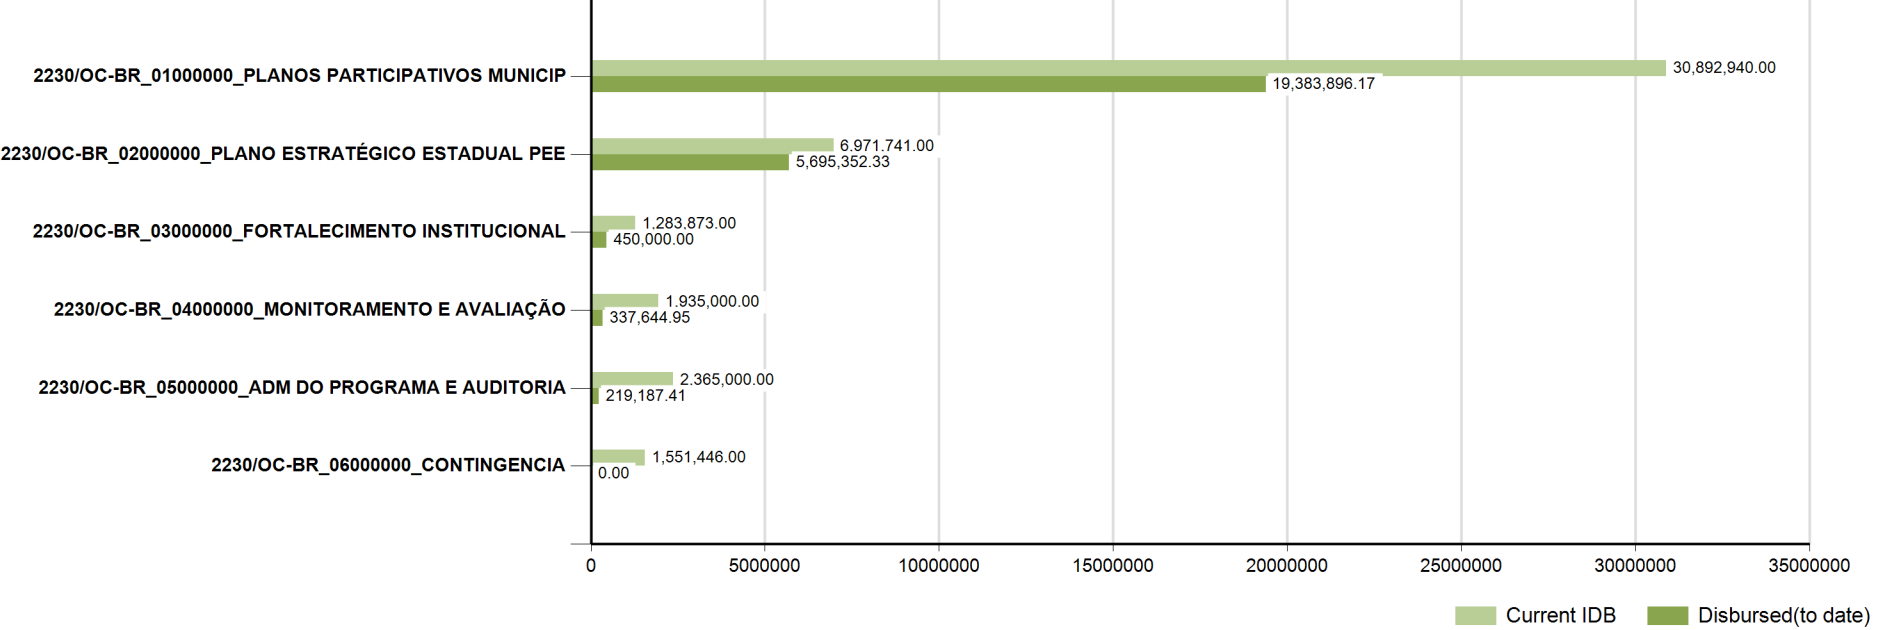

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condiciones de vida de niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Estado de Ceara mejoradas							
Observation:	El Banco y el gobierno estan negociando el modelo de evaluacion de impacto del Programa y muy posiblemente los indicadores estarán referidos a "desarrollo infantil temprano". La linea de base no ha sido recolectada hasta el momento. El atraso se debe a pr							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Niños menores de cinco años con desnutrición crónica.		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	
1.2 Niños con desarrollo motor adecuado para la edad		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	
1.3 Niños con desarrollo social adecuado para la edad		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	
1.4 Niños con desarrollo lenguaje adecuado para la edad		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	
1.5 Reincidencia de juvenes beneficiarios en conflictos con la ley en los ultimos 20 anos		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	

<b>Outcome:</b>	1 Cobertura de la red de servicios sociales orientada a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo ampliada							
<b>Observation:</b>								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
1.1 Niños menores de 5 años inscritos en Centros de Educación Infantil (CEIS).		numero		2011	Sistema de Información del PROARES II.	Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.	P	
	P(a)						6,000.00	
	A						4,065.00	
1.2 Jovens atendidos em Quadras ou Centros Esportivos		numero		2011	Sistema de Informação do PROARES II.	Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.	P	
	P(a)						37,500.00	
	A						20,500.00	
1.3 Jovens atendidos em Polos de atenção		numero		2011	Sistema de Informação do PROARES II.	Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.	P	
	P(a)						10,500.00	
	A						6,000.00	
<b>Outcome:</b>	2 Qualidade dos serviços de atenção aos jovens beneficiários melhorada							

Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de asesoria juridica		numero		2012		Os indicadore s estão previsto s ser definido s na Avaliaçã o de Impacto, que está sendo trabalha da em coordena ção com o BID.	P	
	P(a)						0.00	
	A							
2.2 Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de capacitacion profesional		numero		2012		Os indicadore s estão previsto s de serem definido s na Avaliaçã o de Impacto, que esta sendo trabalha do junto ao BID. Projeto Piloto (sem meta do FDP)	P	
	P(a)						0.00	
	A							
2.3 Valores, conocimientos y actitudes en adolescentes en conflicto con la ley		%		2012	Evaluacion cualitativa	Os indicadore s estão previsto s ser definido s na Avaliaçã o de Impacto, que está sendo trabalha da em coordena ção com o BID.	P	
	P(a)						0.00	
	A							

2.4 Satisfacción de los jóvenes beneficiarios en el uso de instalaciones del programa						Será realizada a a pesquisa para identificar os níveis de satisfação e re inserção dos jovens em conflito com a Lei. Os indicadores estão previstos de serem definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo coordenada com o BID.	<b>P</b>	
							<b>P(a)</b>	0.00
							<b>A</b>	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP
3.1 Beneficiarios con conocimiento del Programa		%		2012	resultados levantamiento línea basal y seguimiento	Os indicados estão previstos ser definidos na	P
						P(a)	80.00
						A	
						Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID. A partir do plano de comunicação	

3.2 Política Estadual para acciones socioeducativas.		1		2012		Plano Sócio Educativ o elaborado em fase final de revisão.	<b>P</b>	1.00
							<b>P(a)</b>	1.00
							<b>A</b>	
3.3 Servicios sociales del Programa funcionando de acuerdo a guías y manuales.		%		2012	Sistema de informacio n del PROARES II	Manuais elaborad os e não publicad os.	<b>P</b>	80.00
							<b>P(a)</b>	80.00
							<b>A</b>	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Planes Participativos Municipales.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y rehabilitados.	Centros	P	10.00	54.00	P	2,508,197.00	16,558,348.75
		P(a)	11.00	49.00	P(a)	2,400,000.00	10,752,540.75
		A	8.00	43.00	A	1,350,000.00	8,652,540.75
Quadras y Centros Esportivos implantados.	quadras y centros	P	7.00	49.00	P	3,000,000.00	13,739,357.64
		P(a)	10.00	53.00	P(a)	2,300,000.00	10,607,939.64
		A	8.00	42.00	A	1,646,000.00	8,507,939.64
Polos de Atención construido.	Polos de Atención	P	8.00	21.00	P	3,000,000.00	8,064,756.24
		P(a)	4.00	18.00	P(a)	1,800,000.00	5,616,744.24
		A	2.00	13.00	A	1,211,000.00	4,416,744.24
Centros de Referencia da Assistencia Social ( CRAS) construidos.	Centros CRAS	P	10.00	41.00	P	1,306,959.00	6,151,332.67
		P(a)	9.00	31.00	P(a)	800,000.00	4,153,373.67
		A	6.00	25.00	A	450,000.00	3,053,373.67
Bibliotecas implantadas.	Bibliotecas	P	1.00	4.00	P	175,841.00	855,841.16
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	300,000.00	1,438,000.16
		A	1.00	2.00	A	181,000.00	538,000.16
Plano Estratégico Estadual.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Unidades de rehabilitacion social de jovenes construídas.	centros de reabilitación	P		2.00	P	0.00	5,879,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	0.00	8,420,000.00
		A	1.00	2.00	A	139,000.00	7,520,000.00
Capacitación p/profissionais de centros de rehabilitacion realizadas.	capacitaciones	P	0.00	10.00	P	0.00	679,148.85
		P(a)	2.00	19.00	P(a)	232,000.00	898,493.85
		A	6.00	19.00	A	83,000.00	798,493.85
Proyectos pilotos de insercion laboral de jovenes implementados.	proyectos	P	1.00	2.00	P	182,000.00	480,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		468,000.00
		A		0.00	A	19,000.00	68,000.00
Unidades de la Red socioeducativa informatizada.	Unidades	P	0.00	15.00	P	0.00	306,000.00
		P(a)	0.00	17.00	P(a)	60,000.00	406,674.00
		A		17.00	A	231,000.00	406,674.00
Fortalecimiento institucional.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Dirigentes y tecnicos del sistema de protección social do Ceará formados.	técnicos	P		60.00	P	0.00	450,000.00
		P(a)	40.00	120.00	P(a)	168,000.00	323,000.00
		A	40.00	80.00	A	57,000.00	221,000.00
Capacitación en Planificacion Participativa realizados.	capacitaciones	P		3.00	P		261,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		275,924.00
		A		3.00	A		275,924.00
Capacitación para la Gerencia de los Servicios Sociales realizadas.	capacitaciones	P	0.00	3.00	P	0.00	339,352.65
		P(a)	3.00	8.00	P(a)	48,000.00	503,534.65
		A	1.00	5.00	A	53,000.00	196,534.65
Planes de Comunicación Social desarrollados y incrementados.	Planos	P	0.00	1.00	P	0.00	1,000,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	590,000.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Monitoreo y Evaluacion.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP



Estudios y investigaciones realizados.	estudios	P	2.00	4.00	P	225,000.00	425,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	60,000.00	278,000.00
		A	1.00	2.00	A	31,000.00	123,000.00
Evaluación Intermedia realizada.	evaluaciones	P		1.00	P		700,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		23,000.00
		A		1.00	A		23,000.00
Evaluación Final realizada.	evaluaciones	P		1.00	P		700,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Sistema Informático de Monitoreo descentralizado implementado	sistema	P		1.00	P	0.00	270,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	40,000.00	138,000.00
		A		2.00	A	35,000.00	98,000.00
Administración del Programa.							

Other Cost		2013	Cost
Administración y Auditoria.	P	\$950,000.00	\$3,951,000.69
	P(a)	\$1,000,000.00	\$4,799,000.69
	A	\$544,000.00	\$2,569,000.69
Contingencia.	P	\$372,000.00	\$1,572,000.00
	P(a)	\$0.00	\$0.00
	A		\$0.00
Costos Financeiros.	P	\$800,000.00	\$3,097,000.00
	P(a)	\$300,000.00	\$1,378,692.00
	A	\$520,000.00	\$1,078,692.00
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$12,519,997.00	\$65,479,138.65
	P(a)	\$10,098,000.00	\$50,480,917.65
	A	\$6,550,000.00	\$38,546,917.65

### Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
