



Operation Number: **BR-L1177**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/20/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Expansion and Strengthening of Specialized Health Services in Ceará	Loan Number:	2137/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA		
Team Leader:	Rocha,Marcia Gomes	Sector/Subsector:	HEALTH SERVICES
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DE CEARA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1177	\$77,000,000.00	\$77,000,000.00	\$46,470,600.00		\$123,470,600.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1177	\$77,000,000.00	\$76,999,613.32	100.00%	\$386.68


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

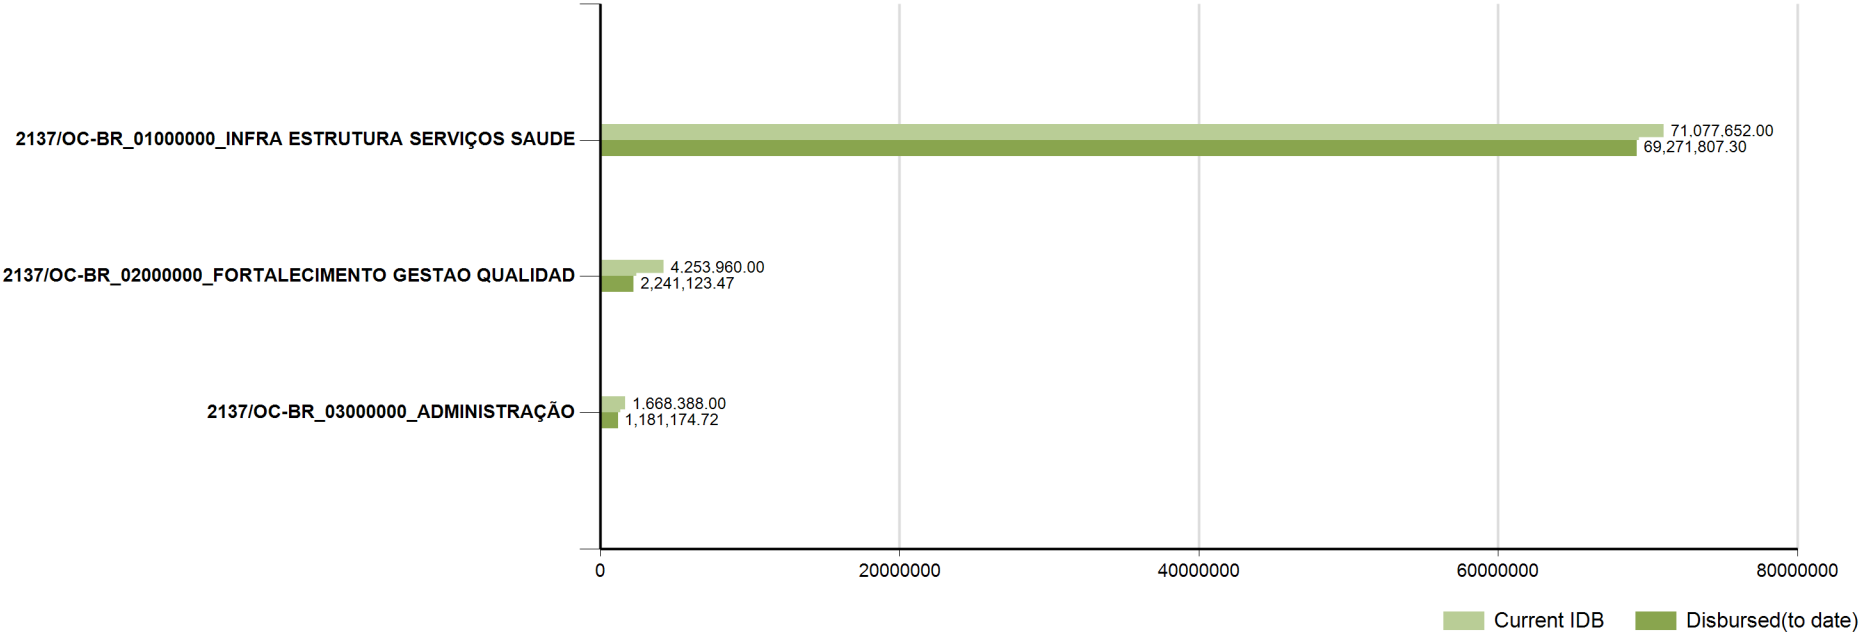

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condiciones de salud de la poblacion de Ceará mejoradas, mediante la expansion del acceso y la mejora de la calidad de los servicios especializados de salud.										
Observation:	Al momento de la aprobación del proyecto los datos eran preliminares porque el ciclo de validación de las estadísticas de salud no estaban concluidos.										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2014	2016	EOP
1.1 Tasa de Razao de mortalidade materna en Ceará		P/100.000	71.10	2009	Sistema SINASC / SIM (SESA)	Al momento de la aprobación del proyecto los datos eran preliminares porque el ciclo de validación de las estadísticas de salud no estaban concluydos. Por esto se cambió este indicador de 64,20 al 71,7 por 100 mil nacidos vivos. Nome do Indicador: RMM-	P		64.50	53.50	48.00
							P(a)	71.70	64.50	53.50	53.50
							A	76.10	80.50	83.00	65.50
1.2 Coeficiente de Mortalidad Infantil Neonatal en la Macrorregion Sobral		P/100.000	13.00	2009	Sistema SIM/SINASC	La redaccion del indicador pasó a incluir la 'macrorregião' uma vez que é a área de abrangência do novo Hospital Regional Norte que inclui varios municipios además de Sobral. A unidade de medida passa a ser p/100.000. Cálculo: Nº de Óbitos crianças de 0-2	P		10.30	9.70	9.70
							P(a)	11.30	10.30	9.70	9.70
							A	9.30		9.80	10.00
1.3 Porcentaje de casos de Cancer de Mama detectados en estadios III y IV en Estado de Ceará.		%	9.98	2009	Registro hospitalario de Cancer - Estado Ceara - INCA		P		41.77	38.00	38.00
							P(a)	43.70	41.77	38.00	38.00
							A	39.50	5.74	0.00	57.20

Outcomes

Outcome:	1 Disponibilidad de servicios de salud de nivel secundario y terciário expandida (acceso).											
Observation:	A partir del ejercicio de marzo de 2010 entre SPD y SPH, se ha optado por añadir algunos indicadores de outcomes (de acceso y de calidad) no previstos en la matriz de resultados original del Programa. El ejecutor esta de acuerdo en incluirse los para el s											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	2016	EOP
							P			0.30		30.00
							P(a)			30.00		30.00
1.1 Cobertura de consultas médicas especializadas		Porcentaje	0.29	2009	Sistema de información SESA-CORAC/SIA/IBGE	Cálculo: N° consultas médicas especializadas aprobadas *100/N° total de habitantes. Se refiere a consultas especializadas realizadas pelo profissional médico. Excluidas de emergência/urgência	A	28.95	30.00		30.00	

1.2	Transferências obstétricas solicitadas de la Macro Region de Sobral para Fortaleza.		transferências	308.00	2009	Sistema de información SESA-CORAC/CNE	A partir del ejercicio de marzo de 2010 promovido entre SPD y SPH se ha optado por añadir algunos indicadores de resultados de acceso y de calidad no previstos en la matriz de resultados original del Programa.	P					230.00
								P(a)	304.00	210.00	77.00		77.00
								A		308.00	4.00		4.00
1.3	Solicitud de internación de UTI neonatal de la Macro Región de Sobral para Fortaleza		Numero de solicitudes	154.00	2009	SESA-CORAC/CNE	A partir del ejercicio de marzo de 2010 promovido entre SPD y SPH se ha optado por añadir algunos indicadores de resultados de acceso y de calidad no previstos en la matriz de resultados original del Programa.	P					
								P(a)	180.00	89.00	36.00		36.00
								A	113.00	107.00	10.00		10.00
Outcome:	2 Servicios especializadas de salud con calidad mejorada.												

Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	2016	EOP
2.1 Promedio de tiempo de espera para consultas especializadas		dias	90.00	2009	Centrales de regulaci3n.	Indicador demanda mudan7as em sistema que est3o em curso na Secretaria.	P			30.00		30.00
							P(a)	60.00	30.00	30.00		30.00
	A							68.94	41.00		41.00	
2.2 Proportion de mujeres mayores de 40 anos que reciben una mamografia al a1o		%	2.02	2009	Sistema de informaci3n SESA y registro hospital3rio de cancer - INCA	As metas foram estimadas considerando o in3cio de funcionamento (progressivo) dos mam3grafos do PROEX MAES somadas 3 produ73o de mamografias j3 realizadas no estado. C3lculo: N3 de mamografias realizadas e aprovadas em mulheres maiores de 40 anos * 100 /	P					
							P(a)	5.50		7.00		7.00
	A							7.08	7.00		6.90	
2.3 Propor73o de consultas especializadas realizadas en las Policlinicas que fueron referenciadas de la atenci3n b3sica		Individuals	81.88	2011	Sistema de Informacao SISREG III (SESA)		P					
							P(a)	80.00		80.00		80.00
	A							100.00	100.00		100.00	

2.5 Taxa de infecção Primária de Corrente Sanguínea Clínica (IPCSC) – UTI Adulto (HRN)		percentual de casos	2.44	2013	Núcleo de Vigilância Sanitária/ COPROM/ SESA e Coordenação de Segurança do Paciente e Controle de IRAS. Coordenadora de Gestão Estratégica – ISGH		P					
							P(a)			2.00		2.00
							A			1.40		1.40
2.6 Taxa de infecção Primária de Corrente Sanguínea Clínica (IPCSC) – UTI Adulto (HRC)		percentual de casos	0.60	2013	Núcleo de Vigilância Sanitária/ COPROM/ SESA e Coordenação de Segurança do Paciente e Controle de IRAS. Coordenadora de Gestão Estratégica – ISGH		P					
							P(a)			0.50		0.50
							A			0.50		0.50



RF - Contribution



RF - Alignment



RF - Strategic Alignment



RF - Strategic Alignment during Execution



SI - Sector Indicator



CI - Country Indicator



PG - Pro-Gender



PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Expansion de los servicios especializados de salud.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Hospital Regional Construido	Hospital	P		1.00	P		51,599,800.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)		62,531,000.00
		A		2.00	A		62,006,000.00
Policlinicas con atencion especializado construidas	Policlinicas	P		9.00	P		30,491,000.00
		P(a)		9.00	P(a)		31,091,000.00
		A		9.00	A		31,246,048.17
Centros de Especialidades Odontologicos (CEOs) construidos	Centros	P		11.00	P		6,961,000.00
		P(a)		11.00	P(a)		8,150,000.00
		A		11.00	A		8,150,000.00
Lotes de equipamientos e instrumental quirurgico y mobiliario para CEOS comprados y en funcionamiento	Lotes	P		25.00	P		7,393,000.00
		P(a)		25.00	P(a)		2,780,449.50
		A		25.00	A		2,780,449.50
Lotes de equipamientos e instrumental quirurgico para el Hospital Zona Norte comprados y en funcionamiento.	Lotes	P		98.00	P		12,500,000.00
		P(a)		98.00	P(a)		20,452,000.00
		A		98.00	A		27,148,740.30
Lote de equipamento médico-hospitalar Hospital Sertão Central	lote	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	1,519,495.00	1,519,495.00
		A	1.00	1.00	A		0.00
Fortalecimiento institucional da gestão da SESA e dos serviços de saúde.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Gestores de la Secretaria de Estado de Salud (SESA) y de las unidades de salud capacitados.	gestores	P		300.00	P		777,000.00
		P(a)		310.00	P(a)		1,932,000.89
		A		310.00	A		592,512.19
Unidades de salud con sistema de gestion integrada establecido.	unidades de salud	P		21.00	P		4,965,767.27
		P(a)	1.00	29.00	P(a)	142,006.11	3,294,906.19
		A		28.00	A		3,152,900.08
Nucleo de seguimiento de la calidad y supervisión de las nuevas unidades de salud establecido.	nucleo	P		1.00	P		483,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Unidades de salud acreditadas o certificadas.	unidades de salud	P		13.00	P		3,511,000.00
		P(a)	9.00	9.00	P(a)	240,130.00	500,000.00
		A	8.00	8.00	A		259,870.00
Administracion del Programa.							

Other Cost		2016	Cost
Administración y Auditoria del Programa.	P		\$4,789,032.73
	P(a)	\$36,830.57	\$2,533,995.32
	A		\$2,497,164.75
Total Cost		2016	Total Cost
	P		\$123,470,600.00
	P(a)	\$1,938,461.68	\$139,772,146.67
	A		\$137,833,684.99

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
