



Operation Number: **HO-L1031**  
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**  
Last Update: **10/26/2015**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/27/2015**  
Division Chief validation date: **10/30/2015**  
Country Representative validation date: **11/05/2015**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Disaster Risk Prevention and Mitigation Project	Loan Number:	2152/BL-HO
Executing Agency (EA):	COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS		
Team Leader:	Milewski,Joseph Christofer	Sector/Subsector:	INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HONDURAS
Borrower:	REPUBLICA DE HONDURAS	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HO-L1031	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HO-L1031	\$19,000,000.00	\$15,734,363.25	82.81%	\$3,265,636.75


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

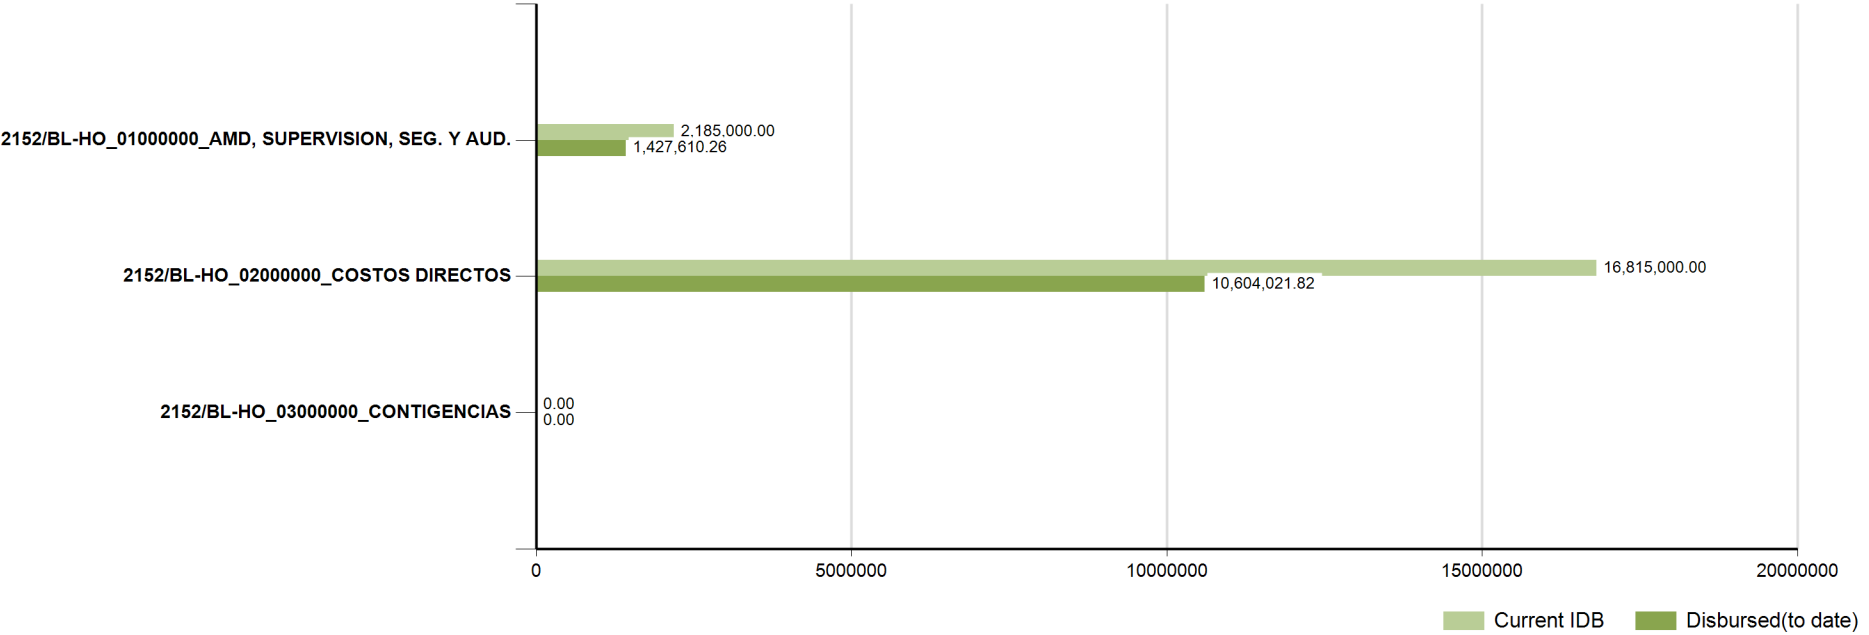

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Gestión de riesgos a nivel nacional mejorada.										
Observation:	El IGR-N para Honduras fue calculado en el 2010 en el marco de la cooperación técnica "Apoyo para la preparación de un programa de gestión integral de los riesgos a desastres en Honduras", ATN/MD-11068-HO.										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2013	2015	2016	EOP
1.1 Indice de Gestión de Riesgo Nacional (IGR-N).		IGR-N	34.32	2010	Medición inicial efectuada en el ámbito de la Cooperación Técnica ATN/MD-11068-HO. Medición de las metas en las evaluaciones de medio término y final.		P	34.32		40.00	40.00
							P(a)	34.32		40.00	40.00
							A	34.32		0.00	
1.2 Indice de Gestión de Riesgo Municipal (IGR-m).		IGR-m	0.00	2012	- Evaluación Intermedia y Final del Programa	El índice será calculado en 2013 cuando finalice el proceso de caracterización y diagnóstico de los 20 municipios intervenidos por el Programa, la meta también será analizada.	P				
							P(a)		15.00	34.00	34.00
							A		0.00		

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Gestión de Riesgos mejorada en los municipios intervenidos por el Programa.										
Observation:	El IGR-m en los municipios a ser intervenidos por el proyecto será calculado en el marco de la preparación de los planes de prevención y mitigación de desastres.										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2015	2016	EOP	
1.1 Gestión Integral del Riesgo incorporada en los Planes de Desarrollo Municipal de los Municipios Intervenidos.		municipios	0.00	2011	- Informes Semestrales del Proyecto.  - Evaluación Intermedia y Final del Proyecto.		P				
							P(a)	3.00	10.00	10.00	10.00
							A		10.00		

1.2 Ordenanzas municipales en respuesta al Plan de Gestión de Riesgos aprobadas e implementadas.		ordenanzas municipales	0.00	2011	Informes semestrales de avance. Evaluación intermedia y final del Proyecto.		<b>P</b>				
							<b>P(a)</b>	5.00	10.00	10.00	10.00
							<b>A</b>		1.00		
1.3 Gestión Integral del Riesgo incorporada en los Planes Estratégicos de Sectores Gubernamentales.		sectores	0.00	2011	Informes semestrales de avance. Evaluación intermedia y final del Proyecto.		<b>P</b>				
							<b>P(a)</b>		2.00	2.00	2.00
							<b>A</b>		3.00		
1.4 Gestión Integral del Riesgo incorporada a la Curricula Educativa Nacional		curricula	0.00	2011	Informes semestrales de avance. Evaluación intermedia y final del Proyecto.		<b>P</b>				
							<b>P(a)</b>		1.00	1.00	1.00
							<b>A</b>		9.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Prevención y mitigación a nivel municipal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Producto 1.1: Obras estructurales de mitigación de riesgo construidas.	obras	P	15.00	45.00	P	3,039,480.01	9,000,000.00
		P(a)	8.00	45.00	P(a)	978,666.77	11,199,120.32
		A	4.00	34.00	A	693,695.06	9,922,445.92
Producto 1.2: Obras no estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas	obras	P	5.00	10.00	P	0.00	150,000.00
		P(a)	5.00	10.00	P(a)	0.00	0.00
		A	5.00	10.00	A	0.00	0.00
Producto 1.3: Planes de gestión de riesgo a nivel municipal formulados.	Governments	P	0.00	20.00	P	0.00	1,640,000.00
		P(a)	0.00	20.00	P(a)	109,196.85	1,655,221.88
		A	0.00	20.00	A	109,196.85	1,655,221.88
Producto 1.4: Sistema Integral de Gestión del Riesgos SIGRET/CAPRA finalizado.	sistema	P		1.00	P		367,900.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	20,000.00	337,468.45
		A	0.00	0.00	A	19,926.53	57,394.98
Fortalecimiento de la capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel comunitario y municipal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Producto 2.1: Medidas de gestión integral de riesgos a desastres a nivel municipal implementadas	Municipios	P	4.00	10.00	P	213,840.00	712,800.00
		P(a)	5.00	10.00	P(a)	174,634.11	710,435.35
		A	6.00	11.00	A	30,444.41	566,245.65
Producto 2.2: Medidas prioritarias de gestión de riesgos a desastres a nivel comunitario implementadas	Comunidades	P	4.00	10.00	P	836,160.00	2,787,200.00
		P(a)	10.00	10.00	P(a)	1,231,541.55	1,707,173.07
		A	2.00	2.00	A	458,615.67	934,247.19
Fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Producto 3.1: Plan estratégico nacional para la gestión integral de riesgos de desastres elaborado	Plan	P	1.00	1.00	P	80,000.00	100,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	31,406.90
		A	0.00	1.00	A	0.00	31,406.90
Producto 3.2: Gestión integral de riesgos de desastres incorporada a los planes estratégicos sectoriales	Plan	P	1.00	2.00	P	195,000.00	390,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	27,000.00	28,044.67
		A	0.00	3.00	A	0.00	1,044.67
Producto 3.3: Plan de fortalecimiento Institucional de Comisión Permante de Contingencia (COPECO) Implementado	Plan	P	0.00	1.00	P	232,500.00	930,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	229,783.50	519,312.69
		A	0.00	0.00	A	51,874.56	341,403.75
Educación e información para la gestión del riesgo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Producto 4.1: Estrategia de socialización de información de riesgo desarrollada	estrategia	P	1.00	1.00	P	0.00	250,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	175,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Producto 4.2: Currícula relacionada a la gestión integral de riesgos de desastres implementada en escuelas primarias y secundarias de los Municipios Intervenidos.	Municipios	P	5.00	20.00	P	120,000.00	300,000.00
		P(a)	0.00	20.00	P(a)	41,500.00	43,999.63
		A	0.00	20.00	A	23,841.03	26,340.66
Producto 4.3: Currícula de gestión integral de riesgos de desastres incorporada a carreras universitarias	Carreras universitarias	P	3.00	5.00	P	231,000.00	330,000.00
		P(a)	2.00	5.00	P(a)	125,000.00	141,191.03
		A	6.00	9.00	A	4,833.25	21,024.28

Producto 4.4: Funcionarios municipales capacitados sobre la nueva reglamentación y normas técnicas de contrucción impartida.	Funcionarios	P	100.00	200.00	P	0.00	0.00
		P(a)	0.00	200.00	P(a)	0.00	20,000.00
		A	0.00	50.00	A	0.00	0.00
Administración del Programa							
Monitoreo y Evaluación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Estudio de Evaluación Intermedia del Programa Realizada	Estudio	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	35,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	35,000.00
Estudio de Evaluación Final del Programa Realizada	estudio	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	45,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Contingencias							

Other Cost		2015	Cost
Unidad Coordinadora	P	\$271,700.00	\$1,358,500.00
	P(a)	\$305,245.90	\$1,695,867.13
	A	\$150,274.84	\$1,540,896.07
Auditoría Financiera Externa	P	\$55,000.00	\$250,000.00
	P(a)	\$50,000.00	\$150,758.88
	A	\$23,181.23	\$123,940.11
Contingencias e Imprevistos	P	\$505,000.00	\$505,000.00
	P(a)	\$0.00	\$505,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$5,779,680.01	\$19,071,400.00
	P(a)	\$3,292,568.68	\$17,273,314.75
	A	\$1,565,883.43	\$15,256,612.06

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
