



Operation Number: **EC-L1094**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/4/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/12/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Public Administration Institutional Reform Program	Loan Number:	2653/OC-EC
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		
Team Leader:	Garcia Mejia,Mauricio	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1094	\$250,000,000.00	\$250,000,000.00	\$1,456,080.00		\$251,456,080.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1094	\$250,000,000.00	\$247,321,002.73	98.93%	\$2,678,997.27


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

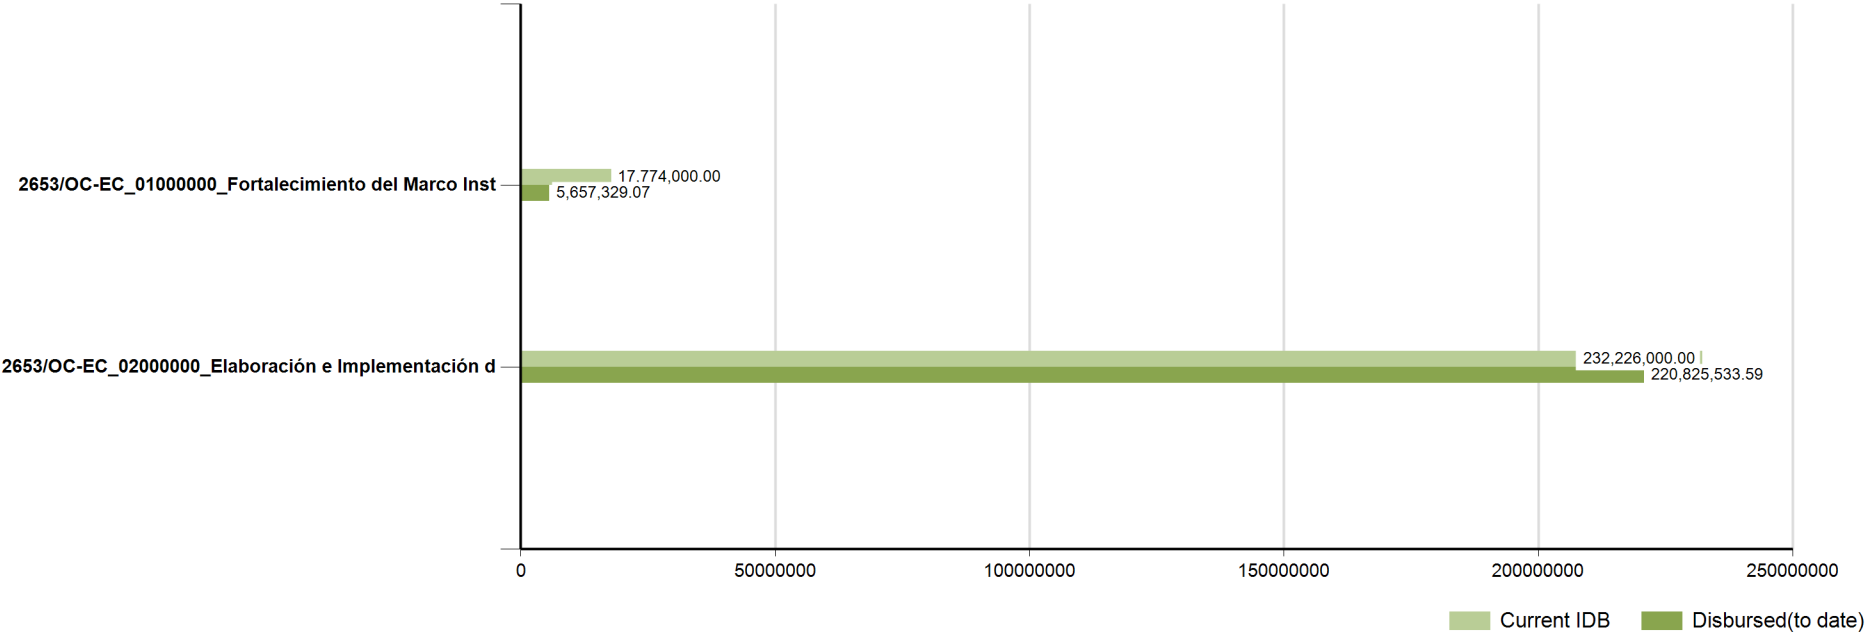

Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Indice de coherencia del Servicio Civil		Indice	0.13	2011	Consultoría especializada que aplicará el Marco Analítico para el diagnóstico institucional de Sistemas de Servicio Civil (Longo).		P	0.30
							P(a)	0.30
							A	0.13
2.2 Capacidad funcional del Servicio Civil		Indice	0.28	2011	Consultoría especializada que aplicará el Marco Analítico para el Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil (Longo)	Se revisará la Línea Base y metas establecidas	P	0.45
							P(a)	0.45
							A	0.28
2.3 Mérito del Servicio Civil		Indice	0.33	2011	Consultoría especializada que aplicará el Marco Analítico para el Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil (Longo)	Se revisará la Línea Base y metas establecidas	P	0.55
							P(a)	0.55
							A	0.33

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
1 Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo	P		1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
5 Personal del Secretariado del Comité y de la Función Ejecutiva capacitado	Funcionarios	P		76.00	P		101,000.00
		P(a)	20.00	1,230.00	P(a)	99,500.00	516,317.70
		A	0.00	1,210.00	A	0.00	416,817.70
2 Sistemas de Planificación, Inversión Publica y Presupuestos Interoperados	Sistema	P		2.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	0.00
3 Automatizacion del proceso integral de reestructura implementada (Sistema Integrado de Modelo de Reestructuración de la Gestión Publica Institucional)	Proceso automatizado	P		1.00	P		918,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
7 Sistema de información de la Gestión del Talento Humano (TH) implementado	Sistema	P		1.00	P		3,823,196.00
		P(a)	0.00	97,520.93	P(a)	44,400.00	97,520.93
		A	0.00	0.00	A	38,400.00	91,520.93
9 Plan de mitigación social implementado	Plan	P		1.00	P		2,500,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
11 Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios	P	1.00	2.00	P	150,000.00	300,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	228,800.00	301,940.00
		A	0.00	1.00	A	17,800.00	90,940.00
8 Subsistema de Remuneración Variable de la Función Ejecutiva implementado	Subsistema	P		1.00	P		1,126,804.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,126,804.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	1,126,804.00
6 Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional	Proyectos	P		13.00	P		8,650,000.00
		P(a)	6.00	19.00	P(a)	5,740,110.26	9,429,981.31
		A	3.00	16.00	A	772,370.32	4,462,241.37
4 Herramientas Complementarias de la Norma Técnica del Modelo R difundidas.	Herramientas	P		2.00	P		355,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	101,000.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	101,000.00
10 Norma Técnica del Art. 130 de la LOSEP elaborada	Norma	P		1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Personal del Comité de Reforma Institucional capacitado en planificación estratégica	personal	P			P		
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Normas legales referentes a reforma del estado y mecanismos institucionales para su implementación simplificadas	normas	P			P		
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Estudio para el Fortalecimiento del Instituto de la Meritocracia elaborado	estudio	P			P		
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP		2016	EOP	

13 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Educación implementado.	PIRIs	P	1.00	1.00	P	1,409,997.00	199,081,988.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	7,844,702.71	221,809,799.07
		A	0.00	0.00	A	11,583.56	213,976,679.92
12 PIRIs aprobados por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional.	PIRIs	P		11.00	P		5,909,920.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	4,066,391.25	4,349,247.77
		A	0.00	5.00	A	7,000.00	289,856.52
14 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Salud implementado.	PIRIs	P	1.00	1.00	P	1,683,975.00	116,756,141.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	108,020,241.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	108,020,241.00
15 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Justicia implementado.	PIRIs	P		1.00	P		33,138,892.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	28,770,943.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	28,770,943.00
16 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Finanzas implementado.	PIRIs	P		1.00	P		2,362,061.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	907,526.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	907,526.00
17 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio del Interior implementado.	PIRIs	P	1.00	1.00	P	1,455,983.00	31,488,527.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	890,620.00	26,555,214.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	25,664,594.00
18 Plan de inversión de reforma institucional (PIRI) del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables implementado	PIRI implementado	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
19 Plan de inversión de reforma institucional (PIRI) de la Agencia de Regulación y Control Minero implementado	PIRI implementado	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	174,000.00	174,000.00
		A	0.00	0.00	A	43,500.00	43,500.00
20 Plan de inversión de reforma institucional (PIRI) de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos implementado	PIRI implementado	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	396,092.41	P(a)	396,091.41	396,091.41
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
21 Plan de inversión de reforma institucional (PIRI) del Ministerio de Trabajo implementado	PIRI implementado	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	1,665,873.70	1,665,873.70
		A	0.00	0.00	A	167,300.00	167,300.00
22 Plan de inversión de reforma institucional (PIRI) de la Agencia de Regulación y Control Sanitario implementado	PIRI implementado	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	2,339,715.00	2,339,715.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración del Proyecto							

Other Cost		2016	Cost
Equipo de Gestión	P	\$168,006.00	\$1,103,535.00
	P(a)	\$330,750.98	\$1,097,516.00
	A	\$78,840.00	\$845,605.02
Auditorías Concurrentes	P	\$55,000.00	\$332,000.00
	P(a)	\$22,740.00	\$198,275.00
	A	\$13,640.00	\$189,175.00
Evaluación Ex post	P	\$150,000.00	\$150,000.00
	P(a)	\$15,000.00	\$15,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$5,072,961.00	\$408,097,064.00
	P(a)	\$23,858,695.31	\$407,873,005.89
	A	\$1,150,433.88	\$385,164,744.46

Changes to the Matrix

No information related to this operation.
