



Operation Number: **PR-L1001**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**  
Last Update: **3/14/2016**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/07/2016**  
Division Chief validation date: **04/14/2016**  
Country Representative validation date: **04/18/2016**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Modernization of Agricultural Support Management	Loan Number:	1800/OC-PR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA		
Team Leader:	Garcia Negro,Alvaro	Sector/Subsector:	AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Fully Disbursed
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PARAGUAY
Borrower:	REPUBLICA DE PARAGUAY	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PR-L1001	\$31,500,000.00	\$31,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PR-L1001	\$31,500,000.00	\$31,500,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

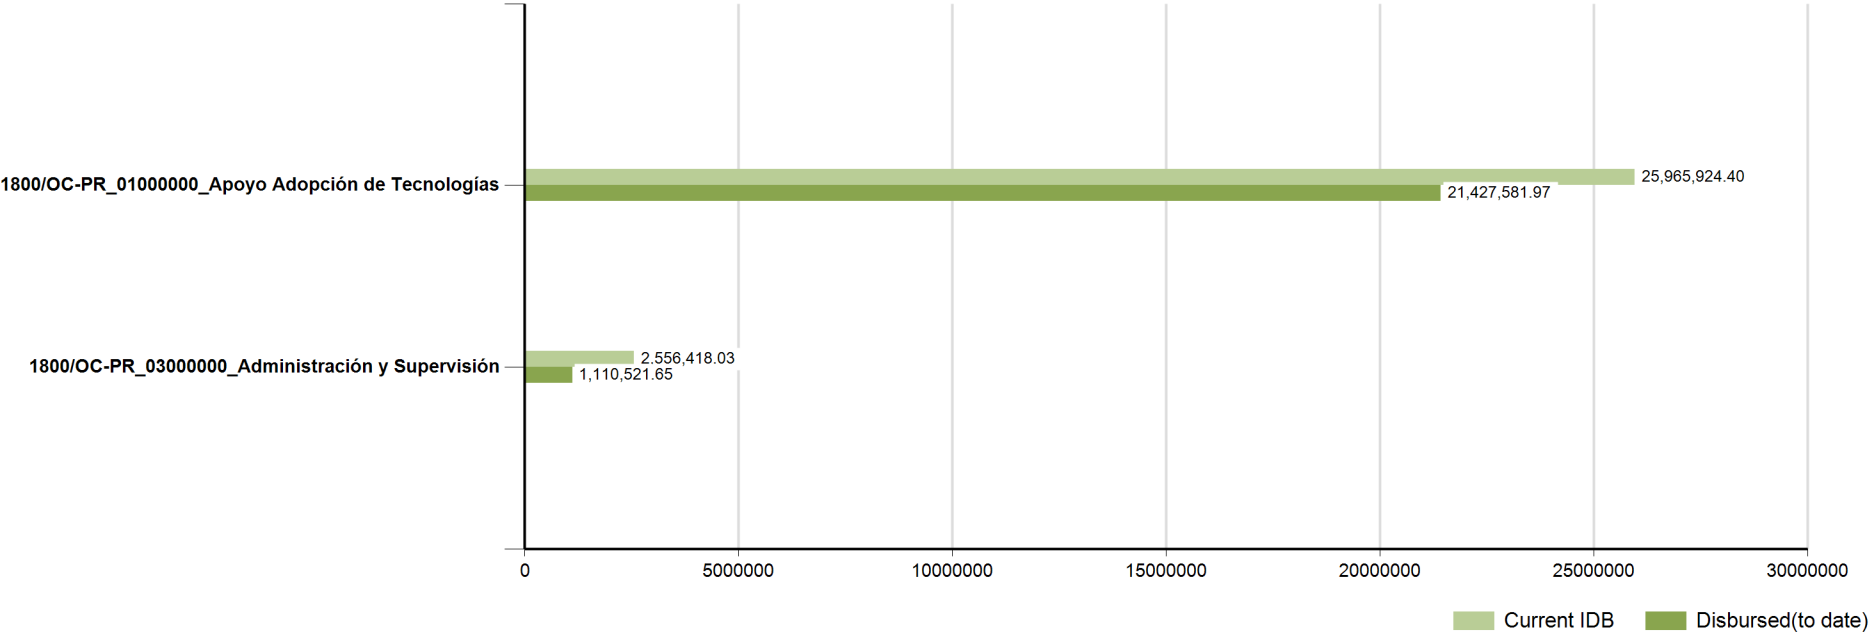

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios incrementado							
Observation:	Las tecnologías adoptadas se suponen que tiene rentabilidad positiva y son ambientalmente adecuadas.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	EOP
1.1 Beneficiarios del programa con mayor ingreso que productores no beneficiarios.						El indicador busca medir la mejora de la población asistida versus la población objetivo. Para eso se debe establecer la linea de base para la población objetivo (ya se hizo) y una vez realizada la inscripción de beneficiarios fijar la linea de base para	P	0.00
							P(a)	0.00
							A	0.00
		US\$/ha	0.00	2010	Consultoria de linea de base, encuesta de cierre y Sistema de Seguimiento del Programa			

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios mejorado.
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP
1.1 Beneficiarios del Tramo 1 y Tramo 2 con tasa interna de retorno superior al 12%			Productores	0.00	2011	Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa	El atraso en el inicio en las actividades hace que se prevea el cumplimiento de la meta en el año 2015 y no a la fecha prevista por contrato de último desembolso en 2013. El indicado r refiere al 80% de los beneficiarios de las 2 primeras campañas agrícolas	P				3,900.00	3,900.00
							P(a)				3,900.00	3,900.00	
							A				3,558.00		
Outcome:	2 Política de Apoyos Agropecuarios más efectiva												
Observation:	El Programa a través de este indicador prohíbe la práctica de entrega de semillas e insumos, algo que habitualmente realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus entes descentralizados. La no entrega de ello se puede considerar un resultado del P												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	<div>20112012201320142015EOP</div>						
2.1 Monto del financiamiento aplicado a adquisición de semillas e insumos, o a compensación de precios (con excepción de los incluido en los paquetes tecnológicos del Programa)		USD	0.00	2011	Presupuesto del MAG y sistema de contabilidad del Programa	El MAG tuvo durante años una política de entrega de semillas e insumos a los campesinos. Mediante la nueva política se busca modificar esa manera de apoyos, enfocándolos a la incorporación de tecnologías.	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							A	0.00	0.00			0.00	

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Apoyos financieros a productores para que adopten tecnologías seleccionadas por el Programa.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Productores beneficiarios que adoptaron y utilizan una de las tecnologías del menú de opciones tecnológicas del Programa.	Agricultores	P	3,475.00	16,700.00	P		
		P(a)	3,475.00	17,375.00	P(a)		
		A	8,341.00	22,241.00	A		
Apoyos en efectivo a Agricultores Familiares que habían recibido en campañas previas al 2006 apoyos del MAG en insumos.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Beneficiarios asistidos con apoyos en efectivo del Registro de Agricultores Familiares (AF)	Agricultores	P		83,000.00	P		
		P(a)		78,000.00	P(a)		
		A		83,000.00	A		
Total Cost					2015		Total Cost
				P			
				P(a)			
				A			

## Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Beneficiarios del Tramo 1 y Tramo 2 con tasa interna de retorno superior al 12%	Modify Indicator name	En realidad no se hizo un cambio en la matriz, sino que simplemente se mejoró la redacción del Resultado para especificar que se trata únicamente de los Tramos 1 y 2.	3/11/2016	3/14/2016
Output	Beneficiarios asistidos con apoyos en efectivo del Registro de Agricultores Familiares (AF)	Modify Physical P(a) value	No se efectuaron cambios en los valores de la línea P(a) del producto en cuestión. La única modificación fue realizada en el Producto "Productores Beneficiarios que adoptaron o utilizan una tecnología del Menú de Opciones Tecnológicas del Programa". En dicho Producto solo se reportó, en la línea A del 2015, la cantidad efectiva de productores que recibieron apoyo al 31 de diciembre de 2015.	3/10/2016	3/10/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
