



Operation Number: **PR-L1001**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/13/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/14/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Modernization of Agricultural Support Management	Loan Number:	1800/OC-PR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA		
Team Leader:	Garcia Negro,Alvaro	Sector/Subsector:	AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Fully Disbursed
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PARAGUAY
Borrower:	REPUBLICA DE PARAGUAY	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PR-L1001	\$31,500,000.00	\$31,500,000.00	\$3,500,000.00		\$35,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PR-L1001	\$31,500,000.00	\$31,500,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

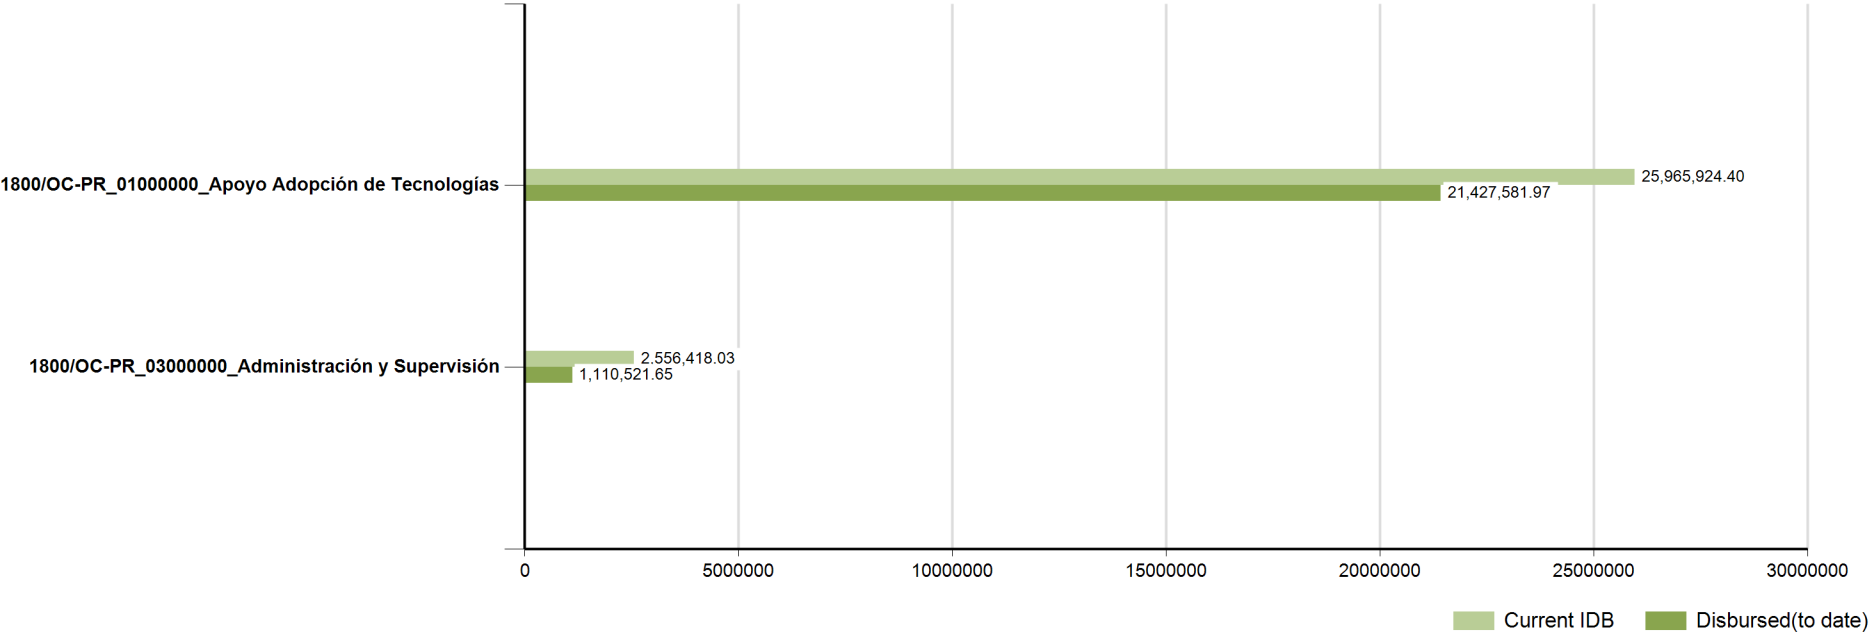

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios incrementado							
Observation:	Las tecnologías adoptadas se suponen que tiene rentabilidad positiva y son ambientalmente adecuadas.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	EOP
1.1 Beneficiarios del programa con mayor ingreso que productores no beneficiarios.						El indicador busca medir la mejora de la población asistida versus la población objetivo. Para eso se debe establecer la línea de base para la población objetivo (ya se hizo) y una vez realizada la inscripción de beneficiarios fijar la línea de base para	P	0.00
							P(a)	0.00
							A	0.00
		US\$/ha	0.00	2010	Consultoria de línea de base, encuesta de cierre y Sistema de Seguimiento del Programa			

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios mejorado.
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
1.1 Beneficiarios del Tramo 1 y Tramo 2 con tasa interna de retorno superior al 12%			Productores	0.00	2011	Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa	El atraso en el inicio en las actividades hace que se prevea el cumplimiento de la meta en el año 2015 y no a la fecha prevista por contrato de último desembolso en 2013. El indicado r refiere al 80% de los beneficiarios de las 2 primeras campañas agrícolas	P					3,900.00		3,900.00
							P(a)					3,900.00		3,900.00	
							A					3,558.00			
Outcome:	2 Política de Apoyos Agropecuarios más efectiva														
Observation:	El Programa a través de este indicador prohíbe la práctica de entrega de semillas e insumos, algo que habitualmente realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus entes descentralizados. La no entrega de ello se puede considerar un resultado del P														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
2.1 Monto del financiamiento aplicado a adquisición de semillas e insumos, o a compensación de precios (con excepción de los incluido en los paquetes tecnológicos del Programa)		USD	0.00	2011	Presupuesto del MAG y sistema de contabilidad del Programa	El MAG tuvo durante años una política de entrega de semillas e insumos a los campesinos. Mediante la nueva política se busca modificar esa manera de apoyos, enfocándolos a la incorporación de tecnologías.	P	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
							A	0.00	0.00		0.00		

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Apoyos financieros a productores para que adopten tecnologías seleccionadas por el Programa.		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Productores beneficiarios que adoptaron y utilizan una de las tecnologías del menú de opciones tecnológicas del Programa.	Farmers (#)	P	16,700.00	P	
		P(a)	17,375.00	P(a)	
		A	22,241.00	A	
Apoyos en efectivo a Agricultores Familiares que habían recibido en campañas previas al 2006 apoyos del MAG en insumos.		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Beneficiarios asistidos con apoyos en efectivo del Registro de Agricultores Familiares (AF)	Farmers (#)	P	83,000.00	P	
		P(a)	78,000.00	P(a)	
		A	83,000.00	A	
Total Cost					Total
				P	
				P(a)	
				A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
