




Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

######

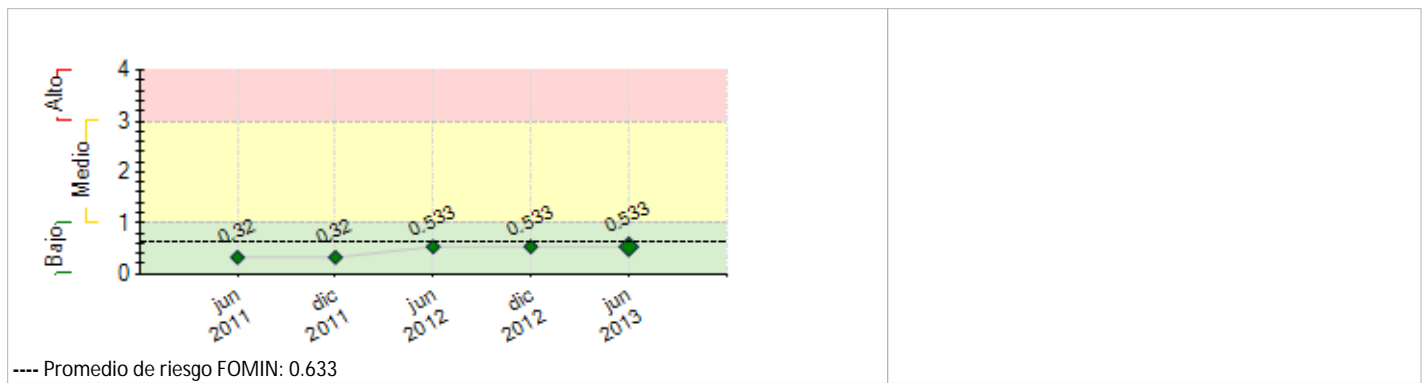

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se han alcanzado alianzas estratégicas sostenibles.

Continúan con las reuniones de concejo consultivo.

Finalizó el curso para formadores desarrollado en la localidad de Chascomus, comprendió dos encuentros presenciales en septiembre y noviembre del 2011 y el trabajo en el entorno virtual, participaron 27 profesionales.
 En San Martín y Rosario el conocimiento del territorio y de las alianzas establecidas permitieron dar cumplimiento con los objetivos al punto de estar elaborando los proyectos a seleccionarse para la implementación. Los coordinadores ofician de tutores para el desarrollo de proyectos para cada uno de los cursos, San Martín y Rosario. San Martín cuenta con 5 proyectos y Rosario con 6.
 Se han desarrollado las curriculas de formación del curso Formador de Formadores y Curso de Desarrollo Territorial Sustentable.
 Se realizó cursos de sensibilización en Rosario, Salta, San Martín, un taller con facilitadores y funcionarios de San Juan y un taller de sensibilización del ministerio industria.
 Se finalizó con el curso de Articulación del Desarrollo Territorial (DT) que se dicta en Córdoba y se continúa el ciclo de encuentros en el Senado.
 Los participantes del Curso de Articulación del Desarrollo Territorial (DT) comenzaron a trabajar en la formulación de proyectos.
 Se continúa con la difusión a través de las páginas web del Programa.
 Web observatorio figura la información, actividades y reporte observatorio.conectadel.org/

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto se está desempeñando en forma satisfactoria y se entiende que cumplirá con los objetivos del proyecto. Ha habido avances en todos los componentes del programa.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se han alcanzado alianzas estratégicas sostenibles.

Se continúan con las reuniones de concejo consultivo.

Continúan las tareas de animación de la plataforma virtual y la publicación de contenidos.

Se comenzó con el proceso de virtualizar el primer prototipo de cuadernillo de apoyo a la formación con temática 'DEL' y la Guía de Aprendizajes BID- FOMIN.

Se encuentra en etapa final los productos derivados del curso Formador de Formadores.

Se inició el curso a operadores territoriales en la provincia de San Juan.

Se continua con la difusión de resultados y actividades del Programa a través de las páginas web del Programa. (<http://argentina.conectadel.org/>)

En el mes de mayo inició la Diplomatura en Desarrollo Territorial Sustentable en San Juan, la cual consta de 10 (diez) módulos de cursada quincenal de 7 (siete) horas, finalizando con la presentación de un proyecto de intervención territorial.

Se participó en el desarrollo del taller de Investigación Acción apoyando a la Unidad de Coordinación en la logística, atención de los participantes, normal funcionamiento de las jornadas de trabajo entre otros.

Se finalizó con el curso de Articulación del Desarrollo Territorial (DT) que se dicta en Córdoba y se continua desarrollando el ciclo de encuentros en el Honorable Senado de la Nación. Córdoba comenzó con la formulación de los proyectos.

El consultor Sergio Perez Rozzi realiza las actividades referidas a la gestión del Observatorio.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se cumplió con gran parte del plan operativo semestral y el resto se ha reprogramado.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Formar cuadros técnicos y tomadores de decisiones de políticas, en diferentes regiones y localidades de los países beneficiarios, para que mejoren sus capacidades de diseño, puesta en marcha y gestión de iniciativas de promoción productiva y empleo, aplicando un enfoque de desarrollo económico local y trabajo decente.	P.11 Se habrá desarrollado un currículum para formación en Desarrollo Local y empleo adaptable a las características de cada territorio donde se ofrezca.					Dic 2014	No	
	P.12 Número de instituciones que se agregan o fortalecen como oferentes de cursos de capacitación de calidad en Desarrollo Económico Territorial y Empleo.	0				4 Dic 2014	0 Dic 2014	
	P.13 En los territorios beneficiados por el Programa, se habrán incrementado las relaciones público-privadas, i.e.: al menos 2 iniciativas concretas por curso DEL presencial/distancia en cada región/macrorregión, adicionales a los proyectos desarrollados en el Componente 4.					Dic 2014	No Dic 2014	
Componente 1: Construcción de alianzas y promoción del Programa Peso: 8% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número de alianzas estratégicas (convenios) con entidades territoriales o regionales para la realización de las actividades de formación DEL en territorios de Argentina.	0				3 Jun 2011	7 Sep 2011	
	C1.12 Una plataforma Web vinculada al sitio de la ESL en Argentina que facilite la promoción del programa y la difusión de sus resultados, constituyendo de ese modo una comunidad de aprendizaje y prácticas sobre DEL en ALC, fortaleciendo –asimismo– el sitio Web de la ESL en Argentina.	0				1 Jul 2011	1 Jun 2013	
Componente 2: Generación de capacidades y materiales para la formación Peso: 24% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de estudios de caso en DEL desarrollados, a fin de incorporarlos en los procesos de aprendizaje de los cursos.	0				4 Dic 2011	4 Dic 2012	
	C2.12 Currícula de formación en metodología DEL adaptable a Argentina desarrollada con base en estudios de caso					Dic 2011	Si May 2013	
	C2.13 Número de responsables de alto nivel de los gobiernos central (federal), regional (estadual) y municipal, representantes de cámaras empresariales, organizaciones sindicales y entidades del mundo académico y científico sensibilizados y con formación básica en metodologías DEL.	0				125 Ago 2011	400 Jun 2013	
	C2.14 Número de profesionales capacitados como formadores, mediante los cuales se espera multiplicar las actividades de formación DEL en los territorios seleccionados de Argentina.	0				25 Dic 2011	27 Nov 2011	Finalizado
Componente 3: Formación de operadores y decisores de políticas Peso: 26% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Número de profesionales operadores de programas en terreno y diseñadores de políticas DEL capacitados en Argentina.	0	60 Jun 2012			120 Abr 2013	286 Jun 2013	
	C3.12 Número de proyectos de desarrollo económico territorial formulados como trabajos finales por personas o grupos de personas asistentes a dichos cursos de formación.	0	5 Jun 2012			10 Abr 2013	11 Jun 2013	

Componente 4: Selección e implementación de mejores propuestas de proyectos

Peso: 35%

Clasificación: Satisfactorio

C4.I1	Proyectos DEL financiados por la facilidad del Programa.	0				2	0	
						Jun 2013	Dic 2012	

Componente 6: Monitoreo, diseminación de resultados y sostenibilidad

Peso: 7%

Clasificación: Satisfactorio

C6.I1	Número de instituciones en Argentina que conocen los resultados del programa.	0				5		
						Dic 2016	Jun 2013	
C6.I2	Observatorio DEL, cumpliendo las funciones de actualizar y compartir información para la retroalimentación de la Red y el desarrollo de los procesos del Programa, operando.	0				1	1	
						Dic 2011	Jun 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Alianzas entre la ESL y entidades estratégicas en Argentina - Acuerdos con entidades locales que permitan definir las regiones en las que se llevará a cabo la formación.	3	Jun 2011	5	Jun 2011	Logrado tarde
H1 [*] Sistema de monitoreo - Se ha construido la línea de base, el sistema de monitoreo.	1	Jun 2011	5	Jun 2011	Logrado tarde
H2 [*] Conditions Prior	5	Jun 2011	5	Jun 2011	Logrado
H3 [*] Desarrollo de materiales de formación y curricula - Materiales a ser desarrollados según el tipo de beneficiarios y a partir de los estudios de caso de las regiones seleccionadas en Argentina.	1	Dic 2011	1	Mar 2012	Logrado tarde
H4 [*] Formación de al menos 15 formadores en Argentina - Formación de formadores para realizar los cursos a nivel de las regiones que se definan	1	Dic 2011	32	Nov 2011	Logrado
H5 [*] Selección de los beneficiarios - Primer grupo seleccionado- Definición de criterios de selección y aprobación de los postulantes a la formación.	1	Dic 2011	2	Oct 2011	Logrado
H6 [*] Presentación de proyectos finales por al menos 25 personas de los 2 cursos del primer grupo en Argentina - Proyectos resultado de la formación en 2 cursos con al menos 20 participantes en cada uno.	25	Jul 2012	25	Jul 2012	Logrado
H7 [*] Selección de los beneficiarios- Segundo grupo seleccionado- Definición de criterios de selección y aprobación de los postulantes a la formación.	1	Oct 2012	1	Sep 2012	Logrado
H8 Cursos a operadores territoriales y decisores, finalizados (Córdoba, San Juan y Nacional).	3	Dic 2013	0	Jun 2013	
H9 Guía de aprendizajes FOMIN y cuadernillo DEL virtualizados y difundidos regionalmente.	2	Dic 2013	0	Jun 2013	
H10 [*] Taller de difusión de los resultados y lecciones aprendidas realizado en Argentina - Intercambio de experiencias.	1	Jun 2014	0	Jun 2013	
H11 Cursos finalizados en 2013 (Córdoba, San Juan y Nacional) sistematizados.	3	Jun 2014	0	Jun 2013	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. EL PROGRAMA NO ES PRIORITARIO PARA LOS ALIADOS ESTRATEGICOS O SE ENCUENTRAN SOBRECARGADOS DE ACTIVIDADES-	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
2. El programa no es prioritario para los aliados estratégicos o los mismos se encuentran sobrecargados de actividades.	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
3. El programa no es prioritario para los aliados estratégicos o se encuentran sobre cargados de actividades.	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
4. El programa no es prioritario para los aliados estratégicos o se encuentran sobre cargados de actividades.	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
5. EL PROGRAMA NO ES PRIORITARIO PARA LOS ALIADOS ESTRATEGICOS O SE ENCUENTRAN SOBRECARGADOS DE ACTIVIDADES-	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 9 RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 3 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Durante el segundo semestre del 2013, la coordinadora nacional, conjuntamente con la UC y representantes del BID-FOMIN, trabajará en el diseño de los talleres de sostenibilidad del Programa. FONDOS FOMIN y APOORTE LOCAL.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. El diseño de currículas de formación para los cursos deben realizarse teniendo en cuenta el marco social, institucional y político, de esta manera minimizamos el riesgo de no responder a las necesidades del territorio.	Relativa a Risk	Autor Vallarino, María Pia
2. La existencia de coordinadores locales en los territorios prioritarios donde se implementan los cursos de formación, permite el seguimiento permanente del proceso y el dialogo presencial con los participantes y socios locales, dando sostenibilidad a las acciones del programa en el territorio.	Design	Vallarino, María Pia
3. La relación fluida con los socios locales favorece la difusión de las actividades del programa y fortalece los lazos de confianza.	Implementation	Vallarino, María Pia
