
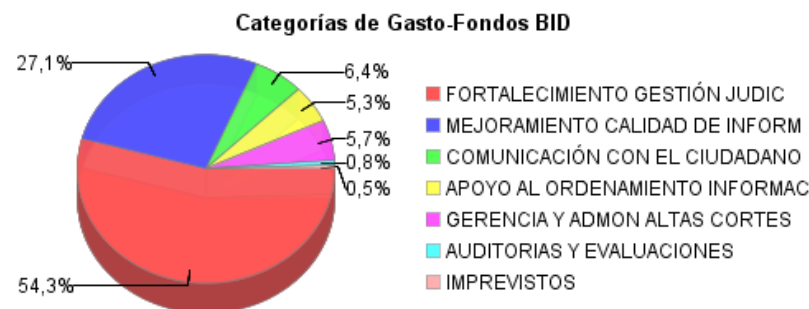
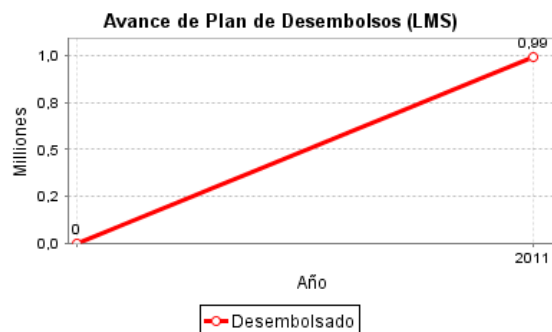



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Número(s) de Préstamo:	2277/OC-CO	Monto Aprobado Actual:	21.382.325,00	BID Original:	21.382.325,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	987.062,70	Actual BID:	21.382.325,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	4,62	Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1374	Saldo:	20.395.262,30	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples			Estimado Original:	21.382.325,00
				Período de Amortización (meses):	168

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Oct 17, 2011 Validado por Representante de País: Oct 24, 2011

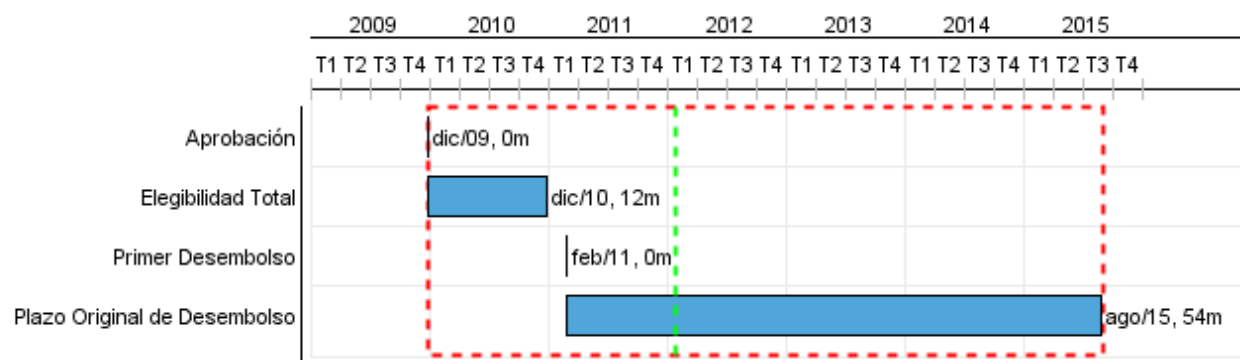

## Progreso Acumulado al 2011

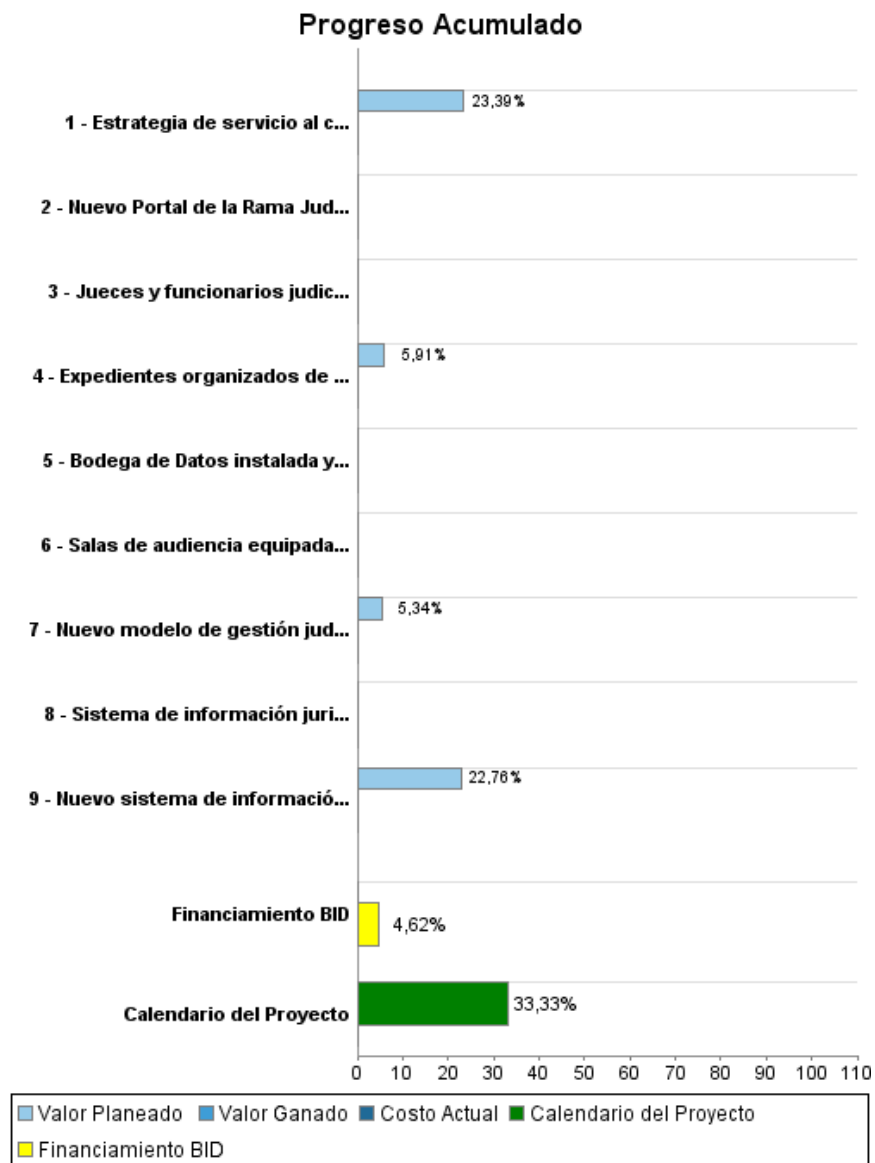

## Resultados

**Resultado:** Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19,00	2007	P A	23,00

**Resultado:** Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8,00	2007	P A	13,00

**Resultado:** Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41,25	2007	P A	44,00

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Fortalecimiento de la Gestión Judicial</b>									
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo				1,00	225.200,00			4.219.000,00
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas				340,00				400.000,00
Salas de audiencia equipadas y funcionando	Salas				18,00				1.060.000,00
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes				38.000,00	300.000,00			5.080.000,00
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Diagnostico								4.219,00
<b>Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.</b>									
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema				1,00				3.502.000,00
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega				1,00				1.860.000,00
<b>Mejoramiento de los servicios al ciudadano</b>									
Estrategia de servicio al ciudadano implementada.	Estrategia				1,00	240.050,00			1.026.300,00
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal				1,00				240.000,00
<b>Apoyo al ordenamiento de la información normativa</b>									
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema				1,00	240.000,00			1.054.500,00
<b>Gerencia y Administración para las Altas Cortes</b>									
<b>Auditorías y evaluaciones</b>									
<b>Imprevistos</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.005.250,00</b>			<b>18.446.019,00</b>
