
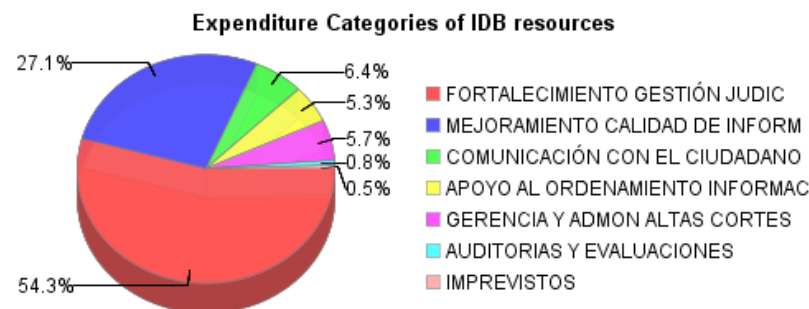
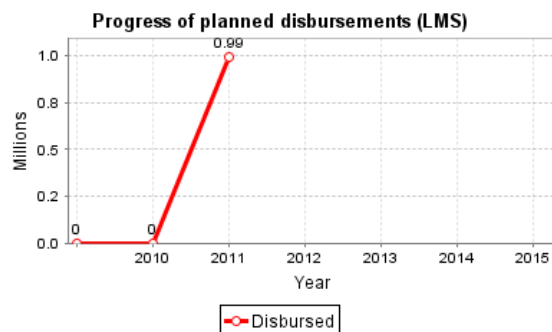



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA			
Sector:					
Loan Number(s):	2277/OC-CO	Current Approved Amount:	21.382.325,00	Original IDB:	21.382.325,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	987.062,70	Current IDB:	21.382.325,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	4,62	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	RG-P1374	Balance:	20.395.262,30	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	21.382.325,00
				Amortization Period (months):	168

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 22-abr-2012 Validated by Country Representative: 23-abr-2012

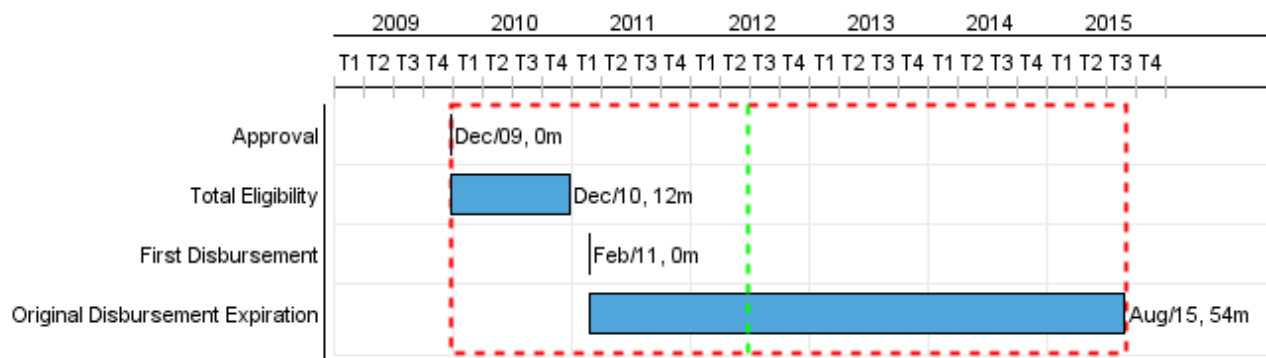

Accumulated Progress as of 2011

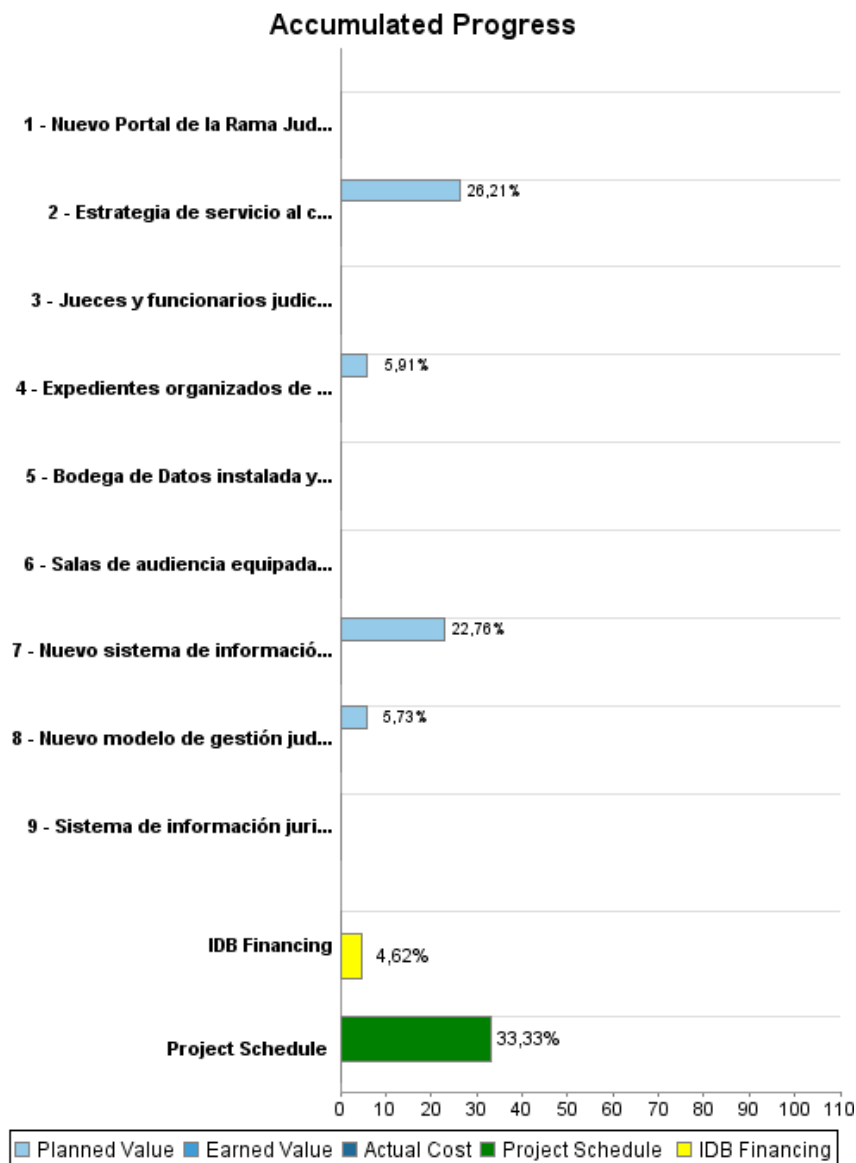

Outcomes

Outcome: Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19.00	2007	P A	23,00

Outcome: Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8.00	2007	P A	13,00

Outcome: Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41.25	2007	P A	44,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento de la Gestión Judicial									
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo				1,00	225.200,00			3.929.000,00
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas				340,00				290.000,00
Salas de audiencia equipadas y en funcionamiento	Salas				18,00				1.460.000,00
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes				38.000,00	300.000,00			5.080.000,00
Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.									
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema				1,00				4.162.000,00
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega				1,00				1.200.000,00
Mejoramiento de los servicios al ciudadano									
Estrategia de servicio al ciudadano implementada.	Estrategia				1,00	240.050,00			916.000,00
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal				1,00				350.300,00
Apoyo al ordenamiento de la información normativa									
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema				1,00	240.000,00			1.054.500,00
Gerencia y Administración para las Altas Cortes									
Auditorías y evaluaciones									
Imprevistos									
TOTAL						1.005.250,00			18.441.800,00
