
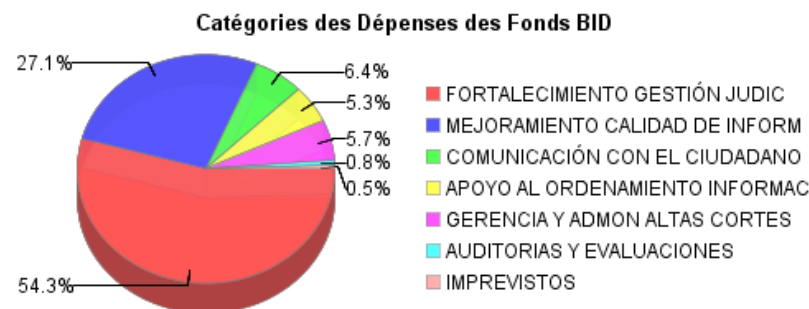
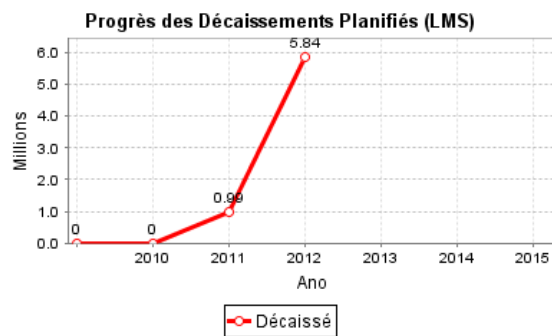



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2277/OC-CO	Montant Courant Approuvé:	21.382.325,00	Initial BID:	21.382.325,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	2.420.535,78	Courant BID:	21.382.325,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	11,32	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1374	Solde:	18.961.789,22	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	21.382.325,00
				Période d'Amortissement (mois):	168

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 26-sep-2012 Validé par le Représentant: 27-sep-2012

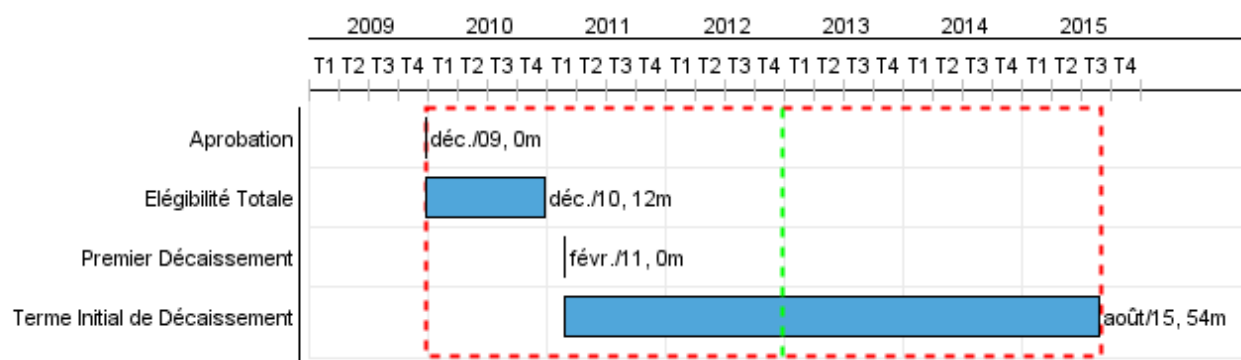

Progrès Cumulé à 2012

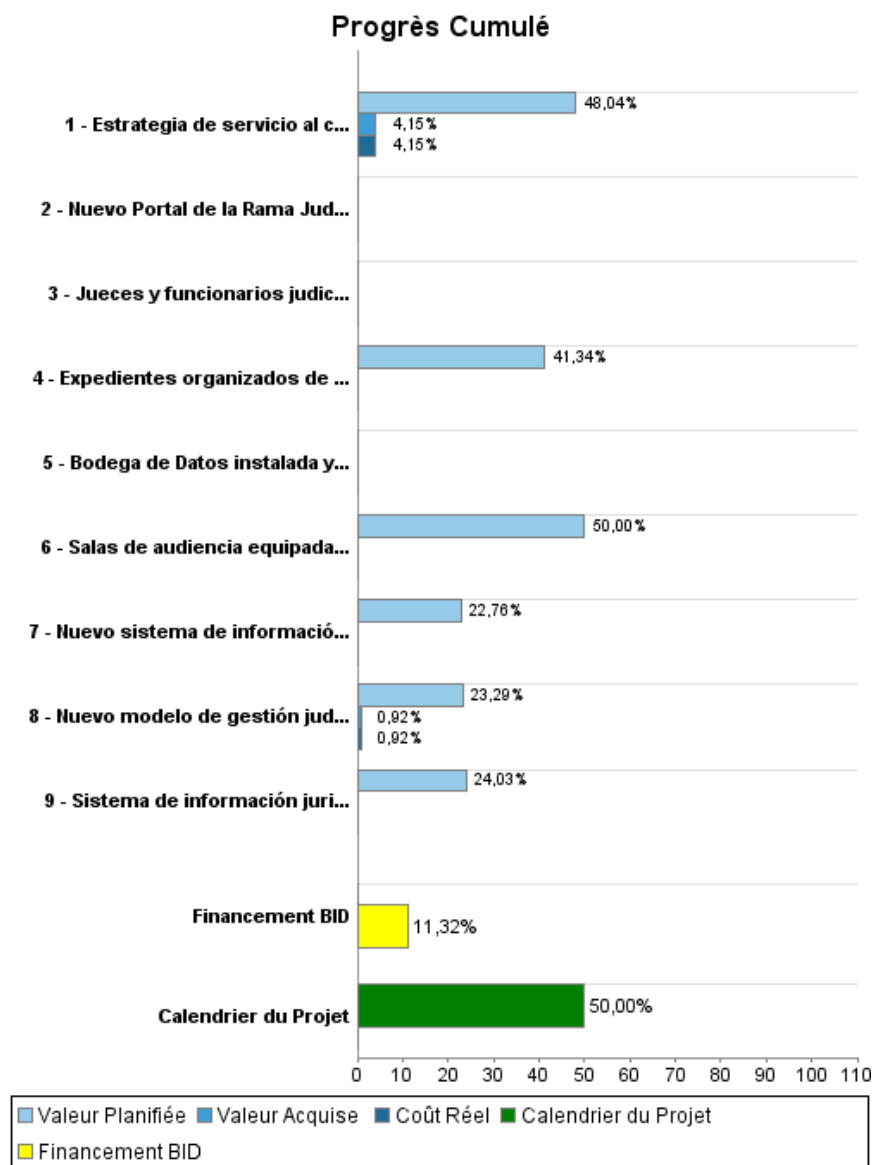

Résultats

Résultat:	Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19.00	2007	P A	23.00

Résultat:	Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8.00	2007	P A	13.00

Résultat:	Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41.25	2007	P A	44.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la Gestion Judicial									
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo				1,00	690.000,00	36.151,17		3.929.000,00
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas				340,00				290.000,00
Salas de audiencia equipadas y en funcionamiento	Salas				18,00	730.000,00			1.460.000,00
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes				38.000,00	1.800.000,00			5.080.000,00
Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.									
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema				1,00	1.000.000,00			4.162.000,00
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega				1,00				1.200.000,00
Mejoramiento de los servicios al ciudadano									
Estrategia de servicio al ciudadano implementada.	Estrategia				1,00	200.000,00	37.992,17		916.000,00
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal				1,00				350.300,00
Apoyo al ordenamiento de la información normativa									
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema				1,00				1.054.500,00
Gerencia y Administración para las Altas Cortes									
Gerencia y Administración para las Altas Cortes	N/A					370.000,00	118.125,32		1.126.000,00
Auditorías y evaluaciones									
Auditorías y evaluaciones	N/A								250.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								1.564.525,00
TOTAL						4.790.000,00	192.268,66		21.382.325,00
