



Operation Number: **NI-L1059**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/26/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/27/2014**
Division Chief validation date: **10/31/2014**
Country Representative validation date: **11/12/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program to accompany the implementation of the National Policy for children in P	Loan Number:	2725/BL-NI
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE LA FAMILIA		
Team Leader:	Helleranta,Meri	Sector/Subsector:	EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	NICARAGUA
Borrower:	REPUBLICA DE NICARAGUA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
NI-L1059	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$28,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
NI-L1059	\$20,000,000.00	\$3,065,514.00	15.33%	\$16,934,486.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

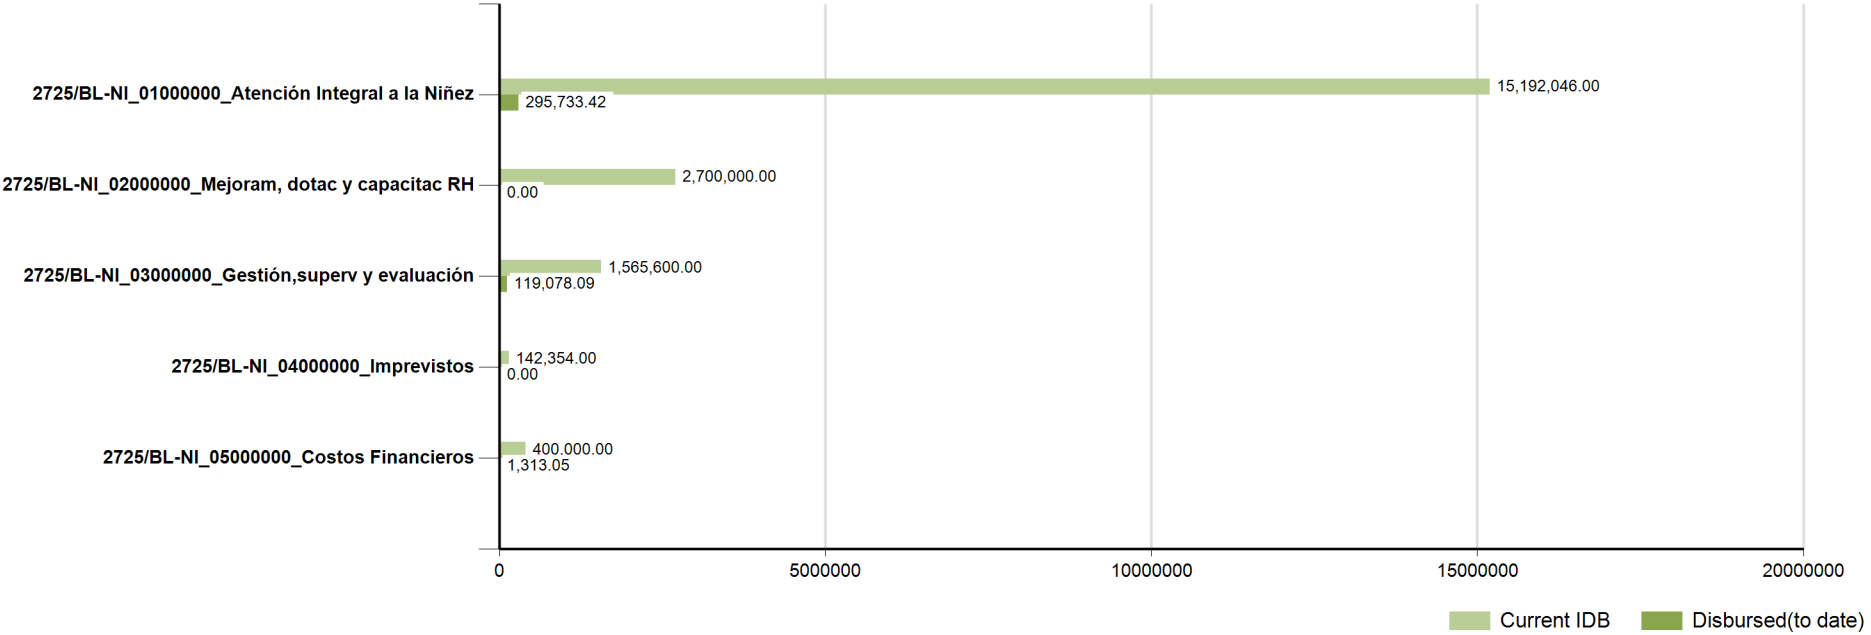

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mejorar el bienestar de los niños y su desarrollo cognitivo y socioemocional, particularmente en poblaciones vulnerables											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
1.1 Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo del lenguaje en comunidades beneficiarias		%	47.40	2013	Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)	Datos de línea base extraídos de la evaluación PAININ III.	P	39.50	39.77			39.77
	P(a)									40.00	40.00	
	A						0.00					
1.2 Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo social/individual en comunidades beneficiarias		%	31.10	2013	Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)	Datos de línea de base extraídos de la evaluación del PAININ III	P	70.90	71.30			71.30
	P(a)									25.00	25.00	
	A						0.00					
1.3 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 23 meses con desnutrición crónica en del area priorizada		%	10.10	2013	Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)	Datos de línea base extraídos de la ENDESA 2006-2007.	P	17.00	15.00			15.00
	P(a)									9.00	9.00	
	A						0.00					
1.4 Porcentaje de niños de 3 a 6 asistiendo el pre-escolar en comunidades beneficiarias.		%	32.00	2013	Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)	Datos de línea de base extraídos de datos administrativos Ministerio de Educación	P	40.00	65.00			65.00
	P(a)							40.00		60.00	60.00	
	A						0.00					
1.4 Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo motor fino en comunidades beneficiarias		%	31.20	2014	Evaluación Externa de Medio Término (18 meses) y final (42 meses)	Datos de línea de base extraídos de datos administrativos del Ministerio de Educación.	P					
	P(a)									25.00	25.00	
	A						0.00					
1.5 Porcentaje de niños de 0 a 6 años registrados en el Registro Civil en las áreas priorizadas.		%	85.00	2013	Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)	Datos de línea de bases extraídos de datos administrativos MIFAN	P	80.00	95.00			95.00
	P(a)									90.00	90.00	
	A						0.00					

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Padres y madres competentes para propiciar una adecuada nutrición, salud, educación, buen trato y participando activamente en la promoción y cumplimiento de los derechos de la primera infancia.
Observation:	Fuentes: Datos de línea base extraídos de Verdisco et al (2009); Registros Programa Amor para los más chiquitos; Sistemas de referencia del MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (Comisarias de la Mujer); Datos de línea base extraídos de Macours et al (2011). Evaluación de medio término y final.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Porcentaje de niños y niñas de 0-3 años que recibieron 12 o más visitas según norma de atención durante el último año		%	0.00	2013	Registro Programa Amor para los más chiquitos		P	60.00			80.00
							P(a)		60.00	80.00	80.00
							A	0.00			
1.2 Porcentaje de niños y niñas de 3-6 años de las áreas prioritizadas matriculados en el preescolar		%	35.00	2013	Registros de alumnos		P	40.00			50.00
							P(a)		40.00	50.00	50.00
							A	0.00			
1.3 Porcentaje de hogares donde por lo menos un miembro acudió a los servicios que están incluidos en el sistema de referencia en los últimos seis meses		%	14.00	2013	Registros de Programa Amor para los más chiquitos y sistemas de referencia del Sistema MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (comisarias de las mujer)		P	30.00			50.00
							P(a)		30.00	50.00	50.00
							A	0.00			
1.4 Porcentaje de los padres quienes mostraron actitudes positivas en hogares con una mujer embarazada o un niño de 0-6 años, en la calidad del ambiente familiar.		%	82.00	2013	Datos serán revalidados con la recolección de línea de base, Evaluación externa y final		P	3.95			3.85
							P(a)				88.00
							A	0.00			
1.4 Porcentaje de respuestas correctas que dieron los padres en la prueba estandarizada sobre competencias parentales incluyendo actitudes y creencias (escala KIDI).		%	79.00	2013	Recolección de Línea de Base, Evaluación Externa y Final.		P				
							P(a)			82.00	82.00
							A	0.00			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1. Atención Integral a la niñez en comunidades prioritizadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Familias con al menos una embarazada y/o menor de seis años con por lo menos una visita anual por el MIFAN-SNBS	Familias	P	48,500.00	66,500.00	P	387,496.00	705,984.00
		P(a)	23,500.00	66,500.00	P(a)	112,284.00	1,371,003.00
		A	12,639.00	12,383.00	A	8,831.00	72,074.00
Niños de 0-3 años atendidos en visita mensual de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Personas	P	20,000.00	40,000.00	P	2,063,740.00	9,530,537.00
		P(a)	15,000.00	40,000.00	P(a)	2,000,000.00	9,608,403.00
		A	14,661.00	22,719.00	A	734,436.00	878,776.00
Niños de 3-6 años con registro de evaluación bimestral de desarrollo y asistencia al preescolar por MINED-SNBS y visista bimestral de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Estudiantes	P	26,000.00	40,000.00	P	645,260.00	1,843,750.00
		P(a)	12,000.00	40,000.00	P(a)	350,000.00	1,655,208.00
		A	19,258.00	17,694.00	A	61,504.00	61,504.00
Niños/as menores de un año con cuarto control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	niños	P	9,500.00	40,000.00	P	51,663.00	134,755.00
		P(a)	4,500.00	13,300.00	P(a)	31,501.80	198,110.00
		A	4,382.00	5,946.00	A	15,608.00	38,708.00
Niños/as de cinco años cumplidos a 6 años por cumplir con segundo control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	niños	P	9,500.00	13,300.00	P	10,135.00	134,755.00
		P(a)	3,000.00	13,300.00	P(a)	30,000.00	198,110.00
		A	1,281.00	3,662.00	A	9,613.00	51,613.00
Niños/a de 1 año cumplido y menor de cinco por cumplir con tercer control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	niños	P	35,532.00	53,400.00	P	180,606.00	502,241.00
		P(a)	13,500.00	53,400.00	P(a)	125,997.30	741,984.96
		A	10,384.00	21,250.00	A	55,781.00	78,881.00
Niños/as de 6 a 24 meses reciben micronutrientes en las áreas prioritizadas.	niños	P	14,301.00	20,000.00	P	251,592.00	653,429.00
		P(a)	5,000.00	20,000.00	P(a)	124,746.30	653,427.70
		A	2,500.00	5,000.00	A	47,514.00	47,514.00
Componente 2. Mejoramiento de las condiciones de atención		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Agentes calificados a cargo de las visitas domiciliarias graduados de proceso de formación para dar dicha atención.	Agentes	P	1,000.00	2,375.00	P	400,000.00	950,000.00
		P(a)	200.00	1,465.00	P(a)	360,000.00	950,000.00
		A	0.00	205.00	A	0.00	0.00
Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados	Espacios Rehabilitados	P	125.00	250.00	P	875,000.00	1,750,000.00
		P(a)	50.00	250.00	P(a)	787,500.00	1,750,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente 3. Gestión, Supervisión y Evaluación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Informes Semestrales de verificación de cobertura entregados	informes	P	2.00	6.00	P	75,000.00	275,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	60,000.00	175,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados.	informes	P	408.00	1,332.00	P	105,570.00	458,767.00
		P(a)	444.00	1,333.00	P(a)	197,911.80	532,749.87
		A	222.00	347.00	A	81,886.00	98,431.00
Usuarios primarios del registro únicos de protagonistas activos en el MIFAN, MINSA y MINED durante el semestre anterior	Personas	P	480.00	480.00	P	81,828.00	250,000.00
		P(a)	40.00	60.00	P(a)	50,400.00	248,667.00
		A	56.00	26.00	A	65,780.00	65,780.00

Informe anuales de la evaluación de desempeños entregados	Informes	P	1.00	3.00	P	50,000.00	350,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	90,000.00	175,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Informe de evaluación de impacto entregados	informes	P		1.00	P		500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	500,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00

Other Cost			2014	Cost
Auditoría	P			
	P(a)		\$67,000.00	\$200,000.00
	A		\$0.00	\$0.00
Costos Financieros	P			
	P(a)		\$36,524.89	\$400,000.00
	A		\$3,088.00	\$4,401.00
Imprevistos	P			
	P(a)			\$142,354.00
	A			\$0.00
Costo de Operación del Programa	P		\$339,500.00	\$1,218,229.00
	P(a)		\$147,165.00	\$499,982.47
	A		\$143,588.00	\$246,070.00
Total Cost			2014	Total Cost
	P		\$5,517,390.00	\$19,257,447.00
	P(a)		\$4,571,031.09	\$9,861,261.24
	A		\$1,227,629.00	\$1,643,752.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Visitantes/educadoras diplomados para dar atención	Delete Output	Este indicador fue eliminado dado que el MIFAN y el Banco acordaron crear un indicador que incluiría la capacitación de técnicos y educadores en una solo y se llamarían agentes calificados. La meta original incluía a todo el universo de Programas que manejaba el MIFAN y se determino que la meta modificada abarcaría solamente los agentes calificados financiados con recursos del Programa. Estos cambios fueron acordados en la revisión de cartera del II semestre de 2013.	6/5/2014	6/5/2014
Output	Visitantes/educadoras diplomados para dar atención	Create Output	Se incluyo el medio de verificacion.	6/2/2014	6/2/2014
Output	Administración de Programa	Delete Component	Se elimino porque esta demas.	6/2/2014	6/2/2014
Output	Imprevistos	Delete Component	Se elimino porque esta demas.	6/2/2014	6/2/2014
Output	Costos Financieros	Delete Component	se elimino porque estaba demas	6/2/2014	6/2/2014
Output	Auditoria	Delete Component	Se elimino porque esta demas.	6/2/2014	6/2/2014
Outcome	Cuestionario de actitudes, creencias y conocimientos sobre "competencias parentales".	Create Outcome Indicator	Se adiciono este indicador de resultados conforme esta establecido en la matriz de resultados del Programa. No se incluyo línea base, ni metas hasta tener la infomación de línea base y metas (que estara lista a finales del 2014).	6/2/2014	6/2/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
