



Operation Number: **NI-L1059**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/11/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/18/2016**
Division Chief validation date: **03/18/2016**
Country Representative validation date: **03/18/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Operation name: | Program to accompany the implementation of the National Policy for children in P | Loan Number: | 2725/BL-NI |
| Executing Agency (EA): | MINISTERIO DE LA FAMILIA | | |
| Team Leader: | Helleranta,Meri | Sector/Subsector: | EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT |
| Operation Type: | Loan Operation | Overall Stage: | Disbursing (From eligibility until all the loans are closed). |
| Lending Instrument: | Investment Loan | Country: | NICARAGUA |
| Borrower: | REPUBLICA DE NICARAGUA | Convergence related Operation(s): | |

Total Cost and Source

| | Original IDB | Current Active IDB | Local Counterpart | Co-Financing/Country | Total operation cost - Original Estimate |
|----------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| NI-L1059 | \$20,000,000.00 | \$20,000,000.00 | \$28,000,000.00 | \$0.00 | \$48,000,000.00 |

Available Funds (US\$)

| | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Balance |
|----------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| NI-L1059 | \$20,000,000.00 | \$13,325,095.42 | 66.63% | \$6,674,904.58 |


Environmental and Social Safeguards

| | |
|---|---|
| Main Operation | |
| Impacts Category: | C |
| Safeguard Performance Rating: | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale: | |

Reformulation Information

| | |
|---|----|
| Main Operation | |
| Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Date of approval: | |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

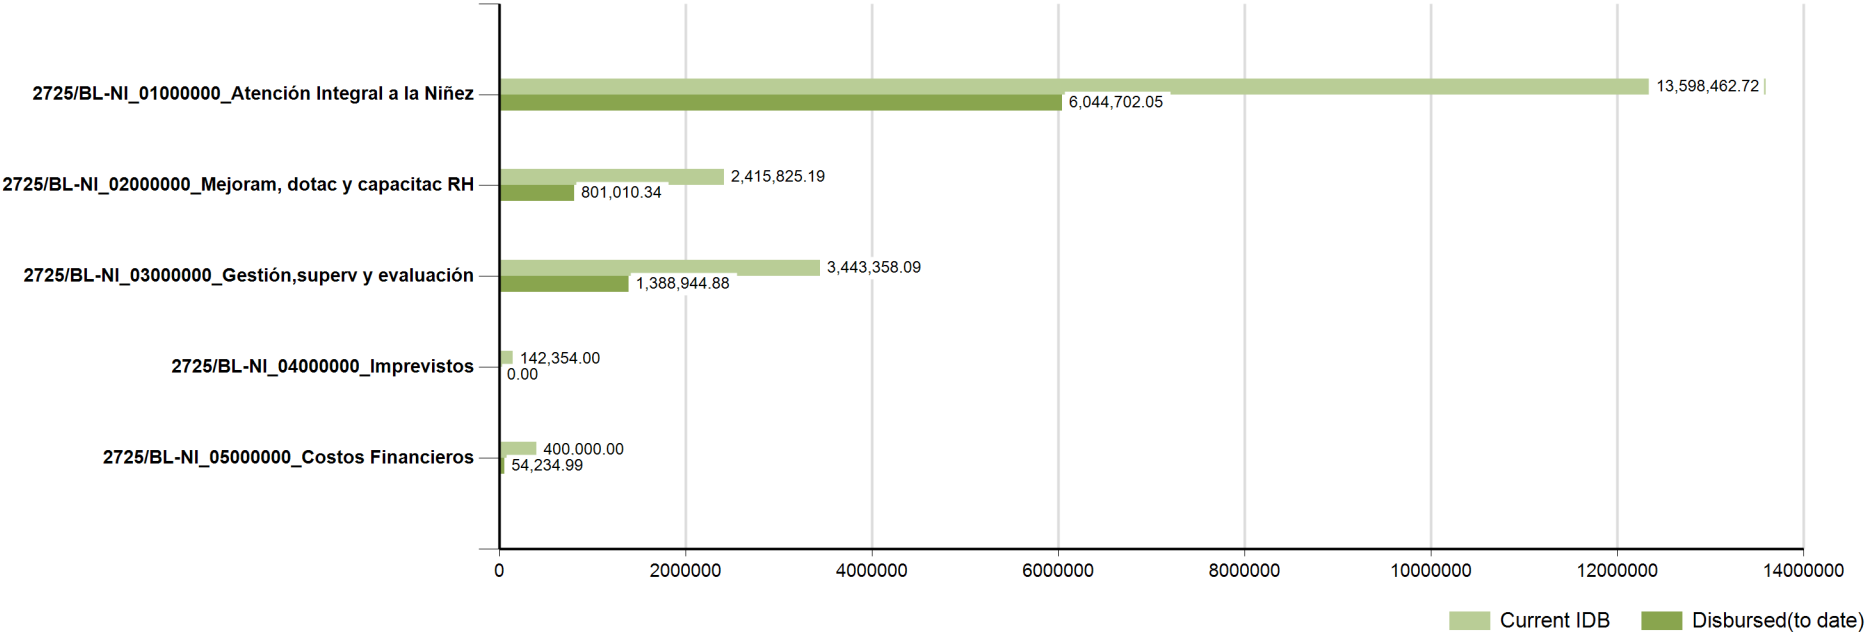

Results Matrix

Impacts

| Impact: | 1 Mejorar el bienestar de los niños y su desarrollo cognitivo y socioemocional, particularmente en poblaciones vulnerables | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------|---------------|---|--|------|-------|-------|-------|-------|
| Observation: | | | | | | | | | | | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EOP |
| 1.1 Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo del lenguaje en comunidades beneficiarias | | % | 47.40 | 2013 | Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses) | Datos de línea base extraídos de la evaluación PAININ III. | P | 39.50 | 39.77 | | 39.77 |
| | | | | | | | P(a) | | | 40.00 | 40.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | | | |
| 1.2 Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo social/individual en comunidades beneficiarias | | % | 31.10 | 2013 | Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses) | Datos de línea de base extraídos de la evaluación del PAININ III | P | 70.90 | 71.30 | | 71.30 |
| | | | | | | | P(a) | | | 25.00 | 25.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | | | |
| 1.3 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 23 meses con desnutrición crónica en del area priorizada | | % | 10.10 | 2013 | Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses) | Datos de línea base extraídos de la ENDESA 2006-2007. | P | 17.00 | 15.00 | | 15.00 |
| | | | | | | | P(a) | | | 9.00 | 9.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | | | |
| 1.4 Porcentaje de niños de 3 a 6 asistiendo el pre-escolar en comunidades beneficiarias. | | % | 32.00 | 2013 | Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses) | Datos de línea de base extraídos de datos administrativos Ministerio de Educación | P | 40.00 | 65.00 | | 65.00 |
| | | | | | | | P(a) | | 40.00 | 60.00 | 60.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.4 Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo motor fino en comunidades beneficiarias | | % | 31.20 | 2014 | Evaluación Externa de Medio Término (18 meses) y final (42 meses) | Datos de línea de base extraídos de datos administrativos del Ministerio de Educación. | P | | | | |
| | | | | | | | P(a) | | | 25.00 | 25.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | | | |
| 1.5 Porcentaje de niños de 0 a 6 años registrados en el Registro Civil en las áreas priorizadas. | | % | 85.00 | 2013 | Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses) | Datos de línea de bases extraídos de datos administrativos MIFAN | P | 80.00 | 95.00 | | 95.00 |
| | | | | | | | P(a) | | | 90.00 | 90.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | | | |

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

| | |
|--------------|--|
| Outcome: | 1 Padres y madres competentes para propiciar una adecuada nutrición, salud, educación, buen trato y participando activamente en la promoción y cumplimiento de los derechos de la primera infancia. |
| Observation: | Fuentes: Datos de línea base extraídos de Verdisco et al (2009); Registros Programa Amor para los más chiquitos; Sistemas de referencia del MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (Comisaría de la Mujer); Datos de línea base extraídos de Macours et al (2011). Evaluación de medio término y final. |

| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EOP |
|---|--------|-----------------|----------|---------------|--|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 1.1 Porcentaje de niños y niñas de 0-3 años que recibieron 12 o más visitas según norma de atención durante el último año | | % | 0.00 | 2013 | Registro Programa Amor para los más chiquitos | | P | 60.00 | | | 80.00 |
| | | | | | | | P(a) | | 60.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Porcentaje de niños y niñas de 3-6 años de las áreas prioritizadas matriculados en el preescolar | | % | 35.00 | 2013 | Registros de alumnos | | P | 40.00 | | | 50.00 |
| | | | | | | | P(a) | | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Porcentaje de hogares donde por lo menos un miembro acudió a los servicios que están incluidos en el sistema de referencia en los últimos seis meses | | % | 14.00 | 2013 | Registros de Programa Amor para los más chiquitos y sistemas de referencia del Sistema MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (comisarias de las mujer) | | P | 30.00 | | | 50.00 |
| | | | | | | | P(a) | | 30.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Porcentaje de los padres quienes mostraron actitudes positivas en hogares con una mujer embarazada o un niño de 0-6 años, en la calidad del ambiente familiar. | | % | 82.00 | 2013 | Datos serán revalidados con la recolección de línea de base, Evaluación externa y final | | P | 3.95 | | | 3.85 |
| | | | | | | | P(a) | | | | 88.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Porcentaje de respuestas correctas que dieron los padres en la prueba estandarizada sobre competencias parentales incluyendo actitudes y creencias (escala KIDI). | | % | 79.00 | 2013 | Recolección de Línea de Base, Evaluación Externa y Final. | | P | | | | |
| | | | | | | | P(a) | | | 82.00 | 82.00 |
| | | | | | | | A | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

| Componente 1. Atención Integral a la niñez en comunidades prioritizadas | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|
| Outputs | Unit of Measure | | 2015 | EOP | | 2015 | EOP |
| Familias con al menos una embarazada y/o menor de seis años con por lo menos una visita anual por el MIFAN-SNBS | Familias | P | 66,166.00 | 66,500.00 | P | 187,548.00 | 705,984.00 |
| | | P(a) | 40,000.00 | 50,000.00 | P(a) | 180,000.00 | 486,681.00 |
| | | A | 49,531.00 | 12,383.00 | A | 127,794.00 | 274,205.00 |
| Niños de 0-3 años atendidos en visita mensual de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS | Personas | P | 30,000.00 | 40,000.00 | P | 3,096,000.00 | 9,530,537.00 |
| | | P(a) | 25,000.00 | 33,000.00 | P(a) | 1,698,580.00 | 8,234,864.00 |
| | | A | 33,192.00 | 22,719.00 | A | 2,638,506.00 | 4,754,978.00 |
| Niños de 3-6 años con registro de evaluación bimestral de desarrollo y asistencia al preescolar por MINED-SNBS y visista bimestral de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS | Estudiantes | P | 36,000.00 | 40,000.00 | P | 461,050.00 | 1,843,750.00 |
| | | P(a) | 28,000.00 | 30,000.00 | P(a) | 1,879,280.00 | 3,660,599.00 |
| | | A | 24,439.00 | 17,694.00 | A | 1,442,850.00 | 1,810,599.00 |
| Niños/as menores de un año con cuarto control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez. | niños | P | 13,167.00 | 40,000.00 | P | 37,146.00 | 134,755.00 |
| | | P(a) | 10,000.00 | 13,300.00 | P(a) | 42,000.00 | 138,509.20 |
| | | A | 8,725.00 | 5,946.00 | A | 50,101.00 | 88,809.00 |
| Niños/as de cinco años cumplidos a 6 años por cumplir con segundo control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez. | niños | P | 13,167.00 | 13,300.00 | P | 37,146.00 | 134,755.00 |
| | | P(a) | 10,000.00 | 13,300.00 | P(a) | 42,000.00 | 138,353.00 |
| | | A | 5,660.00 | 3,662.00 | A | 44,740.00 | 96,353.00 |
| Niños/a de 1 año cumplido y menor de cinco por cumplir con tercer control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez. | niños | P | 49,198.00 | 53,400.00 | P | 129,007.00 | 502,241.00 |
| | | P(a) | 25,000.00 | 53,400.00 | P(a) | 105,000.00 | 366,016.66 |
| | | A | 28,498.00 | 21,250.00 | A | 119,836.00 | 198,717.00 |
| Niños/as de 6 a 24 meses reciben micronutrientes en las áreas prioritizadas. | niños | P | 19,801.00 | 20,000.00 | P | 179,685.00 | 653,429.00 |
| | | P(a) | 7,500.00 | 20,000.00 | P(a) | 86,400.00 | 223,672.00 |
| | | A | 8,226.00 | 5,000.00 | A | 84,877.00 | 209,811.00 |
| Componente 2. Mejoramiento de las condiciones de atención | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | | 2015 | EOP | | 2015 | EOP |
| Agentes calificados a cargo de las visitas domiciliarias graduados de proceso de formación para dar dicha atención. | Agentes | P | 1,375.00 | 2,375.00 | P | 550,000.00 | 950,000.00 |
| | | P(a) | 2,500.00 | 5,316.00 | P(a) | 383,000.00 | 937,352.00 |
| | | A | 2,611.00 | 2,816.00 | A | 703,309.00 | 707,487.00 |
| Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados | Espacios Rehabilitados | P | 125.00 | 250.00 | P | 875,000.00 | 1,750,000.00 |
| | | P(a) | 125.00 | 233.00 | P(a) | 807,700.00 | 1,404,347.00 |
| | | A | 53.00 | 71.00 | A | 423,859.00 | 554,347.00 |
| Componente 3. Gestión, Supervisión y Evaluación | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | | 2015 | EOP | | 2015 | EOP |
| Informes Semestrales de verificación de cobertura entregados | informes | P | 2.00 | 6.00 | P | 100,000.00 | 275,000.00 |
| | | P(a) | 2.00 | 4.00 | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | A | 2.00 | 2.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados. | informes | P | 408.00 | 1,332.00 | P | 105,539.00 | 458,767.00 |
| | | P(a) | 444.00 | 1,457.00 | P(a) | 340,027.00 | 844,819.20 |
| | | A | 444.00 | 1,013.00 | A | 333,923.00 | 542,829.00 |
| Usuarios primarios del registro únicos de protagonistas activos en el MIFAN, MINSA y MINED durante el semestre anterior | Personas | P | 480.00 | 480.00 | P | 81,829.00 | 250,000.00 |
| | | P(a) | 96.00 | 147.00 | P(a) | 80,120.00 | 242,979.00 |
| | | A | 147.00 | 26.00 | A | 112,728.00 | 193,994.00 |

| | | | | | | | |
|---|----------|------|------|------|------|------------|------------|
| Informe anuales de la evaluación de desempeños entregados | Informes | P | 1.00 | 3.00 | P | 150,000.00 | 350,000.00 |
| | | P(a) | 1.00 | 2.00 | P(a) | 71,768.00 | 156,050.00 |
| | | A | 1.00 | 1.00 | A | 76,050.00 | 76,050.00 |
| Informe de evaluación de impacto entregados | informes | P | | 1.00 | P | | 500,000.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 1.00 | P(a) | 0.00 | 250,000.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |

| Other Cost | | 2015 | Cost |
|---------------------------------|------|----------------|-----------------|
| Auditoría | P | | |
| | P(a) | \$12,580.00 | \$40,566.97 |
| | A | \$12,834.00 | \$12,834.00 |
| Costos Financieros | P | | |
| | P(a) | \$100,000.00 | \$209,289.93 |
| | A | \$40,352.00 | \$54,235.00 |
| Imprevistos | P | | |
| | P(a) | \$0.00 | \$142,354.00 |
| | A | | \$0.00 |
| Costo de Operación del Programa | P | \$373,580.00 | \$1,218,229.00 |
| | P(a) | \$400,000.00 | \$1,247,635.50 |
| | A | \$447,057.00 | \$823,419.00 |
| Total Cost | | 2015 | Total Cost |
| | P | \$6,363,530.00 | \$19,257,447.00 |
| | P(a) | \$6,228,455.00 | \$18,724,088.46 |
| | A | \$6,658,816.00 | \$10,398,667.00 |

Changes to the Matrix

| Section | Name | Type of Change | Reasons | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|---|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Output | Usuarios primarios del registro únicos de protagonistas activos en el MIFAN, MINSA y MINED durante el semestre anterior | Modify Physical EOP P(a) | Actualización de la meta física del programa en función de las metas del ultimo año de ejecución (2016). | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Niños de 3-6 años con registro de evaluación bimestral de desarrollo y asistencia al preescolar por MINED-SNBS y visita bimestral de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS | Modify Physical EOP P(a) | Actualización de la meta física del programa en función de las metas del ultimo año de ejecución (2016). | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Niños de 0-3 años atendidos en visita mensual de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS | Modify Physical EOP P(a) | Actualización de la meta física del programa en función de las metas del ultimo año de ejecución (2016). | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Familias con al menos una embarazada y/o menor de seis años con por lo menos una visita anual por el MIFAN-SNBS | Modify Physical EOP P(a) | Actualización de la meta física del programa en función de las metas del ultimo año de ejecución (2016). | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Informe de evaluación de impacto entregados | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Informe anuales de la evaluación de desempeños entregados | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Usuarios primarios del registro únicos de protagonistas activos en el MIFAN, MINSA y MINED durante el semestre anterior | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados. | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |

| | | | | | |
|--------|---|-----------------------------|--|----------|-----------|
| Output | Informes Semestrales de verificación de cobertura entregados | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Agentes calificados a cargo de las visitas domiciliarias graduados de proceso de formación para dar dicha atención. | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Niños/as de 6 a 24 meses reciben micronutrientes en las áreas priorizadas. | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Niños/a de 1 año cumplido y menor de cinco por cumplir con tercer control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez. | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Niños/as de cinco años cumplidos a 6 años por cumplir con segundo control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez. | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Niños/as menores de un año con cuarto control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez. | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Niños de 3-6 años con registro de evaluación bimestral de desarrollo y asistencia al preescolar por MINED-SNBS y visita bimestral de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Niños de 0-3 años atendidos en visita mensual de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Familias con al menos una embarazada y/o menor de seis años con por lo menos una visita anual por el MIFAN-SNBS | Modify Financial P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados. | Modify Physical P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados | Modify Physical P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |
| Output | Agentes calificados a cargo de las visitas domiciliarias graduados de proceso de formación para dar dicha atención. | Modify Physical P(a) value | Actualización de la planificación física y financiera de 2016. | 3/3/2016 | 2/16/2016 |

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
