
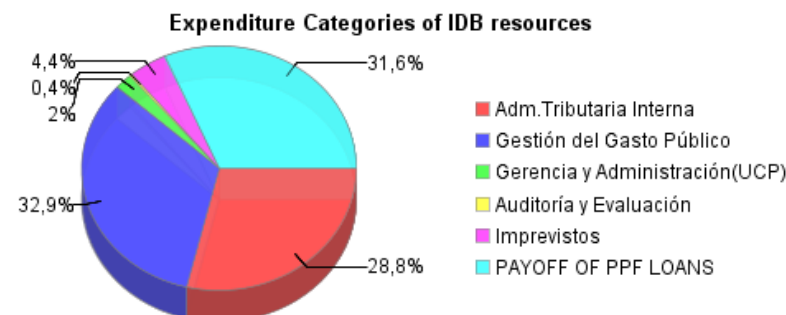
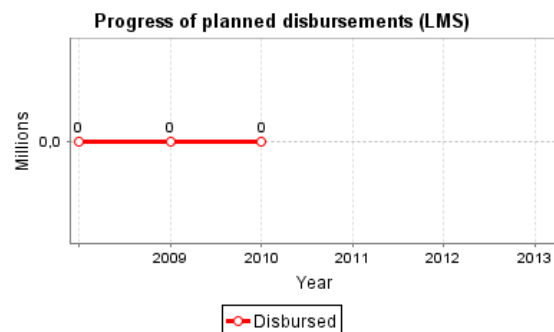



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Loan Number(s):	2014/BL-PR	Current Approved Amount:	9.500.000,00	Original IDB:	9.500.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	9.500.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	PR-L1035, PR-T1111	Balance:	9.500.000,00	Co-Financing/Country:	6.500.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	16.000.000,00
				Amortization Period (months):	264

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 29, 2011 Validated by Country Representative: Apr 26, 2011

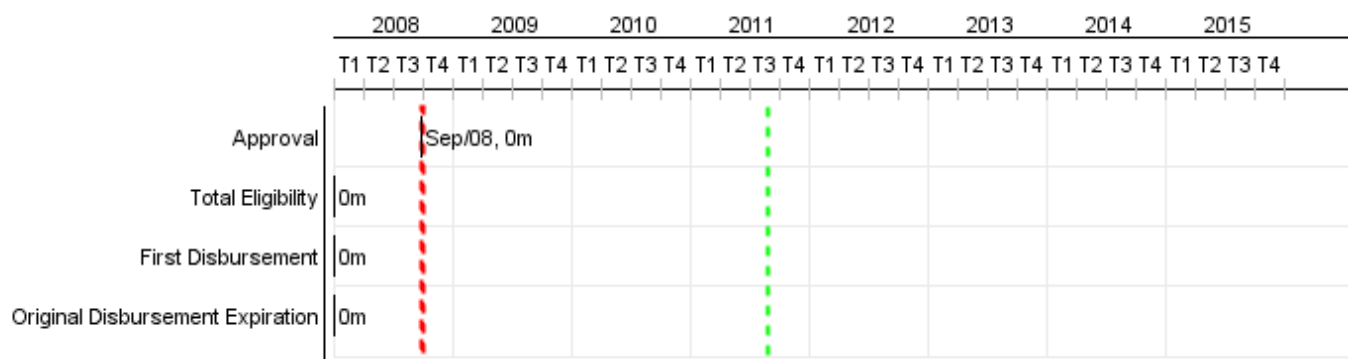

Accumulated Progress as of 2010

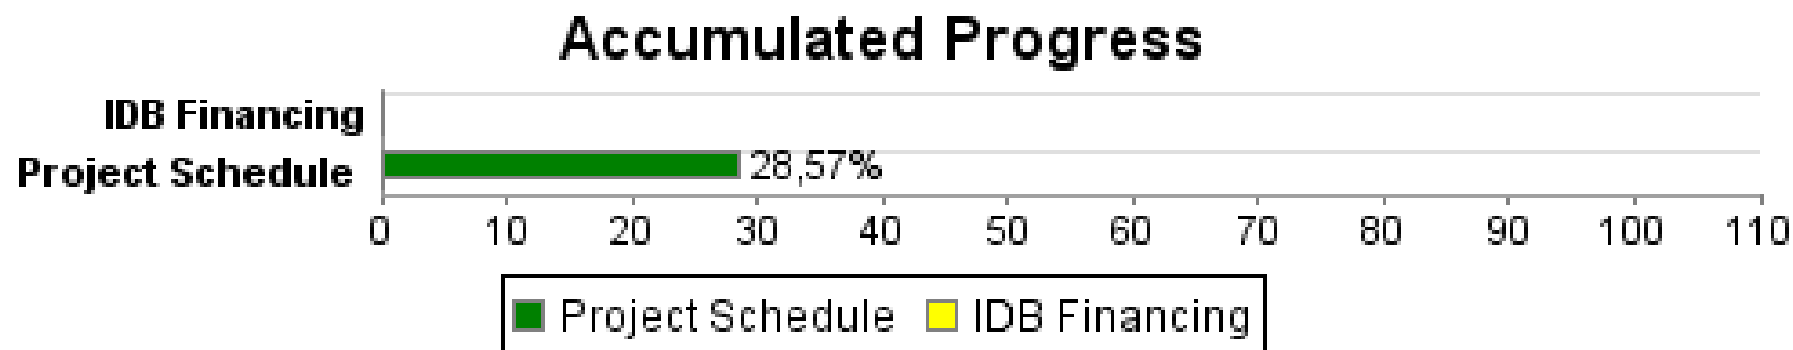

Outcomes

Outcome: Contribuir al logro de una gestión de ingresos tributarios internos más eficiente en Paraguay.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje del costo operativo de la Administración Tributaria interna se mantiene constante respecto al año base.	%	1,30	2008	P A	1,30
Incremento de contribuyentes activos resgistrados respecto al año base.	Número de Contribuyentes	429.453,00	2008	P A	558.300,00

Outcome: Contribuir al logro de una gestión del gasto público más eficiente en Paraguay.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de ejecucion Anual de Proyectos de Inversión Pública incrementada respecto al año base.	%	50,00	2008	P A	60,00
Depuración de la Base de Datos de beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones al final del Programa (no considera el incremento con nuevos beneficiarios).	Número de Beneficiarios	37.600,00	2008	P A	35.700,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna									
Normativa tributaria impulsada.	Normas emitidas				5,00				636.000,00
Estructura orgánica de la SET modernizada	Estructura				1,00				950.000,00
Data Center alternativo de la SET en operación	Data Center				1,00				1.200.000,00
Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's).	Equipos				5,00				300.000,00
Sistemas tecnológicos fortalecidos.	Sistemas				11,00				1.230.000,00
Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Funcionarios				450,00				150.000,00
Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Agentes				150,00				220.000,00
Campaña de concientización tributaria realizada.	Campañas				2,00				2.030.000,00
Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público									
Nuevo SIAF implementado.	SIAF				1,00				3.582.500,00
Sistema Integrado de Administración de Bienes y Servicios (SIABYS) en operación 12 entidades de la AC (diseño conceptual + procedimientos+ capacitación).	SIABYS				1,00				1.100.000,00
Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) en operación plena.	SINARH				1,00				996.000,00
Gestión de Jubilaciones y Pensiones (JUPE) fortalecida.	JUPE				1,00				700.800,00
Gestión de Crédito, Deuda e Inversión Pública modernizada.	SICAP				1,00				1.199.200,00
Componente 3 - Gerencia del Proyecto									
TOTAL									14.294.500,00
