
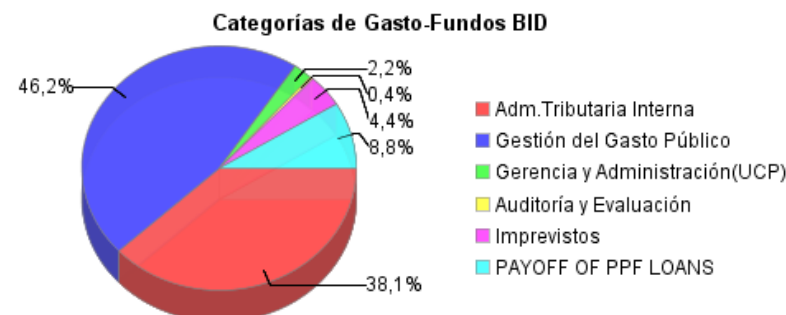
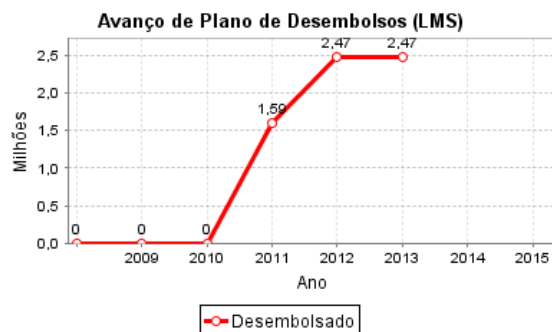



Relatório Resumido

| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Executor: MINISTERIO DE HACIENDA | | |
| Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH | | |
| Número da Operação: 2014/BL-PR | Atual: 9.500.000,00 | Original BID: 9.500.000,00 |
| Estágio: Approved | Desembolsado: 2.469.722,31 | Corrente BID: 9.500.000,00 |
| Tipo Operação: INV - Investimento | % Desembolsado: 26,00 | Pari-passu: 59,00 |
| Operação Relacionada: PR-L1035, PR-T1111 | Saldo: 7.030.277,69 | Cofinanciamento/País: 6.500.000,00 |
| Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation | | Original Estimado: 16.000.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): 264 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|-------------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: Nenhum | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 11-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 11-abr-2013 |

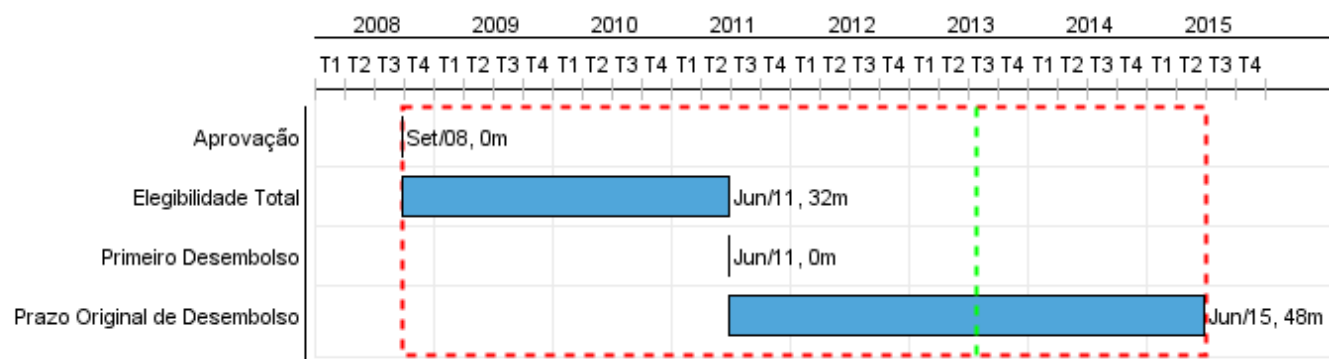

Progresso Acumulado até 2012

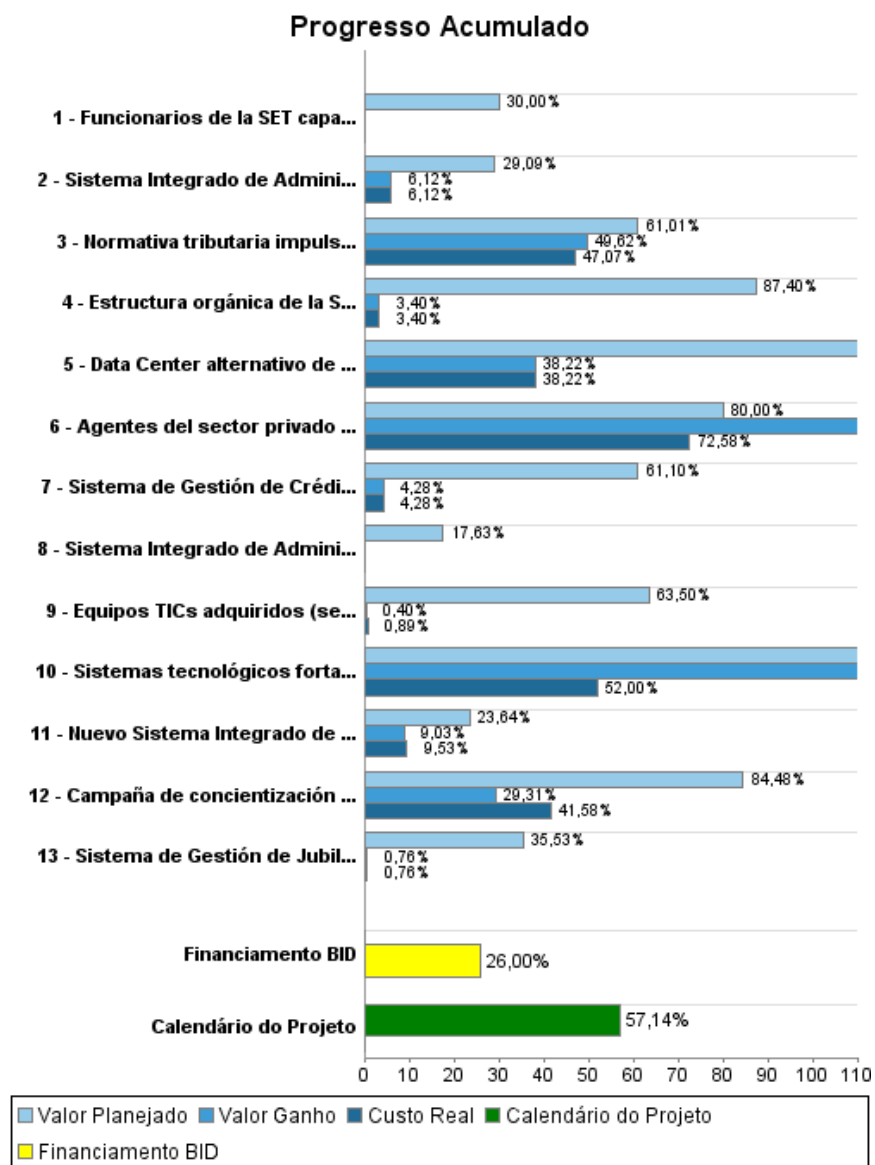

Resultados

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Eficiencia en la gestión de ingresos tributarios internos de Paraguay mejorada |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------------------|
| Costo operativo de la Administración Tributaria interna en relación con la recaudación total de tributos internos | % | 1,30 | 2008 | P A | 1,30 |
| Contribuyentes activos resgistrados | Contribuyentes | 429.453,00 | 2008 | P A | 558.300,00 |

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Eficiencia en la gestión del gasto público de Paraguay mejorada |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|--------|------------------|
| Ejecucion Promedio Anual de Proyectos de Inversión Pública respecto de lo planeado | % | 50,00 | 2008 | P A | 60,00 |
| Beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones depuados | Beneficiarios | 37.600,00 | 2008 | P A | 35.700,00 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|-------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Componente 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna | | | | | | | | | |
| Normativa tributaria impulsada. | Normas emitidas | | 1,00 | | 5,00 | 191.300,00 | 79.523,00 | | 636.000,00 |
| Estructura orgánica de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) modernizada | Estructura | | | | 1,00 | 684.550,00 | 6.248,00 | | 950.000,00 |
| Data Center alternativo de la SET en operación | Data Center | 1,00 | | | 1,00 | 100.000,00 | | | 450.000,00 |
| Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's). | Equipos | | 1,00 | | 5,00 | 500.000,00 | | | 800.000,00 |
| Sistemas tecnológicos fortalecidos. | Sistemas | 3,00 | 9,00 | | 11,00 | 877.306,00 | 704.290,00 | | 1.480.000,00 |
| Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios. | Funcionarios | 150,00 | | | 450,00 | 45.000,00 | | | 150.000,00 |
| Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios. | Agentes | 100,00 | 307,00 | | 150,00 | 102.000,00 | 115.528,00 | | 220.000,00 |
| Campaña de concientización tributaria realizada. | Campañas | 1,00 | | | 2,00 | 510.000,00 | 86.204,00 | | 2.030.000,00 |
| Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público | | | | | | | | | |
| Nuevo Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) implementado. | Sistemas | | | | 2,00 | 534.750,00 | 11.528,00 | | 3.582.500,00 |
| Sistema Integrado de Administración de Bienes y Servicios (SIABYS) en operación 12 entidades de la AC (diseño conceptual + procedimientos+ capacitación). | Sistemas | | | | 1,00 | 240.000,00 | 48.519,00 | | 1.100.000,00 |
| Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) en operación plena. | Sistemas | | | | 1,00 | 175.600,00 | | | 996.000,00 |
| Sistema de Gestión de Jubilaciones y Pensiones (JUPE) fortalecido. | Sistema | | | | 1,00 | 214.000,00 | 5.299,00 | | 700.800,00 |
| Sistema de Gestión de Crédito, Deuda e Inversión Pública (SICAP) modernizado. | Sistema | | | | 1,00 | 223.700,00 | 51.365,00 | | 1.199.200,00 |
| Componente 3 - Gerencia del Proyecto | | | | | | | | | |
| Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos. | N/A | | | | | 313.875,00 | 206.222,00 | | 1.705.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.712.081,00 | 1.314.726,00 | | 16.000.000,00 |
