
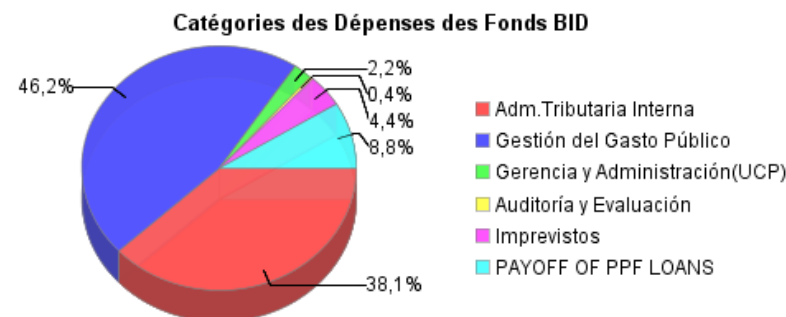
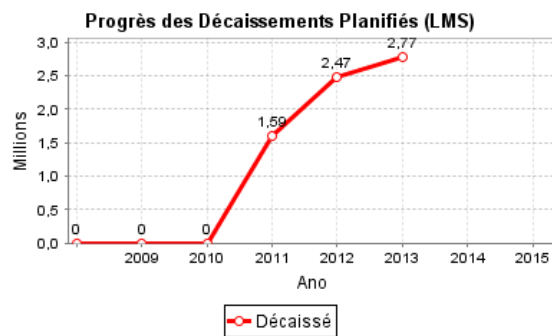



Rapport Résumé

Données Générales	Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE HACIENDA		
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH		
Numéro(s) de Prêt(s): 2014/BL-PR	Montant Courant Approuvé: 9.500.000,00	Initial BID: 9.500.000,00
Étape: Approved	Montant Décaissé à ce Jour: 2.724.410,68	Courant BID: 9.500.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement	% Décaissé: 28,68	Pari Passu: 59,00
Opération(s) Connexe(s): PR-L1035, PR-T1111	Solde: 6.775.589,32	Cofinancement/Pays: 6.500.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 16.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois): 264

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2013 Validé par le Représentant: 26-sep-2013

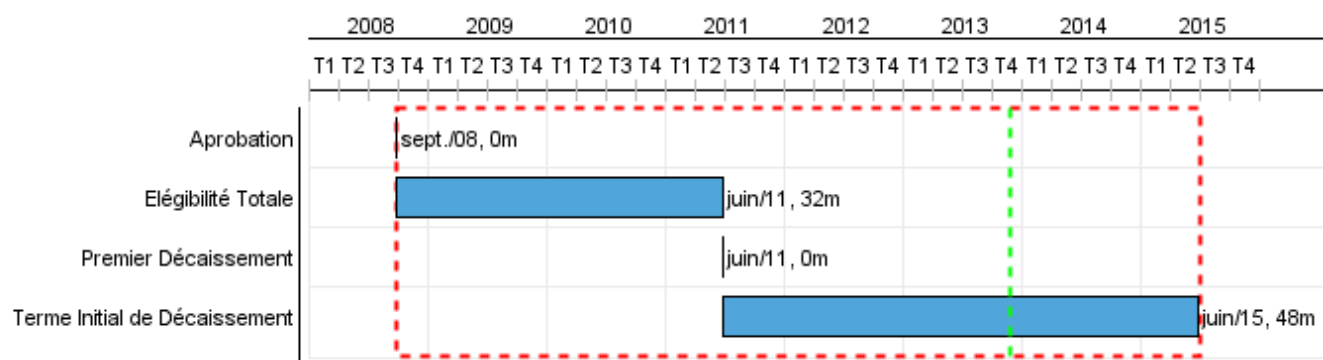

Progrès Cumulé à 2013

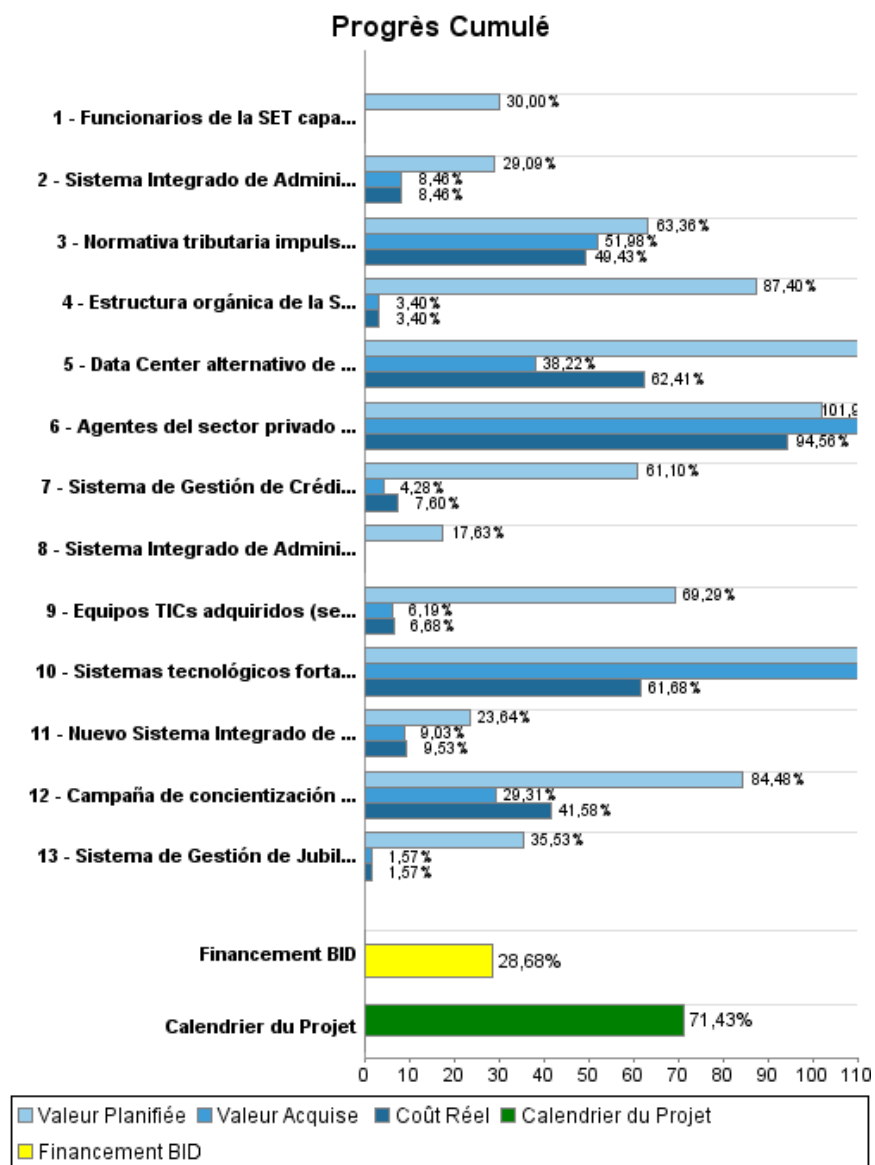

Résultats

Résultat:	Eficiencia en la gestión de ingresos tributarios internos de Paraguay mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Costo operativo de la Administración Tributaria interna en relación con la recaudación total de tributos internos	%	1,30	2008	P A	1,30
Contribuyentes activos resgistrados	Contribuyentes	429.453,00	2008	P A	558.300,00

Résultat:	Eficiencia en la gestión del gasto público de Paraguay mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Ejecucion Promedio Anual de Proyectos de Inversión Pública respecto de lo planeado	%	50,00	2008	P A	60,00
Beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones depuados	Beneficiarios	37.600,00	2008	P A	35.700,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna									
Normativa tributaria impulsada.	Normas emitidas				5,00		15.000,00		636.000,00
Estructura orgánica de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) modernizada	Estructura				1,00	127.590,00			950.000,00
Data Center alternativo de la SET en operación	Data Center	1,00			1,00	278.001,00	108.863,00		450.000,00
Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's).	Equipos				5,00		46.351,00		800.000,00
Sistemas tecnológicos fortalecidos.	Sistemas	4,00			11,00	610.409,00	143.229,00		1.480.000,00
Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Funcionarios				450,00				150.000,00
Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Agentes	25,00			150,00		48.350,00		220.000,00
Campaña de concientización tributaria realizada.	Campañas	1,00			2,00	610.000,00			2.030.000,00
Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público									
Nuevo Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) implementado.	Sistemas				2,00				3.582.500,00
Sistema Integrado de Administración de Bienes y Servicios (SIABYS) en operación 12 entidades de la AC (diseño conceptual + procedimientos+ capacitación).	Sistemas				1,00	50.000,00	25.800,00		1.100.000,00
Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) en operación plena.	Sistemas				1,00				996.000,00
Sistema de Gestión de Jubilaciones y Pensiones (JUPE) fortalecido.	Sistema				1,00	35.000,00	5.694,00		700.800,00
Sistema de Gestión de Crédito, Deuda e Inversión Pública (SICAP) modernizado.	Sistema	1,00			1,00	492.225,00	39.827,00		1.199.200,00
Componente 3 - Gerencia del Proyecto									
Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos.	N/A					313.875,00	90.046,00		1.705.500,00
TOTAL						2.517.100,00	523.160,00		16.000.000,00
