


Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
0			HO-L1202_POA Año 1	1545 days	Thu 30/5/19	Wed 30/4/25	\$2,888,515	\$0	\$2,888,515												
1			Actividades previas de preparación del Programa	142 days	Thu 30/5/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0												
2			<i>Perfil de Proyecto Aprobado</i>	<i>0 days</i>	<i>Thu 30/5/19</i>	<i>Thu 30/5/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>												
3			Elaboración del documento del POD y Anexos	47 days	Thu 30/5/19	Fri 2/8/19	\$0	\$0	\$0	Equipo BID											
4			Distribución del POD a QRR	1 day	Mon 5/8/19	Mon 5/8/19	\$0	\$0	\$0	Equipo BID											
5			Revisiones y ajustes al POD y Anexos	28 days	Tue 6/8/19	Thu 12/9/19	\$0	\$0	\$0	Equipo BID											
6			Aprobación del Borrador de Propuesta de Préstamo por OPC	1 day	Fri 13/9/19	Fri 13/9/19	\$0	\$0	\$0	BID											
7			Tramitación de la aprobación del Préstamo por el Directorio del BID	25 days	Mon 16/9/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	BID											
8			Tramitación de la firma del Contrato de Préstamo	40 days	Mon 21/10/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	MH;BID											
9			<i>Contrato de Préstamo firmado</i>	<i>0 days</i>	<i>Fri 13/12/19</i>	<i>Fri 13/12/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>												
10			Contrato de Préstamo ratificado por Ley	44 days	Mon 16/12/19	Thu 13/2/20	\$0	\$0	\$0												
11			Tramitación de la promulgación de la Ley que aprueba el CP	44 days	Mon 16/12/19	Thu 13/2/20	\$0	\$0	\$0	Congreso Nacional											
12			<i>Ley promulgada y publicada en el Diario Oficial La Gaceta</i>	<i>0 days</i>	<i>Thu 13/2/20</i>	<i>Thu 13/2/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>												
13			Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0												
14			Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Estipulaciones Especiales (según cada Contrato de Préstamo)	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0	Responsable institucional											
15			Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Normas Generales	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0	Responsable institucional											
16			<i>Condiciones Previas al Primer Desembolso cumplidas</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 16/6/20</i>	<i>Tue 16/6/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>												
17	1		Componente 1: Cobertura y uso de Banda Ancha	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$83,880	\$0	\$83,880												
18	1.1	P1	Producto 1: Sitios y edificios públicos conectados	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$83,880	\$0	\$83,880												
19	1.1.1		Centros Educativos Equipados y Conectados a la Red de Banda Ancha	1198 days	Wed 1/7/20	Fri 31/1/25	\$0	\$0	\$0												
20	1.1.1.1	GRP - Act. # 1.3	Elaboración de una estrategia pedagógica que incorpore la digitalización y la conectividad.	132 days	Wed 1/7/20	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	SEDUC											
21	1.1.1.2		Realización del proceso de Solicitud de Información	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$0	\$0	\$0												
56	1.1.2		Centros de Salud equipados y conectados a la Red de Banda Ancha	1198 days	Wed 1/7/20	Fri 31/1/25	\$0	\$0	\$0												
57	1.1.2.1	GRP - Act. # 1.4	Elaboración de estrategia de adopción de digitalización y conectividad en la gestión del sistema de salud.	132 days	Wed 1/7/20	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	SESAL											
64	1.1.3		Supervisión técnica y administrativa	1216 days	Mon 23/3/20	Mon 18/11/24	\$83,880	\$0	\$83,880												
65	1.1.3.1		3CV_48. Supervisión técnica y administrativa de Red en Centros Educativos, hospitales y centros de salud	1216 days	Mon 23/3/20	Mon 18/11/24	\$48,000	\$0	\$48,000												
66	1.1.3.1.1		Etapla previa	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
67	1.1.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
68	1.1.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
69	1.1.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
70	1.1.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
71	1.1.3.1.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	<i>0 days</i>	<i>Thu 9/4/20</i>	<i>Thu 9/4/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>BID</i>											
72	1.1.3.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
73	1.1.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
74	1.1.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
75	1.1.3.1.2.3		<i>Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones</i>	<i>0 days</i>	<i>Mon 27/4/20</i>	<i>Mon 27/4/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	Especialista en Adquisiciones											
76	1.1.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
77	1.1.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
78	1.1.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
79	1.1.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	<i>Tue 12/5/20</i>	<i>Tue 12/5/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	BID											
80	1.1.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
81	1.1.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

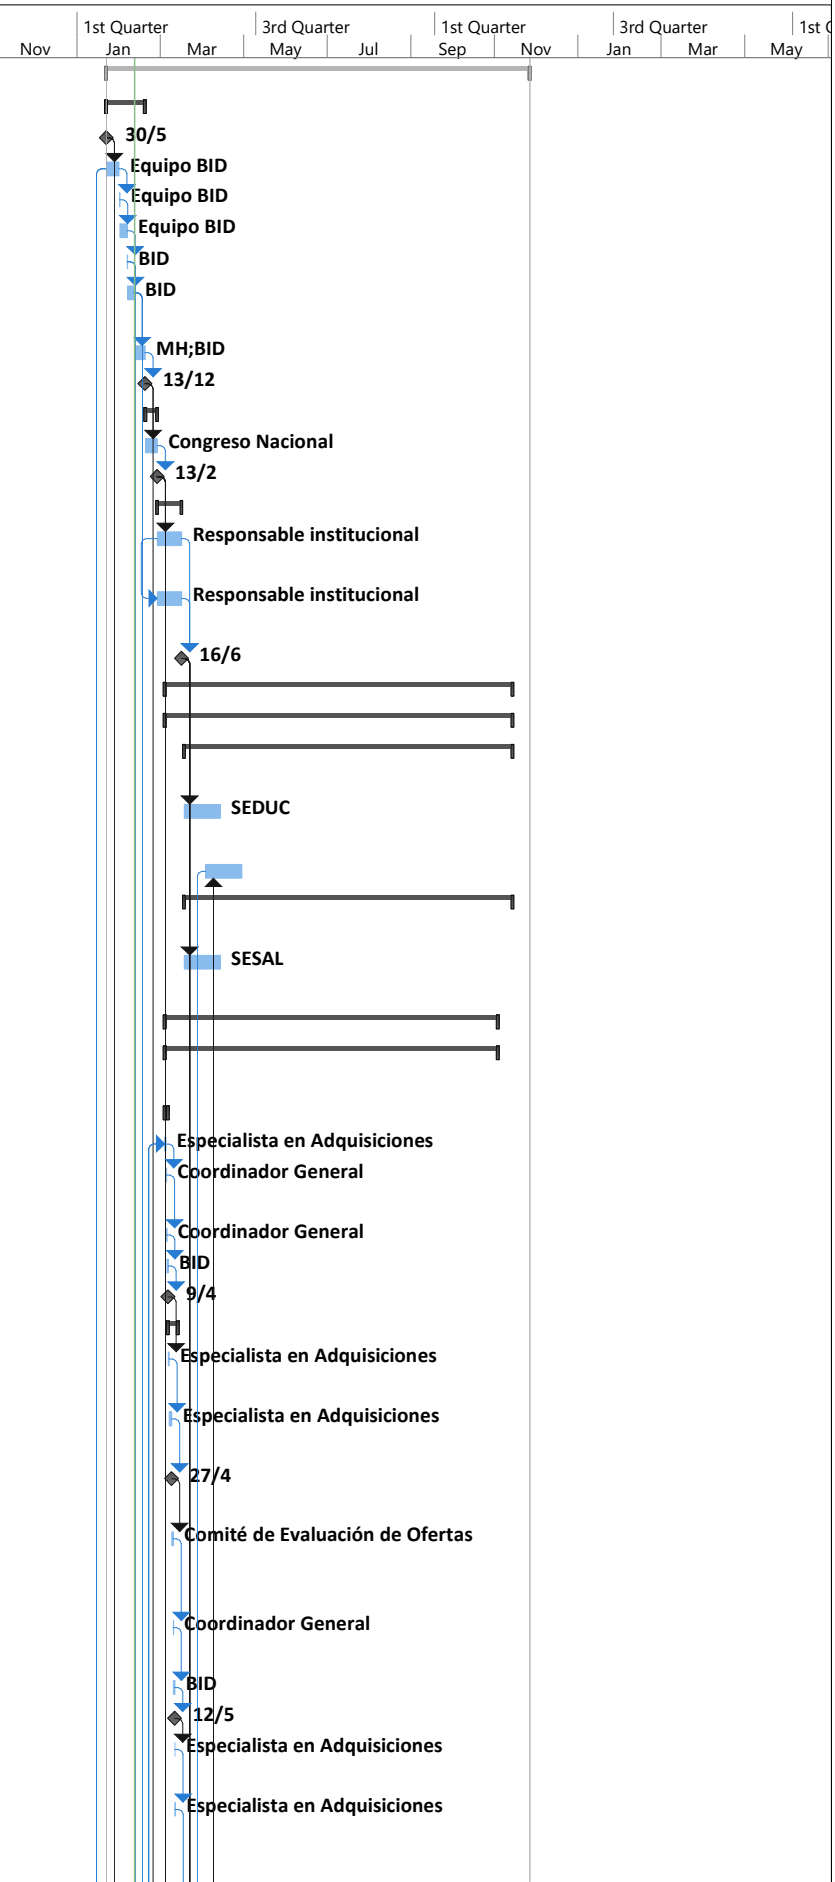

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
82	1.1.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
83	1.1.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
84	1.1.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
85	1.1.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1166 days	Mon 1/6/20	Mon 18/11/24	\$48,000	\$0	\$48,000												
86	1.1.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1166 days	Mon 1/6/20	Mon 18/11/24	\$48,000	\$0	\$48,000	Consultor											
87	1.1.3.2		Viáticos C1	1166 days	Mon 1/6/20	Mon 18/11/24	\$0	\$0	\$0	Especialista Financiero											
88	1.1.3.3		LPN_15. Alquiler de vehículos u otros, y gastos de transporte	1077 days	Mon 23/3/20	Tue 7/5/24	\$17,280	\$0	\$17,280												
89	1.1.3.3.1		Etapas previas	28 days	Mon 23/3/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0												
90	1.1.3.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	Mon 23/3/20	Tue 24/3/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
91	1.1.3.3.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	15 days	Wed 25/3/20	Tue 14/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
92	1.1.3.3.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 15/4/20	Tue 21/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
93	1.1.3.3.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Wed 22/4/20	Wed 22/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
94	1.1.3.3.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 23/4/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
95	1.1.3.3.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 29/4/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
96	1.1.3.3.2		Proceso de Contratación	70 days	Thu 30/4/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0												
97	1.1.3.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Thu 30/4/20	Wed 6/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
98	1.1.3.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/5/20	Wed 6/5/20	\$0	\$0	\$0	Portal de ocntrataciones											
99	1.1.3.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	20 days	Thu 7/5/20	Wed 3/6/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
100	1.1.3.3.2.4		Plazo de previsión para adendas	5 days	Thu 4/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
101	1.1.3.3.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Wed 10/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
102	1.1.3.3.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	10 days	Thu 11/6/20	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
103	1.1.3.3.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 days	Thu 25/6/20	Fri 26/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
104	1.1.3.3.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Fri 26/6/20	Fri 26/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
105	1.1.3.3.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Mon 29/6/20	Mon 29/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
106	1.1.3.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 30/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
107	1.1.3.3.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
108	1.1.3.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 7/7/20	Tue 7/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
109	1.1.3.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Wed 8/7/20	Fri 10/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
110	1.1.3.3.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 10/7/20	Fri 10/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
111	1.1.3.3.2.15		Elaboración del borrador del contrato	2 days	Mon 13/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
112	1.1.3.3.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	10 days	Wed 15/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
113	1.1.3.3.2.17		Contrato firmado	0 days	Tue 28/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
114	1.1.3.3.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Wed 29/7/20	Wed 29/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
115	1.1.3.3.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Thu 30/7/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
116	1.1.3.3.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 5/8/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr											
117	1.1.3.3.3		Ejecución del contrato	979 days	Thu 6/8/20	Tue 7/5/24	\$17,280	\$0	\$17,280												
118	1.1.3.3.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	979 days	Thu 6/8/20	Tue 7/5/24	\$17,280	\$0	\$17,280	Empresa											
119	1.1.3.4 GRP - Act. #1.1		3CV_49. Contratación de Asistencia Técnica para Diseño y Desarrollo de la licitación del Componente 1	345 days	Mon 10/8/20	Fri 3/12/21	\$9,600	\$0	\$9,600												
120	1.1.3.4.1		Etapas previas	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0												
121	1.1.3.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
122	1.1.3.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
123	1.1.3.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
124	1.1.3.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
125	1.1.3.4.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
126	1.1.3.4.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0												
127	1.1.3.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
128	1.1.3.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
129	1.1.3.4.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
130	1.1.3.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
131	1.1.3.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
132	1.1.3.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
133	1.1.3.4.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
134	1.1.3.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
135	1.1.3.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
136	1.1.3.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
137	1.1.3.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
138	1.1.3.4.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
139	1.1.3.4.3		Etapas de ejecución del contrato	295 days	Mon 19/10/20	Fri 3/12/21	\$9,600	\$0	\$9,600											
140	1.1.3.4.3.1		Desarrollo de los servicios	295 days	Mon 19/10/20	Fri 3/12/21	\$9,600	\$0	\$9,600	Consultor;Coordinador de in										
142	1.2	P2	Producto 2: Marco normativo para favorecer la conectividad de sitios públicos revisado	444 days	Tue 19/1/21	Fri 30/9/22	\$0	\$0	\$0											
143	1.2.1		SBCC_20. Elaboración de propuestas de Marco Normativo para favorecer la conectividad de sitios públicos	444 days	Tue 19/1/21	Fri 30/9/22	\$0	\$0	\$0											
144	1.2.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Tue 19/1/21	Fri 12/3/21	\$0	\$0	\$0											
145	1.2.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Tue 19/1/21	Mon 25/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
146	1.2.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Tue 26/1/21	Tue 26/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
147	1.2.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Wed 27/1/21	Tue 2/2/21	\$0	\$0	\$0	BID										
154	1.2.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Tue 19/1/21	Thu 4/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
219	2		Componente 2: Transformación Digital del Gobierno	1482 days	Thu 30/5/19	Fri 31/1/25	\$1,439,060	\$0	\$1,439,060											
220	2.1		Subcomponente 2.1: Calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas	1482 days	Thu 30/5/19	Fri 31/1/25	\$349,300	\$0	\$349,300											
221	2.1.1	P4	Producto 4: Capacidad técnica y operativa de la DPTMGD incrementada	1296 days	Fri 14/2/20	Fri 31/1/25	\$204,000	\$0	\$204,000											
222	2.1.1.1	GRP - Act. # 1.15	Prever asesoría a la DPTMGD para la I fase del desarrollo e implemen. de una estrategia de fortalecim. Instit. que aproveche los recursos del Programa de manera más eficiente para lograr un alto impacto en la mejora de las capacidades técnicas y operativa	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0	DPTMGD;BID										
223	2.1.1.2		SCC_21. Elaboración de un Diagnóstico situacional, el Diseño y la implementación del plan de fortalecimiento de la DPTMGD	496 days	Mon 1/6/20	Mon 25/4/22	\$14,000	\$0	\$14,000											
224	2.1.1.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 1/6/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0											
225	2.1.1.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
226	2.1.1.2.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
227	2.1.1.2.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
228	2.1.1.2.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0											
229	2.1.1.2.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
230	2.1.1.2.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
231	2.1.1.2.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 18/6/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
232	2.1.1.2.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 2/7/20	Thu 2/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
233	2.1.1.2.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 3/7/20	Thu 9/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
234	2.1.1.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/6/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
235	2.1.1.2.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
236	2.1.1.2.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 16/7/20	Thu 16/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
237	2.1.1.2.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 17/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
238	2.1.1.2.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
239	2.1.1.2.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 24/7/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0											
240	2.1.1.2.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 24/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
241	2.1.1.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 30/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
242	2.1.1.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 31/7/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
243	2.1.1.2.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 31/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
244	2.1.1.2.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
245	2.1.1.2.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 15/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
246	2.1.1.2.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 17/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
247	2.1.1.2.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 18/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
248	2.1.1.2.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
249	2.1.1.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
250	2.1.1.2.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
251	2.1.1.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
252	2.1.1.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 1/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
253	2.1.1.2.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
254	2.1.1.2.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 6/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
255	2.1.1.2.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 12/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
256	2.1.1.2.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 13/10/20	Tue 13/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
257	2.1.1.2.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 14/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato										
258	2.1.1.2.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
259	2.1.1.2.3		Ejecución del contrato	394 days	Wed 21/10/20	Mon 25/4/22	\$14,000	\$0	\$14,000											
260	2.1.1.2.3.1		Realización de actividades según TdR	394 days	Wed 21/10/20	Mon 25/4/22	\$14,000	\$0	\$14,000	Firma Consultora										
261	2.1.1.1.3		Asistencia Técnica especializada	958 days	Mon 1/6/20	Wed 31/1/24	\$40,000	\$0	\$40,000											
262	2.1.1.1.3.1		3CV_50. Asesoría especializada para el diseño y desarrollo de estrategias de implementación de productos de transformación digital del Gobierno	574 days	Mon 1/6/20	Thu 11/8/22	\$40,000	\$0	\$40,000											
263	2.1.1.1.3.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
264	2.1.1.1.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
265	2.1.1.1.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
266	2.1.1.1.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
267	2.1.1.1.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
268	2.1.1.1.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
269	2.1.1.1.3.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
270	2.1.1.1.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
271	2.1.1.1.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
272	2.1.1.1.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
273	2.1.1.1.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
274	2.1.1.1.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
275	2.1.1.1.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
276	2.1.1.1.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
277	2.1.1.1.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	3rd Quarter Mar	3rd Quarter May	3rd Quarter Jul	1st Quarter Sep	1st Quarter Nov	3rd Quarter Jan	3rd Quarter Mar	1st Quarter May
278	2.1.1.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
279	2.1.1.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
280	2.1.1.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
281	2.1.1.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
282	2.1.1.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	524 days	Mon 10/8/20	Thu 11/8/22	\$40,000	\$0	\$40,000											
283	2.1.1.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	524 days	Mon 10/8/20	Thu 11/8/22	\$40,000	\$0	\$40,000	Firma Consultora										
285	2.1.1.4		Incorporación de RRHH incremental	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$120,000	\$0	\$120,000											
286	2.1.1.4.1		3CV_51. Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 1	835 days	Mon 1/6/20	Fri 11/8/23	\$120,000	\$0	\$120,000											
287	2.1.1.4.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
288	2.1.1.4.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
289	2.1.1.4.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
290	2.1.1.4.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
291	2.1.1.4.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
292	2.1.1.4.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
293	2.1.1.4.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
294	2.1.1.4.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
295	2.1.1.4.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
296	2.1.1.4.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
297	2.1.1.4.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
298	2.1.1.4.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
299	2.1.1.4.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
300	2.1.1.4.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
301	2.1.1.4.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
302	2.1.1.4.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
303	2.1.1.4.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
304	2.1.1.4.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
305	2.1.1.4.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
306	2.1.1.4.1.3		Etapas de ejecución del contrato	785 days	Mon 10/8/20	Fri 11/8/23	\$120,000	\$0	\$120,000											
307	2.1.1.4.1.3.1		Desarrollo de los servicios	785 days	Mon 10/8/20	Fri 11/8/23	\$120,000	\$0	\$120,000	Consultor										
308	2.1.1.4.2		3CV_52. Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 2	833 days	Mon 23/11/20	Wed 31/1/24	\$0	\$0	\$0											
309	2.1.1.4.2.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/11/20	Thu 10/12/20	\$0	\$0	\$0											
310	2.1.1.4.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
311	2.1.1.4.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/11/20	Wed 2/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
312	2.1.1.4.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 3/12/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
313	2.1.1.4.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 4/12/20	Thu 10/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
314	2.1.1.4.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 10/12/20	Thu 10/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
315	2.1.1.4.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 11/12/20	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0											
316	2.1.1.4.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 11/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
317	2.1.1.4.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 15/12/20	Mon 28/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
318	2.1.1.4.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 28/12/20	Mon 28/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
319	2.1.1.4.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 29/12/20	Mon 4/1/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
320	2.1.1.4.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/1/21	Tue 5/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
321	2.1.1.4.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0	BID										
322	2.1.1.4.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0	BID										
323	2.1.1.4.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/1/21	Thu 14/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
324	2.1.1.4.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 15/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
325	2.1.1.4.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/1/21	Fri 22/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
326	2.1.1.4.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/1/21	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
327	2.1.1.4.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/1/21	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0											
352	2.1.1.5		Provisión de equipamiento	418 days	Mon 10/8/20	Wed 16/3/22	\$30,000	\$0	\$30,000											
353	2.1.1.5.1		CM_3. Provisión de equipamiento mobiliario - Grupo 1	32 days	Mon 10/8/20	Tue 22/9/20	\$12,000	\$0	\$12,000											
354	2.1.1.5.1.1		Etapas de contratación	10 days	Mon 10/8/20	Fri 21/8/20	\$0	\$0	\$0											
355	2.1.1.5.1.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
356	2.1.1.5.1.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 17/8/20	Fri 21/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
357	2.1.1.5.1.2		Ejecución del contrato	22 days	Mon 24/8/20	Tue 22/9/20	\$12,000	\$0	\$12,000											
358	2.1.1.5.1.2.1		Provisión de mobiliario	22 days	Mon 24/8/20	Tue 22/9/20	\$12,000	\$0	\$12,000	Proveedor										
361	2.1.1.5.4		CM_4. Provisión de equipamiento informático - Grupo 1	32 days	Mon 10/8/20	Tue 22/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000											
362	2.1.1.5.4.1		Etapas de contratación	10 days	Mon 10/8/20	Fri 21/8/20	\$0	\$0	\$0											
363	2.1.1.5.4.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
364	2.1.1.5.4.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 17/8/20	Fri 21/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
365	2.1.1.5.4.2		Ejecución del contrato	22 days	Mon 24/8/20	Tue 22/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000											
366	2.1.1.5.4.2.1		Provisión de mobiliario	22 days	Mon 24/8/20	Tue 22/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000	Proveedor										
371	2.1.2	P5	Producto 5: Estrategia de Gestión del Cambio y Comunicación diseñada e implementada	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$108,300	\$0	\$108,300											
372	2.1.2.1		Asistencia técnica en Gestión del Cambio	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$54,900	\$0	\$54,900											
373	2.1.2.1.1		3CV_54. Contratación de especialista en Gestión del Cambio	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600											
374	2.1.2.1.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
375	2.1.2.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
376	2.1.2.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
377	2.1.2.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
378	2.1.2.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
379	2.1.2.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
380	2.1.2.1.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
381	2.1.2.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
382	2.1.2.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
383	2.1.2.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
384	2.1.2.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
385	2.1.2.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
386	2.1.2.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
387	2.1.2.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
388	2.1.2.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
389	2.1.2.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
390	2.1.2.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
391	2.1.2.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
392	2.1.2.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
393	2.1.2.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600											
394	2.1.2.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600	Consultor										
395	2.1.2.1.1.3.2		Hito 1: Estrategia y Plan de Gestión del cambio diseñada	0 days	Fri 29/1/21	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0											
396	2.1.2.1.2		Actividades de implementación de la Gestión del Cambio	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$4,500	\$0	\$4,500	Especialista en Gestión del C										
397	2.1.2.1.3		Otros	386 days	Mon 10/8/20	Mon 31/1/22	\$16,800	\$0	\$16,800											
398	2.1.2.2		Asistencia técnica para gestión de las comunicaciones	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$53,400	\$0	\$53,400											
399	2.1.2.2.1		3CV_55. Contratación de especialista en Comunicación del Programa	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600											
400	2.1.2.2.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
401	2.1.2.2.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
402	2.1.2.2.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
403	2.1.2.2.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
404	2.1.2.2.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
405	2.1.2.2.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
406	2.1.2.2.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
407	2.1.2.2.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
408	2.1.2.2.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
409	2.1.2.2.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
410	2.1.2.2.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
411	2.1.2.2.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
412	2.1.2.2.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
413	2.1.2.2.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
414	2.1.2.2.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
415	2.1.2.2.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
416	2.1.2.2.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
417	2.1.2.2.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
418	2.1.2.2.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
419	2.1.2.2.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600											
420	2.1.2.2.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600	Consultor										
421	2.1.2.2.1.3.2		Hito 1: Estrategia y Plan de Comunicación diseñada	0 days	Fri 29/1/21	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0											
422	2.1.2.2.2		Actividades de implementación de las comunicaciones del Programa	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$3,000	\$0	\$3,000	Especialista en Comunicaciones										
424	2.1.2.2.4		Otros	386 days	Mon 10/8/20	Mon 31/1/22	\$16,800	\$0	\$16,800											
425	2.1.3	P6	Producto 6: Servicios a ciudadanos y empresas priorizados, digitalizados y simplificados	1219 days	Mon 1/6/20	Thu 30/1/25	\$10,000	\$0	\$10,000											
426	2.1.3.1		3CV_56. Elaboración del diseño metodológico del procedimiento administrativo, modelo de datos para inteligencia de negocios, simplificación y digitalización	269 days	Mon 1/6/20	Thu 10/6/21	\$10,000	\$0	\$10,000											
427	2.1.3.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
428	2.1.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
429	2.1.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
430	2.1.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
431	2.1.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
432	2.1.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				18/6							
433	2.1.3.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
434	2.1.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
435	2.1.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
436	2.1.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				6/7							
437	2.1.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
438	2.1.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
439	2.1.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
440	2.1.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
441	2.1.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
442	2.1.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
443	2.1.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
444	2.1.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
445	2.1.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
446	2.1.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	219 days	Mon 10/8/20	Thu 10/6/21	\$10,000	\$0	\$10,000												
447	2.1.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	219 days	Mon 10/8/20	Thu 10/6/21	\$10,000	\$0	\$10,000	Consultor											
577	2.1.4	P7	Producto 7: Servicios de back office, tanto verticales como compartidos, priorizados, digitalizados y simplificados	1372 days	Thu 30/5/19	Fri 30/8/24	\$17,000	\$0	\$17,000												
578	2.1.4.1		Implementación del marco de interoperabilidad	1060 days	Mon 10/8/20	Fri 30/8/24	\$17,000	\$0	\$17,000												
579	2.1.4.1.1		3CV_59. Desarrollo de un inventario de situación, bases de datos e intercambios de información a traves de web service	182 days	Mon 10/8/20	Tue 20/4/21	\$5,000	\$0	\$5,000												
580	2.1.4.1.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0												
581	2.1.4.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
582	2.1.4.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
583	2.1.4.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
584	2.1.4.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
585	2.1.4.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
586	2.1.4.1.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0												
587	2.1.4.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
588	2.1.4.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
589	2.1.4.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				14/9							
590	2.1.4.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
591	2.1.4.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
592	2.1.4.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
593	2.1.4.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
594	2.1.4.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
595	2.1.4.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
596	2.1.4.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
597	2.1.4.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
598	2.1.4.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
599	2.1.4.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$5,000	\$0	\$5,000											
600	2.1.4.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$5,000	\$0	\$5,000	Consultor										
601	2.1.4.1.2		3CV_60. Coordinación interinstitucional y dar asistencia técnica a instituciones	182 days	Mon 10/8/20	Tue 20/4/21	\$6,000	\$0	\$6,000											
602	2.1.4.1.2.1		Etapas previas	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0											
603	2.1.4.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
604	2.1.4.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
605	2.1.4.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
606	2.1.4.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
607	2.1.4.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
608	2.1.4.1.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
609	2.1.4.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
610	2.1.4.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
611	2.1.4.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
612	2.1.4.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
613	2.1.4.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
614	2.1.4.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
615	2.1.4.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
616	2.1.4.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
617	2.1.4.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
618	2.1.4.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
619	2.1.4.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
620	2.1.4.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
621	2.1.4.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$6,000	\$0	\$6,000											
622	2.1.4.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$6,000	\$0	\$6,000	Consultor										
623	2.1.4.1.3		3CV_61. Elaboración del Esquema de Gobernanza	182 days	Mon 10/8/20	Tue 20/4/21	\$6,000	\$0	\$6,000											
624	2.1.4.1.3.1		Etapas previas	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0											
625	2.1.4.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
626	2.1.4.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
627	2.1.4.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
628	2.1.4.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
629	2.1.4.1.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
630	2.1.4.1.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
631	2.1.4.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
632	2.1.4.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
633	2.1.4.1.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
634	2.1.4.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
635	2.1.4.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
636	2.1.4.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
637	2.1.4.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
638	2.1.4.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
639	2.1.4.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
640	2.1.4.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
641	2.1.4.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
642	2.1.4.1.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
643	2.1.4.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$6,000	\$0	\$6,000											
644	2.1.4.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$6,000	\$0	\$6,000	Consultor										
645	2.1.4.1.4		SBCC_24. Elaboración de una aplicación para usuarios pequeños, la plataforma de Interoperabilidad y la incorporación de los diferentes organismos a la plataforma	1060 days	Mon 10/8/20	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0											
646	2.1.4.1.4.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Mon 10/8/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0											
647	2.1.4.1.4.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
648	2.1.4.1.4.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 17/8/20	Mon 17/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
649	2.1.4.1.4.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 18/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
650	2.1.4.1.4.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 24/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
651	2.1.4.1.4.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 25/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
652	2.1.4.1.4.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 26/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
653	2.1.4.1.4.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras inter	10 days	Thu 27/8/20	Wed 9/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
654	2.1.4.1.4.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 10/9/20	Thu 10/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
655	2.1.4.1.4.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 11/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
656	2.1.4.1.4.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 10/8/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
657	2.1.4.1.4.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 23/9/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
658	2.1.4.1.4.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 24/9/20	Thu 24/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
659	2.1.4.1.4.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 25/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID										
660	2.1.4.1.4.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 1/10/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID										
661	2.1.4.1.4.2		Etapas de Contratación	103 days	Fri 2/10/20	Tue 23/2/21	\$0	\$0	\$0											
662	2.1.4.1.4.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publi	10 days	Fri 2/10/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
663	2.1.4.1.4.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 15/10/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
664	2.1.4.1.4.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 16/10/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
665	2.1.4.1.4.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 16/11/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
666	2.1.4.1.4.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Tue 17/11/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
667	2.1.4.1.4.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe c	1 day	Tue 8/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
668	2.1.4.1.4.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 8/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
669	2.1.4.1.4.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 9/12/20	Wed 9/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
670	2.1.4.1.4.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 10/12/20	Wed 16/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
671	2.1.4.1.4.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 16/12/20	Wed 16/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
672	2.1.4.1.4.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 16/12/20	Wed 16/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
673	2.1.4.1.4.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 17/12/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
674	2.1.4.1.4.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Thu 31/12/20	Wed 6/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
675	2.1.4.1.4.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 6/1/21	Wed 6/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
676	2.1.4.1.4.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe c	1 day	Thu 7/1/21	Thu 7/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
677	2.1.4.1.4.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 8/1/21	Fri 8/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
678	2.1.4.1.4.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 11/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0	BID										
679	2.1.4.1.4.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 15/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0	BID										
680	2.1.4.1.4.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 18/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
681	2.1.4.1.4.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 19/1/21	Mon 25/1/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
682	2.1.4.1.4.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Tue 26/1/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
771	2.1.4.5		3CV_64. Selección y puesta en marcha de herramienta de analítica	1160 days	Thu 30/5/19	Wed 8/11/23	\$0	\$0	\$0											
791	2.1.4.5.3		Etapas de ejecución del contrato	1160 days	Thu 30/5/19	Wed 8/11/23	\$0	\$0	\$0											
793	2.1.4.5.3.2		Herramienta analítica implementada	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0											
966	2.1.7	P10	Producto 10: Seguridad de activos digitales gubernamentales fortalecida	897 days	Mon 10/8/20	Tue 16/1/24	\$0	\$0	\$0											

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
967	2.1.7.1		SCC_26. Realización de Campañas enfocadas en crear conciencia sobre buenas prácticas y / o riesgos de seguridad para los ciudadanos y eventos de ciberseguridad.	364 days	Mon 10/8/20	Thu 30/12/21	\$0	\$0	\$0											
968	2.1.7.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 10/8/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0											
969	2.1.7.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
970	2.1.7.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 17/8/20	Mon 17/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
971	2.1.7.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 18/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
972	2.1.7.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 24/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0											
973	2.1.7.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 25/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
974	2.1.7.1.1.6		<i>Expresión de Interés publicada</i>	0 days	Wed 26/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
975	2.1.7.1.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 27/8/20	Wed 9/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
976	2.1.7.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 10/9/20	Thu 10/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
977	2.1.7.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 11/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
978	2.1.7.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 10/8/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
979	2.1.7.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 23/9/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
980	2.1.7.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 24/9/20	Thu 24/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
981	2.1.7.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 25/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID										
982	2.1.7.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 1/10/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID										
983	2.1.7.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 2/10/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0											
984	2.1.7.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 2/10/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
985	2.1.7.1.2.2		<i>Llamado publicado</i>	0 days	Thu 8/10/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
986	2.1.7.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 9/10/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
987	2.1.7.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 9/11/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
988	2.1.7.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 10/11/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
989	2.1.7.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 24/11/20	Thu 26/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
990	2.1.7.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 26/11/20	Thu 26/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
991	2.1.7.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 27/11/20	Mon 30/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
992	2.1.7.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 1/12/20	Tue 1/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
993	2.1.7.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 2/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
994	2.1.7.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 8/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
995	2.1.7.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 9/12/20	Wed 9/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
996	2.1.7.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 10/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
997	2.1.7.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 14/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
998	2.1.7.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 15/12/20	Mon 21/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
999	2.1.7.1.2.16		<i>Contrato firmado</i>	0 days	Mon 21/12/20	Mon 21/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
1000	2.1.7.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 22/12/20	Tue 22/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1001	2.1.7.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 23/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato										
1002	2.1.7.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 29/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1003	2.1.7.1.3		Ejecución del contrato	262 days	Wed 30/12/20	Thu 30/12/21	\$0	\$0	\$0											
1004	2.1.7.1.3.1		Realización de actividades según TdR	262 days	Wed 30/12/20	Thu 30/12/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1005	2.1.7.2		SCC_27. Fortalecimiento de la seguridad del Data Center y Evaluación de la seguridad de los sistemas de activos digitales gubernamentales mediante un Penetration Test	897 days	Mon 10/8/20	Tue 16/1/24	\$0	\$0	\$0											
1006	2.1.7.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 10/8/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0											
1007	2.1.7.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1008	2.1.7.2.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 17/8/20	Mon 17/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
1009	2.1.7.2.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 18/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1010	2.1.7.2.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 24/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0											
1011	2.1.7.2.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 25/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1012	2.1.7.2.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 26/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1013	2.1.7.2.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 27/8/20	Wed 9/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1014	2.1.7.2.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 10/9/20	Thu 10/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1015	2.1.7.2.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 11/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1016	2.1.7.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 10/8/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1017	2.1.7.2.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 23/9/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1018	2.1.7.2.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 24/9/20	Thu 24/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1019	2.1.7.2.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 25/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1020	2.1.7.2.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 1/10/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1021	2.1.7.2.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 2/10/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0											
1022	2.1.7.2.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 2/10/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1023	2.1.7.2.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 8/10/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1024	2.1.7.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 9/10/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
1025	2.1.7.2.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 9/11/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1026	2.1.7.2.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 10/11/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1027	2.1.7.2.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 24/11/20	Thu 26/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1028	2.1.7.2.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 26/11/20	Thu 26/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1029	2.1.7.2.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 27/11/20	Mon 30/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1030	2.1.7.2.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 1/12/20	Tue 1/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1031	2.1.7.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 2/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1032	2.1.7.2.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 8/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1033	2.1.7.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 9/12/20	Wed 9/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1034	2.1.7.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 10/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1035	2.1.7.2.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 14/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1036	2.1.7.2.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 15/12/20	Mon 21/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1037	2.1.7.2.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 21/12/20	Mon 21/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
1038	2.1.7.2.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 22/12/20	Tue 22/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1039	2.1.7.2.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 23/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato										
1040	2.1.7.2.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 29/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1041	2.1.7.2.3		Ejecución del contrato	792 days	Mon 4/1/21	Tue 16/1/24	\$0	\$0	\$0											
1042	2.1.7.2.3.1		Realización de actividades según TdR	792 days	Mon 4/1/21	Tue 16/1/24	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1048	2.1.8	P11	Producto 11: Plataforma de HonduCompras 2.0 ampliada	1198 days	Wed 1/7/20	Fri 31/1/25	\$0	\$0	\$0											
1049	2.1.8.1		Plan de Fortalecimiento de ONCAE diseñado e implementado	859 days	Wed 1/7/20	Mon 16/10/23	\$0	\$0	\$0											
1050	2.1.8.1.1	GRP - Act. #1.10	La SCGG se abocará a implementar la nueva estrategia y plan de gestion de ONCAE (a elaborarse al inicio del proyecto), incluyendo el fortalecimiento de los recursos humanos.	23 days	Wed 1/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	SEFIN;SCGG;DPTMGD										
1051	2.1.8.1.2		3CV_67. Diagnóstico y elaboración del Plan maestro TI y Plan de Fortalecimiento para la ONCAE	182 days	Mon 11/1/21	Tue 21/9/21	\$0	\$0	\$0											
1052	2.1.8.1.2.1		Etapla previa	14 days	Mon 11/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0											
1053	2.1.8.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 11/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1054	2.1.8.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 18/1/21	Wed 20/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1055	2.1.8.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 21/1/21	Thu 21/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
1056	2.1.8.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 22/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
1057	2.1.8.1.2.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	0 days	Thu 28/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
1058	2.1.8.1.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 29/1/21	Fri 19/3/21	\$0	\$0	\$0												
1059	2.1.8.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 29/1/21	Mon 1/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1098	2.1.8.2		Plataforma Honducompras 2.0 ampliado	1198 days	Wed 1/7/20	Fri 31/1/25	\$0	\$0	\$0												
1195	2.1.8.2.3	GRP - Act. #1.9	SEFIN y SCGG coordinarán para vincular el uso de HonduCompras con el SIAFI, vinculando el uso de HonduCompras a la disponibilidad de los recursos respectivos en el presupuesto.	393 days	Wed 1/7/20	Fri 31/12/21	\$0	\$0	\$0	DPTMGD											
1222	2.1.9	P12	Producto 12: Actividades de sensibilización y alfabetización digital realizadas	1140 days	Mon 10/8/20	Fri 20/12/24	\$10,000	\$0	\$10,000												
1223	2.1.9.1		3CV_70. Elaboración de un diseño de estrategia de comunicación, sensibilización y alfabetización digital	138 days	Mon 10/8/20	Wed 17/2/21	\$10,000	\$0	\$10,000												
1224	2.1.9.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0												
1225	2.1.9.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1226	2.1.9.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1227	2.1.9.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1228	2.1.9.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1229	2.1.9.1.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1230	2.1.9.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0												
1231	2.1.9.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1232	2.1.9.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1233	2.1.9.1.2.3		<i>Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones</i>	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1234	2.1.9.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1235	2.1.9.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1236	2.1.9.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1237	2.1.9.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1238	2.1.9.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1239	2.1.9.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1240	2.1.9.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1241	2.1.9.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
1242	2.1.9.1.2.12		<i>Contrato firmado</i>	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0												
1243	2.1.9.1.3		Etapas de ejecución del contrato	88 days	Mon 19/10/20	Wed 17/2/21	\$10,000	\$0	\$10,000												
1244	2.1.9.1.3.1		Desarrollo de los servicios	88 days	Mon 19/10/20	Wed 17/2/21	\$10,000	\$0	\$10,000	Consultor											
1245	2.1.9.2		LPI_17. Servicio de organización de eventos, talleres digitales, ferias y actividades de difusión digital	925 days	Mon 10/8/20	Fri 23/2/24	\$0	\$0	\$0												
1246	2.1.9.2.1		Etapas previas	36 days	Mon 10/8/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0												
1247	2.1.9.2.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
1248	2.1.9.2.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 17/8/20	Fri 11/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1249	2.1.9.2.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 14/9/20	Fri 18/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1250	2.1.9.2.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 21/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1251	2.1.9.2.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 22/9/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1252	2.1.9.2.1.6		<i>DDL con No Objeción del BID emitida</i>	0 days	Mon 28/9/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1253	2.1.9.2.2		Etapas de Contratación	104 days	Tue 29/9/20	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0												
1254	2.1.9.2.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 29/9/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1255	2.1.9.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
1256	2.1.9.2.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 6/10/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1257	2.1.9.2.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 17/11/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1258	2.1.9.2.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 7/12/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1259	2.1.9.2.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Tue 8/12/20	Mon 28/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1260	2.1.9.2.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 29/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1261	2.1.9.2.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 29/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1262	2.1.9.2.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 30/12/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1263	2.1.9.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 31/12/20	Wed 6/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
1264	2.1.9.2.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 6/1/21	Wed 6/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
1265	2.1.9.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 7/1/21	Thu 7/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1266	2.1.9.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 8/1/21	Thu 14/1/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1267	2.1.9.2.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 14/1/21	Thu 14/1/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1268	2.1.9.2.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 15/1/21	Thu 21/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1269	2.1.9.2.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Fri 22/1/21	Thu 11/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1277	2.2		Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de la gestión financiera del Estado	1115 days	Thu 20/6/19	Wed 27/9/23	\$1,089,760		\$0 \$1,089,760												
1278	2.2.1	P13	Producto 13: Infraestructura del SIAFI actualizada	1115 days	Thu 20/6/19	Wed 27/9/23	\$1,089,760		\$0 \$1,089,760												
1279	2.2.1.1		Actividades preliminares	577 days	Thu 20/6/19	Fri 3/9/21	\$208,040		\$0 \$208,040												
1280	2.2.1.1.1		SBCC_30. Capacitación y certificación de procesos en base a Cobit 5	577 days	Thu 20/6/19	Fri 3/9/21	\$165,000		\$0 \$165,000												
1281	2.2.1.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Thu 20/6/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0												
1282	2.2.1.1.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Thu 20/6/19	Wed 26/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1283	2.2.1.1.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Thu 27/6/19	Thu 27/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1284	2.2.1.1.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Fri 28/6/19	Thu 4/7/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1285	2.2.1.1.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 4/7/19	Thu 4/7/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1286	2.2.1.1.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Fri 5/7/19	Mon 8/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1287	2.2.1.1.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Mon 8/7/19	Mon 8/7/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1288	2.2.1.1.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Tue 9/7/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1289	2.2.1.1.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 23/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1290	2.2.1.1.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Wed 24/7/19	Tue 30/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1291	2.2.1.1.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Thu 20/6/19	Mon 5/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1292	2.2.1.1.1.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 5/8/19	Mon 5/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1293	2.2.1.1.1.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 6/8/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1294	2.2.1.1.1.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 7/8/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1295	2.2.1.1.1.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 13/8/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1296	2.2.1.1.1.2		Etapas de Contratación	103 days	Wed 14/8/19	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0												
1297	2.2.1.1.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	10 days	Wed 14/8/19	Tue 27/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1298	2.2.1.1.1.2.2		Llamado publicado	0 days	Tue 27/8/19	Tue 27/8/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1299	2.2.1.1.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 28/8/19	Thu 26/9/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1300	2.2.1.1.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Thu 26/9/19	Thu 26/9/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1301	2.2.1.1.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Fri 27/9/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1302	2.2.1.1.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1303	2.2.1.1.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1304	2.2.1.1.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 21/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1305	2.2.1.1.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 22/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1306	2.2.1.1.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1307	2.2.1.1.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1308	2.2.1.1.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Tue 29/10/19	Mon 11/11/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1309	2.2.1.1.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Tue 12/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1310	2.2.1.1.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 18/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1311	2.2.1.1.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 19/11/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1312	2.2.1.1.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Wed 20/11/19	Wed 20/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1313	2.2.1.1.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 21/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1314	2.2.1.1.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Wed 27/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1315	2.2.1.1.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 28/11/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1316	2.2.1.1.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 29/11/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1317	2.2.1.1.1.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Fri 6/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1318	2.2.1.1.1.2.22		Contrato firmado	0 days	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co											
1319	2.2.1.1.1.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 27/12/19	Fri 27/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1320	2.2.1.1.1.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 30/12/19	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1321	2.2.1.1.1.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 3/1/20	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1322	2.2.1.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	435 days	Mon 6/1/20	Fri 3/9/21	\$165,000	\$0	\$165,000												
1323	2.2.1.1.1.3.1		Realización de actividades según TdR	435 days	Mon 6/1/20	Fri 3/9/21	\$165,000	\$0	\$165,000	Firma Consultora											
1324	2.2.1.1.2		Capacitación equipo Gerencial de Udem/UIT Tecnologías Híbridas	306 days	Mon 6/1/20	Mon 8/3/21	\$15,040	\$0	\$15,040												
1325	2.2.1.1.3		Capacitación en ciencia de datos	306 days	Mon 6/1/20	Mon 8/3/21	\$28,000	\$0	\$28,000												
1326	2.2.1.2		Matriz de habilidades para Soportar el Proyecto	234 days	Thu 15/8/19	Tue 7/7/20	\$174,000	\$0	\$174,000												
1327	2.2.1.2.1		SCC_31. Asesoramiento de la arquitectura de software para la actualización del SIAFI	234 days	Thu 15/8/19	Tue 7/7/20	\$174,000	\$0	\$174,000												
1328	2.2.1.2.1.1		Expresión de interés y preparación de SP	39 days	Thu 15/8/19	Tue 8/10/19	\$0	\$0	\$0												
1329	2.2.1.2.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Thu 15/8/19	Wed 21/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1330	2.2.1.2.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Thu 22/8/19	Thu 22/8/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1331	2.2.1.2.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Fri 23/8/19	Thu 29/8/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1332	2.2.1.2.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 29/8/19	Thu 29/8/19	\$0	\$0	\$0												
1333	2.2.1.2.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Fri 30/8/19	Mon 2/9/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1334	2.2.1.2.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Mon 2/9/19	Mon 2/9/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1335	2.2.1.2.1.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Tue 3/9/19	Mon 16/9/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1336	2.2.1.2.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 17/9/19	Tue 17/9/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1337	2.2.1.2.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Wed 18/9/19	Tue 24/9/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1338	2.2.1.2.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Thu 15/8/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1339	2.2.1.2.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 30/9/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1340	2.2.1.2.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 1/10/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1341	2.2.1.2.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 2/10/19	Tue 8/10/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1342	2.2.1.2.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 8/10/19	Tue 8/10/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1343	2.2.1.2.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Wed 9/10/19	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0												
1344	2.2.1.2.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Wed 9/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1345	2.2.1.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 15/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1346	2.2.1.2.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 16/10/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1347	2.2.1.2.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Thu 14/11/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1348	2.2.1.2.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Fri 15/11/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1349	2.2.1.2.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Fri 29/11/19	Tue 3/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1350	2.2.1.2.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 3/12/19	Tue 3/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1351	2.2.1.2.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Wed 4/12/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1352	2.2.1.2.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 6/12/19	Fri 6/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1353	2.2.1.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 9/12/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1354	2.2.1.2.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 13/12/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1355	2.2.1.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 16/12/19	Mon 16/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1356	2.2.1.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Tue 17/12/19	Thu 19/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1357	2.2.1.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Thu 19/12/19	Thu 19/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1358	2.2.1.2.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Fri 20/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1359	2.2.1.2.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co											

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	May	1st Q
1360	2.2.1.2.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 27/12/19	Fri 27/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1361	2.2.1.2.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 30/12/19	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato												
1362	2.2.1.2.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 3/1/20	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1363	2.2.1.2.1.3		Ejecución del contrato	132 days	Mon 6/1/20	Tue 7/7/20	\$174,000	\$0	\$174,000													
1364	2.2.1.2.1.3.1		Realización de actividades según TdR	132 days	Mon 6/1/20	Tue 7/7/20	\$174,000	\$0	\$174,000	Firma Consultora												
1365	2.2.1.3		Ejecución del Sistema	578 days	Mon 1/7/19	Wed 15/9/21	\$707,720	\$0	\$707,720													
1366	2.2.1.3.1	GRP - Act. #1.5	SEFIN revisará el Plan de Modernización de las Finanzas Públicas, 2018-2022, para reforzar la coordinación interinstitucional, incluyendo estrategias de comunicación interna y externa y de gestión del cambio en general.	132 days	Mon 21/10/19	Tue 21/4/20	\$0	\$0	\$0	SEFIN (UDEM)												
1367	2.2.1.3.2	GRP - Act. #1.7	En el II semestre de 2019 se está procesando la inclusión del PMFP en el Sistema de Inversión Publica (SNIPH). (para contar con el financiamiento previsto para dicho plan con fondos del Tesoro)	132 days	Mon 1/7/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	SEFIN												
1368	2.2.1.3.3	GRP - Act. #1.6	La implementación de las estrategias definidas de comunicación interna y externa y de gestión del cambio serán supervisada por un comité de alto nivel, integrado por SEFIN, SP y SCGG.	366 days	Wed 22/4/20	Wed 15/9/21	\$0	\$0	\$0	SEFIN (UDEM)												
1369	2.2.1.3.4		LPI_7. Adquisición de Infraestructura para Ejecución del Proyecto, Seguridad del sistema, Framework de Desarrollo, Herramientas de Desarrollo y Herramientas de Testing	534 days	Mon 1/7/19	Thu 15/7/21	\$250,000	\$0	\$250,000													
1370	2.2.1.3.4.1		Etapas previas	36 days	Mon 1/7/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0													
1371	2.2.1.3.4.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 1/7/19	Fri 5/7/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica												
1372	2.2.1.3.4.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 8/7/19	Fri 2/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1373	2.2.1.3.4.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 5/8/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1374	2.2.1.3.4.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 12/8/19	Mon 12/8/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1375	2.2.1.3.4.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 13/8/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0	BID												
1376	2.2.1.3.4.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 19/8/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0	BID												
1377	2.2.1.3.4.2		Etapas de Contratación	104 days	Tue 20/8/19	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0													
1378	2.2.1.3.4.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 20/8/19	Mon 26/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1379	2.2.1.3.4.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 26/8/19	Mon 26/8/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones												
1380	2.2.1.3.4.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 27/8/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES												
1381	2.2.1.3.4.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 8/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES												
1382	2.2.1.3.4.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1383	2.2.1.3.4.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Tue 29/10/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1384	2.2.1.3.4.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 19/11/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1385	2.2.1.3.4.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 19/11/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1386	2.2.1.3.4.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 20/11/19	Wed 20/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1387	2.2.1.3.4.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 21/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	BID												
1388	2.2.1.3.4.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 27/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	BID												
1389	2.2.1.3.4.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 28/11/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1390	2.2.1.3.4.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 29/11/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1391	2.2.1.3.4.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 5/12/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1392	2.2.1.3.4.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 6/12/19	Thu 12/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1393	2.2.1.3.4.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Fri 13/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1394	2.2.1.3.4.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1395	2.2.1.3.4.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 3/1/20	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1396	2.2.1.3.4.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 6/1/20	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica												
1397	2.2.1.3.4.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 10/1/20	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministro de Economía												
1398	2.2.1.3.4.3		Ejecución del contrato	394 days	Mon 13/1/20	Thu 15/7/21	\$250,000	\$0	\$250,000													

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1399	2.2.1.3.4.3.1		Infraestructura tecnológica para Ejecución del Proyecto	132 days	Mon 13/1/20	Tue 14/7/20	\$250,000	\$0	\$250,000	Empresa contratada				Empresa contratada							
1400	2.2.1.3.4.3.2		Seguridad del Sistema	262 days	Wed 15/7/20	Thu 15/7/21	\$0	\$0	\$0	Empresa contratada				Empresa contratada							
1401	2.2.1.3.4.3.3		Framework de Desarrollo	88 days	Wed 15/7/20	Fri 13/11/20	\$0	\$0	\$0	Empresa contratada				Empresa contratada							
1402	2.2.1.3.4.3.4		Herramientas de Desarrollo	110 days	Wed 15/7/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0	Empresa contratada				Empresa contratada							
1403	2.2.1.3.4.3.5		Herramientas de Testing	110 days	Wed 15/7/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0	Empresa contratada				Empresa contratada							
1404	2.2.1.3.5		LPI_8. Adquisición de Infraestructura de Servidores para SIAFI-AnalitOperativ, Incremento de Licencias, Módulos y Licencias de Analítica Predictiva, Infraestructura para BigData y Actualización de Infraestructura de Comunicaciones y Seguridad Perimetral	338 days	Mon 1/6/20	Wed 15/9/21	\$337,720	\$0	\$337,720												
1405	2.2.1.3.5.1		Etapla previa	36 days	Mon 1/6/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0												
1406	2.2.1.3.5.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica				Área Técnica							
1407	2.2.1.3.5.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 8/6/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1408	2.2.1.3.5.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 6/7/20	Fri 10/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1409	2.2.1.3.5.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 13/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1410	2.2.1.3.5.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 14/7/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1411	2.2.1.3.5.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 20/7/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0	BID				20/7							
1412	2.2.1.3.5.2		Etapla de Contratación	104 days	Tue 21/7/20	Fri 11/12/20	\$0	\$0	\$0												
1413	2.2.1.3.5.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 21/7/20	Mon 27/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1414	2.2.1.3.5.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 27/7/20	Mon 27/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones				27/7							
1415	2.2.1.3.5.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 28/7/20	Mon 7/9/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES				OFERENTES							
1416	2.2.1.3.5.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 8/9/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES				OFERENTES							
1417	2.2.1.3.5.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 28/9/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				28/9							
1418	2.2.1.3.5.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Tue 29/9/20	Mon 19/10/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas							
1419	2.2.1.3.5.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1420	2.2.1.3.5.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				20/10							
1421	2.2.1.3.5.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 21/10/20	Wed 21/10/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1422	2.2.1.3.5.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 22/10/20	Wed 28/10/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1423	2.2.1.3.5.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 28/10/20	Wed 28/10/20	\$0	\$0	\$0	BID				28/10							
1424	2.2.1.3.5.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 29/10/20	Thu 29/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1425	2.2.1.3.5.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 30/10/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				Máxima Autoridad							
1426	2.2.1.3.5.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 5/11/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				5/11							
1427	2.2.1.3.5.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 6/11/20	Thu 12/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1428	2.2.1.3.5.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Fri 13/11/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1429	2.2.1.3.5.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 3/12/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				3/12							
1430	2.2.1.3.5.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 4/12/20	Fri 4/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1431	2.2.1.3.5.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 7/12/20	Fri 11/12/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica				Área Técnica							
1432	2.2.1.3.5.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 11/12/20	Fri 11/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr				11/12							
1433	2.2.1.3.5.3		Ejecución del contrato	198 days	Mon 14/12/20	Wed 15/9/21	\$337,720	\$0	\$337,720												
1436	2.2.1.3.5.3.3		Módulos y Licencias de Analítica Predictiva	88 days	Mon 14/12/20	Wed 14/4/21	\$25,000	\$0	\$25,000	Empresa contratada				Empresa contratada							
1437	2.2.1.3.5.3.4		Infraestructura para BigData	88 days	Mon 14/12/20	Wed 14/4/21	\$50,000	\$0	\$50,000	Empresa contratada				Empresa contratada							
1438	2.2.1.3.5.3.5		Actualización de Infraestructura de Comunicaciones y Seguridad Perimetral	154 days	Mon 14/12/20	Thu 15/7/21	\$262,720	\$0	\$262,720	Empresa contratada				Empresa contratada							
1439	2.2.1.3.6		SCC_32. Reconstrucción del Data Warehouse	256 days	Tue 1/10/19	Tue 22/9/20	\$120,000	\$0	\$120,000												
1440	2.2.1.3.6.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Tue 1/10/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0												
1441	2.2.1.3.6.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Tue 1/10/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1442	2.2.1.3.6.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Tue 8/10/19	Tue 8/10/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1443	2.2.1.3.6.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Wed 9/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1444	2.2.1.3.6.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 15/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0					15/10							

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1445	2.2.1.3.6.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Wed 16/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1446	2.2.1.3.6.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 17/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1447	2.2.1.3.6.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Fri 18/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1448	2.2.1.3.6.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 1/11/19	Fri 1/11/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1449	2.2.1.3.6.1.9		Selección de lista corta	5 days	Mon 4/11/19	Fri 8/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1450	2.2.1.3.6.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Tue 1/10/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1451	2.2.1.3.6.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Thu 14/11/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1452	2.2.1.3.6.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Fri 15/11/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1453	2.2.1.3.6.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Mon 18/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0	BID										
1454	2.2.1.3.6.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 22/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0	BID										
1455	2.2.1.3.6.2		Proceso de Contratación	63 days	Mon 25/11/19	Wed 19/2/20	\$0	\$0	\$0											
1456	2.2.1.3.6.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Mon 25/11/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1457	2.2.1.3.6.2.2		Llamado publicado	0 days	Fri 29/11/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1458	2.2.1.3.6.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 2/12/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
1459	2.2.1.3.6.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Tue 31/12/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1460	2.2.1.3.6.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Wed 1/1/20	Tue 14/1/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1461	2.2.1.3.6.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Wed 15/1/20	Fri 17/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1462	2.2.1.3.6.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Fri 17/1/20	Fri 17/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1463	2.2.1.3.6.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Mon 20/1/20	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1464	2.2.1.3.6.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Wed 22/1/20	Wed 22/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1465	2.2.1.3.6.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 23/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1466	2.2.1.3.6.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Wed 29/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1467	2.2.1.3.6.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 30/1/20	Thu 30/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1468	2.2.1.3.6.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Fri 31/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1469	2.2.1.3.6.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1470	2.2.1.3.6.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Wed 5/2/20	Tue 11/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1471	2.2.1.3.6.2.16		Contrato firmado	0 days	Tue 11/2/20	Tue 11/2/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Consultora										
1472	2.2.1.3.6.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Wed 12/2/20	Wed 12/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1473	2.2.1.3.6.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Thu 13/2/20	Wed 19/2/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato										
1474	2.2.1.3.6.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 19/2/20	Wed 19/2/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1475	2.2.1.3.6.3		Ejecución del contrato	154 days	Thu 20/2/20	Tue 22/9/20	\$120,000	\$0	\$120,000											
1476	2.2.1.3.6.3.1		Realización de actividades según TdR	154 days	Thu 20/2/20	Tue 22/9/20	\$120,000	\$0	\$120,000	Firma Consultora										
1510	3		Componente 3: Economía Digital	1394 days	Tue 1/10/19	Fri 31/1/25	\$478,375	\$0	\$478,375											
1511	3.1		Subcomponente 3.1: Ámbito Nacional	1340 days	Mon 16/12/19	Fri 31/1/25	\$89,375	\$0	\$89,375											
1558	3.1.2	P15	Producto 15: Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0											
1559	3.1.2.1		Personal del Proдите	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0											
1560	3.1.2.1.1		3CV_97. Contratación de Coordinador Académico	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0											
1561	3.1.2.1.1.1		Etapla previa	14 days	Mon 16/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0											
1562	3.1.2.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 16/12/19	Fri 20/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1563	3.1.2.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 23/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1564	3.1.2.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1565	3.1.2.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 27/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1566	3.1.2.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1567	3.1.2.1.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 3/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0											
1568	3.1.2.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 3/1/20	Mon 6/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202


ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1569	3.1.2.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 7/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1570	3.1.2.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 20/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1571	3.1.2.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1572	3.1.2.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1573	3.1.2.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1574	3.1.2.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1575	3.1.2.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 5/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1576	3.1.2.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 7/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1577	3.1.2.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 10/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1578	3.1.2.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 17/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
1579	3.1.2.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 21/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0												
1580	3.1.2.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0												
1581	3.1.2.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0	Consultor											
1582	3.1.2.1.2		3CV_98. Contratación de Administrador	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0												
1583	3.1.2.1.2.1		Etapas previas	14 days	Mon 16/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0												
1584	3.1.2.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 16/12/19	Fri 20/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1585	3.1.2.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 23/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1586	3.1.2.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1587	3.1.2.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 27/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1588	3.1.2.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1589	3.1.2.1.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 3/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0												
1590	3.1.2.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 3/1/20	Mon 6/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1591	3.1.2.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 7/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1592	3.1.2.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 20/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1593	3.1.2.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1594	3.1.2.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1595	3.1.2.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1596	3.1.2.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1597	3.1.2.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 5/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1598	3.1.2.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 7/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1599	3.1.2.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 10/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1600	3.1.2.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 17/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
1601	3.1.2.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 21/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0												
1602	3.1.2.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0												
1603	3.1.2.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0	Consultor											
1604	3.1.2.1.3		3CV_99. Contratación de Especialista en Emprendimientos	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0												
1605	3.1.2.1.3.1		Etapas previas	14 days	Mon 16/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0												
1606	3.1.2.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 16/12/19	Fri 20/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1607	3.1.2.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 23/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1608	3.1.2.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1609	3.1.2.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 27/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1610	3.1.2.1.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1611	3.1.2.1.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 3/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0												
1612	3.1.2.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 3/1/20	Mon 6/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1613	3.1.2.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 7/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1614	3.1.2.1.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 20/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1615	3.1.2.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1616	3.1.2.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1617	3.1.2.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1618	3.1.2.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1619	3.1.2.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 5/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1620	3.1.2.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 7/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1621	3.1.2.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 10/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1622	3.1.2.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 17/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
1623	3.1.2.1.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 21/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0												
1624	3.1.2.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0												
1625	3.1.2.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0	Consultor											
1634	3.1.3	P16	Producto 16: Incubadoras de emprendimientos financiadas	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0												
1635	3.1.3.1		Tr_96. Convenio con IHCIETI para la realización de las actividades de los subproyectos de incubación de emprendimientos y fomento del talento digital	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0												
1636	3.1.3.1.1		Convocatoria de Incubadoras	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0												
1637	3.1.3.1.1.1		Actividades para la transferencia de recursos	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0	UEP-SCGG IHCIETI											
1638	3.1.3.1.2		Formación de Formadores para incubadoras	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0												
1639	3.1.3.1.2.1		Actividades para la transferencia de recursos	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0	UEP-SCGG IHCIETI											
1640	3.1.3.1.3		Gestión y supervisión de Incubadoras	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0												
1641	3.1.3.1.3.1		Actividades para la transferencia de recursos	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0	UEP-SCGG IHCIETI											
1642	3.1.4	P17	Producto 17: Actividades de fomento al talento digital implementadas	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$89,375	\$0	\$89,375												
1643	3.1.4.1		Tr_96. Convenio con IHCIETI para la realización de las actividades de los subproyectos de incubación de emprendimientos y fomento del talento digital	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$89,375	\$0	\$89,375												
1644	3.1.4.1.1		Honducamp (Logística, materiales, ponentes)	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$35,731	\$0	\$35,731												
1645	3.1.4.1.1.1		Actividades para la transferencia de recursos	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$35,731	\$0	\$35,731	UEP-SCGG IHCIETI											
1646	3.1.4.1.2		Bootcamp (Logística, materiales, ponentes)	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$53,644	\$0	\$53,644												
1647	3.1.4.1.2.1		Actividades para la transferencia de recursos	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$53,644	\$0	\$53,644	UEP-SCGG IHCIETI											
1648	3.2		Subcomponente 3.2: Ámbito San Pedro Sula	1394 days	Tue 1/10/19	Fri 31/1/25	\$389,000	\$0	\$389,000												
1649	3.2.1	P18	Producto 18: Distrito Digital de SPS diseñado y construido	1394 days	Tue 1/10/19	Fri 31/1/25	\$222,000	\$0	\$222,000												
1650	3.2.1.1		Plan Maestro del Distrito Digital de SPS	470 days	Mon 21/10/19	Fri 6/8/21	\$150,000	\$0	\$150,000												
1651	3.2.1.1.1 GRP - Act. #1.11		SBCC_34. Realización del diagnóstico del ecosistema digital en SPS y conceptualización del Distrito Digital, así como la elaboración de los diseños del plan maestro y del modelo de gobernanza del Distrito Digital	470 days	Mon 21/10/19	Fri 6/8/21	\$150,000	\$0	\$150,000												
1652	3.2.1.1.1.1		Elaboración de Términos de Referencia	66 days	Mon 21/10/19	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Econ. Digital											
1653	3.2.1.1.1.2		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Tue 21/1/20	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0												
1654	3.2.1.1.1.2.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1655	3.2.1.1.1.2.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1656	3.2.1.1.1.2.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1657	3.2.1.1.1.2.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1658	3.2.1.1.1.2.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Wed 5/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1659	3.2.1.1.1.2.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 6/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1660	3.2.1.1.1.2.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras inter	10 days	Fri 7/2/20	Thu 20/2/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1661	3.2.1.1.1.2.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 21/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1662	3.2.1.1.1.2.9		Selección de lista corta	5 days	Mon 24/2/20	Fri 28/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1663	3.2.1.1.1.2.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Tue 21/1/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1664	3.2.1.1.1.2.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Thu 5/3/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1665	3.2.1.1.1.2.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Fri 6/3/20	Fri 6/3/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1666	3.2.1.1.1.2.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Mon 9/3/20	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1667	3.2.1.1.1.2.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 13/3/20	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1668	3.2.1.1.1.3		Etapas de Contratación	103 days	Mon 16/3/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0												
1669	3.2.1.1.1.3.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publ	10 days	Mon 16/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1670	3.2.1.1.1.3.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 27/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1671	3.2.1.1.1.3.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 30/3/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1672	3.2.1.1.1.3.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Tue 28/4/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1673	3.2.1.1.1.3.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Wed 29/4/20	Tue 19/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1674	3.2.1.1.1.3.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe c	1 day	Wed 20/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1675	3.2.1.1.1.3.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Wed 20/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1676	3.2.1.1.1.3.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Thu 21/5/20	Thu 21/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1677	3.2.1.1.1.3.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 22/5/20	Thu 28/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1678	3.2.1.1.1.3.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Thu 28/5/20	Thu 28/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1679	3.2.1.1.1.3.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Thu 28/5/20	Thu 28/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1680	3.2.1.1.1.3.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Fri 29/5/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1681	3.2.1.1.1.3.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1682	3.2.1.1.1.3.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1683	3.2.1.1.1.3.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe c	1 day	Fri 19/6/20	Fri 19/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1684	3.2.1.1.1.3.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Mon 22/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1685	3.2.1.1.1.3.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 23/6/20	Mon 29/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1686	3.2.1.1.1.3.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 29/6/20	Mon 29/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1687	3.2.1.1.1.3.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 30/6/20	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1688	3.2.1.1.1.3.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 1/7/20	Tue 7/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1689	3.2.1.1.1.3.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Wed 8/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1690	3.2.1.1.1.3.22		Contrato firmado	0 days	Tue 28/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co											
1691	3.2.1.1.1.3.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de códi	1 day	Wed 29/7/20	Wed 29/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1692	3.2.1.1.1.3.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Thu 30/7/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1693	3.2.1.1.1.3.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 5/8/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1694	3.2.1.1.1.4		Etapas de ejecución del contrato	262 days	Thu 6/8/20	Fri 6/8/21	\$150,000	\$0	\$150,000												
1695	3.2.1.1.1.4.1		Realización de actividades según TdR	262 days	Thu 6/8/20	Fri 6/8/21	\$150,000	\$0	\$150,000	Firma Consultora											
1697	3.2.1.1.2		Diseño, Construcción y Equipamiento del DD	1183 days	Tue 1/10/19	Thu 11/4/24	\$0	\$0	\$0												
1698	3.2.1.2.1	GRP - Act. #1.12	Se incluirá una cláusula especial en el Contrato de Préstamo para condicionar el inicio del proceso de licitación de la obra a la presentación de evidencia de propiedad del terreno por parte de la Alcaldía	54 days	Tue 1/10/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	SEFIN;BID											
1850	3.2.1.1.3		Gestión y Operación del DD	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$72,000	\$0	\$72,000												
1851	3.2.1.3.1		3CV_71. Contratación del Gerente del Distrito Digital	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$72,000	\$0	\$72,000												
1852	3.2.1.3.1.1		Etapas de ejecución del contrato	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
1853	3.2.1.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1854	3.2.1.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1855	3.2.1.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1856	3.2.1.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1857	3.2.1.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1858	3.2.1.3.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
1859	3.2.1.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1860	3.2.1.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

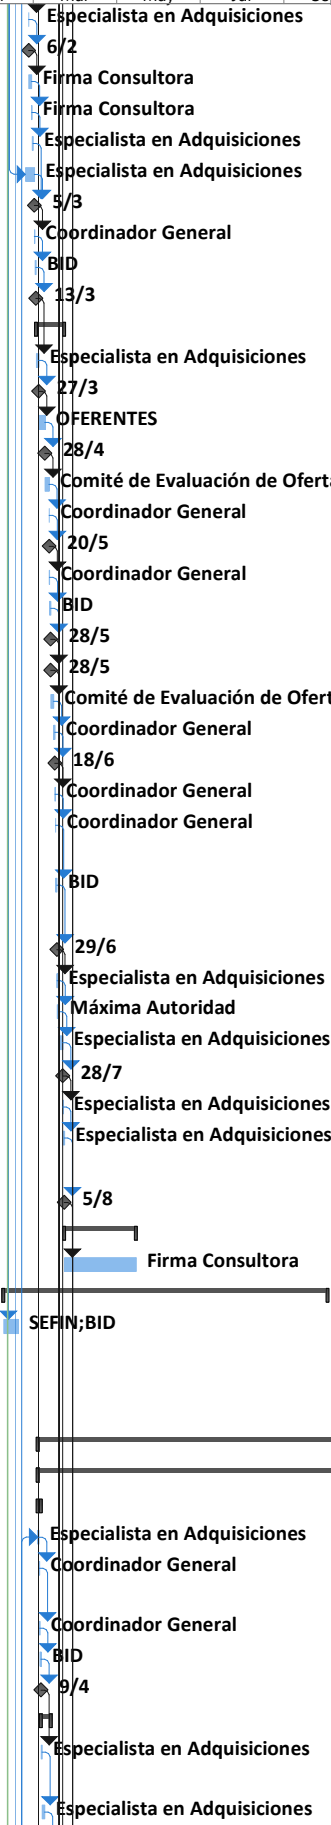

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1861	3.2.1.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				27/4							
1862	3.2.1.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1863	3.2.1.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1864	3.2.1.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1865	3.2.1.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1866	3.2.1.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1867	3.2.1.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1868	3.2.1.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1869	3.2.1.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
1870	3.2.1.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
1871	3.2.1.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$72,000	\$0	\$72,000												
1872	3.2.1.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$72,000	\$0	\$72,000	Consultor											
1874	3.2.2	P19	Producto 19: Centro de emprendimientos en SPS funcionando	697 days	Mon 1/6/20	Tue 31/1/23	\$20,000	\$0	\$20,000												
1875	3.2.2.1		3CV_72. Elaboración del diseño del Centro de Emprendimientos, incluye desarrollo de una encuesta de demanda, metodologías a aplicar para el desarrollo de emprendimientos, modelo de gestión y necesidades de capacitación, y diseño de portafolio de servicios	312 days	Mon 1/6/20	Tue 10/8/21	\$16,000	\$0	\$16,000												
1876	3.2.2.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
1877	3.2.2.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1878	3.2.2.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1879	3.2.2.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1880	3.2.2.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1881	3.2.2.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1882	3.2.2.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
1883	3.2.2.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1884	3.2.2.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1885	3.2.2.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1886	3.2.2.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1887	3.2.2.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1888	3.2.2.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1889	3.2.2.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1890	3.2.2.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1891	3.2.2.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1892	3.2.2.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1893	3.2.2.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
1894	3.2.2.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
1895	3.2.2.1.3		Etapas de ejecución del contrato	262 days	Mon 10/8/20	Tue 10/8/21	\$16,000	\$0	\$16,000												
1896	3.2.2.1.3.1		Desarrollo de los servicios	262 days	Mon 10/8/20	Tue 10/8/21	\$16,000	\$0	\$16,000	Consultor											
1898	3.2.2.3		3CV_73. Acompañamiento en la operación del Centro de Emprendimientos	574 days	Mon 1/6/20	Thu 11/8/22	\$4,000	\$0	\$4,000												


Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1899	3.2.2.3.1		Etapla previa	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
1900	3.2.2.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1901	3.2.2.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1902	3.2.2.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1903	3.2.2.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1904	3.2.2.3.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	<i>0 days</i>	<i>Thu 18/6/20</i>	<i>Thu 18/6/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	BID										
1905	3.2.2.3.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
1906	3.2.2.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1907	3.2.2.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1908	3.2.2.3.2.3		<i>Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones</i>	<i>0 days</i>	<i>Mon 6/7/20</i>	<i>Mon 6/7/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	Especialista en Adquisiciones										
1909	3.2.2.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1910	3.2.2.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1911	3.2.2.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1912	3.2.2.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	<i>Tue 21/7/20</i>	<i>Tue 21/7/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	BID										
1913	3.2.2.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1914	3.2.2.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1915	3.2.2.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1916	3.2.2.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
1917	3.2.2.3.2.12		<i>Contrato firmado</i>	<i>0 days</i>	<i>Fri 7/8/20</i>	<i>Fri 7/8/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>											
1918	3.2.2.3.3		Etapla de ejecución del contrato	524 days	Mon 10/8/20	Thu 11/8/22	\$4,000	\$0	\$4,000											
1919	3.2.2.3.3.1		Desarrollo de los servicios	524 days	Mon 10/8/20	Thu 11/8/22	\$4,000	\$0	\$4,000	Consultor										
1921	3.2.3	P20	Producto 20: Iniciativas de fomento al talento digital en SPS impulsadas	742 days	Mon 30/3/20	Tue 31/1/23	\$20,000	\$0	\$20,000											
1922	3.2.3.1		SCC_37. Realización de programas de especialización en tecnologías digitales, incluye plan curricular y capacitación	581 days	Wed 30/9/20	Wed 21/12/22	\$0	\$0	\$0											
1923	3.2.3.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Wed 30/9/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0											
1924	3.2.3.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 30/9/20	Tue 6/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1925	3.2.3.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Wed 7/10/20	Wed 7/10/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1926	3.2.3.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Thu 8/10/20	Wed 14/10/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1927	3.2.3.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	<i>Wed 14/10/20</i>	<i>Wed 14/10/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>											
1928	3.2.3.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Thu 15/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1929	3.2.3.1.1.6		<i>Expresión de Interés publicada</i>	<i>0 days</i>	<i>Fri 16/10/20</i>	<i>Fri 16/10/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	Portal de contrataciones										
1930	3.2.3.1.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Mon 19/10/20	Fri 30/10/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1931	3.2.3.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 2/11/20	Mon 2/11/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1932	3.2.3.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Tue 3/11/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1933	3.2.3.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Wed 30/9/20	Fri 13/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1934	3.2.3.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	<i>Fri 13/11/20</i>	<i>Fri 13/11/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	Especialista en Adquisiciones										
1935	3.2.3.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 16/11/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1936	3.2.3.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 17/11/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1937	3.2.3.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	<i>Mon 23/11/20</i>	<i>Mon 23/11/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	BID										
1938	3.2.3.1.2		Proceso de Contratación	62 days	Tue 24/11/20	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0											
1939	3.2.3.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 24/11/20	Mon 30/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										


Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1940	3.2.3.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 30/11/20	Mon 30/11/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones				30/11						
1941	3.2.3.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 1/12/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
1942	3.2.3.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Wed 30/12/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				30/12						
1943	3.2.3.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Thu 31/12/20	Wed 13/1/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1944	3.2.3.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Thu 14/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1945	3.2.3.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 18/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				18/1						
1946	3.2.3.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Tue 19/1/21	Wed 20/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1947	3.2.3.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Thu 21/1/21	Thu 21/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1948	3.2.3.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 22/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	BID										
1949	3.2.3.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 28/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	BID				28/1						
1950	3.2.3.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 29/1/21	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1960	3.2.3.2		LP_18. Realización de Bootcamps de programación y otras tecnologías digitales	742 days	Mon 30/3/20	Tue 31/1/23	\$20,000	\$0	\$20,000											
1961	3.2.3.2.1		Etapla previa	22 days	Mon 30/3/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0											
1962	3.2.3.2.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	Mon 30/3/20	Tue 31/3/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica										
1963	3.2.3.2.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	15 days	Wed 1/4/20	Tue 21/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1964	3.2.3.2.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 22/4/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1965	3.2.3.2.1.4		DDL elaborados	0 days	Tue 28/4/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	BID				28/4						
1966	3.2.3.2.2		Proceso de Contratación	48 days	Wed 29/4/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0											
1967	3.2.3.2.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	3 days	Wed 29/4/20	Fri 1/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1968	3.2.3.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 1/5/20	Fri 1/5/20	\$0	\$0	\$0	Portal de ocntrataciones				1/5						
1969	3.2.3.2.2.3		Periodo de preparación de ofertas	14 days	Mon 4/5/20	Thu 21/5/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
1970	3.2.3.2.2.4		Plazo de previsión para adendas	3 days	Fri 22/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
1971	3.2.3.2.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Tue 26/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				26/5						
1972	3.2.3.2.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Wed 27/5/20	Tue 2/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1973	3.2.3.2.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 days	Wed 3/6/20	Thu 4/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1974	3.2.3.2.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 4/6/20	Thu 4/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				4/6						
1975	3.2.3.2.2.9		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 5/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1976	3.2.3.2.2.10		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1977	3.2.3.2.2.11		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 10/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				10/6						
1978	3.2.3.2.2.12		Elaboración del borrador del contrato	2 days	Thu 11/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1979	3.2.3.2.2.13		Tramitación de la firma del Contrato	10 days	Mon 15/6/20	Fri 26/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1980	3.2.3.2.2.14		Contrato firmado	0 days	Fri 26/6/20	Fri 26/6/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				26/6						
1981	3.2.3.2.2.15		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Mon 29/6/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica										
1982	3.2.3.2.2.16		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 3/7/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministro				3/7						
1983	3.2.3.2.3		Ejecución del contrato	672 days	Mon 6/7/20	Tue 31/1/23	\$20,000	\$0	\$20,000											
1984	3.2.3.2.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	672 days	Mon 6/7/20	Tue 31/1/23	\$20,000	\$0	\$20,000	Empresa										
1986	3.2.4	P21	Producto 21: Actividades para la formación de capacidades en la aplicación del BIM en SPS realizadas	647 days	Mon 10/8/20	Tue 31/1/23	\$55,000	\$0	\$55,000											
1987	3.2.4.1		3CV_73. Elaboración de un diagnóstico de necesidades tecnológicas y elaboración de la metodología de implementación del BIM a nivel institucional	66 days	Mon 10/8/20	Mon 9/11/20	\$55,000	\$0	\$55,000											
1988	3.2.4.1.1		Etapla de ejecución del contrato	66 days	Mon 10/8/20	Mon 9/11/20	\$55,000	\$0	\$55,000											
1989	3.2.4.1.1.1		Desarrollo de los servicios	66 days	Mon 10/8/20	Mon 9/11/20	\$55,000	\$0	\$55,000	Consultor										
1990	3.2.4.2		3CV_74. Diseño del plan de capacitaciones para la aplicación del BIM	195 days	Tue 10/11/20	Mon 9/8/21	\$0	\$0	\$0											
1991	3.2.4.2.1		Etapla previa	14 days	Tue 10/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0											
1992	3.2.4.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Tue 10/11/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1993	3.2.4.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Tue 17/11/20	Thu 19/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1994	3.2.4.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 20/11/20	Fri 20/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1995	3.2.4.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Mon 23/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1996	3.2.4.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 27/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0	BID				27/11						
1997	3.2.4.2.2		Etapla de Contratación	49 days	Mon 30/11/20	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0											

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1998	3.2.4.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Mon 30/11/20	Tue 1/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1999	3.2.4.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Wed 2/12/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2000	3.2.4.2.2.3		<i>Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones</i>	0 days	Tue 15/12/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2001	3.2.4.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Wed 16/12/20	Tue 22/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2002	3.2.4.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Mon 11/1/21	Mon 11/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2003	3.2.4.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Tue 12/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2004	3.2.4.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Mon 18/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2005	3.2.4.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Tue 19/1/21	Wed 20/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2006	3.2.4.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Thu 21/1/21	Thu 21/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2007	3.2.4.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Fri 22/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2008	3.2.4.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Fri 29/1/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2036	3.2.5	P22	Producto 22: Centro de Control de Ciudad Inteligente (C3i) operando	1380 days	Mon 21/10/19	Fri 31/1/25	\$72,000	\$0	\$72,000												
2037	3.2.5.1		Elaboración de los TDRs para la contratación de la consultoria de Diseño del C3i y Red de Dispositivos	60 days	Mon 21/10/19	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	ASPS											
2038	3.2.5.2		Eje 1: Centro de Control de Ciudad Inteligente (C3i)	1320 days	Mon 13/1/20	Fri 31/1/25	\$72,000	\$0	\$72,000												
2039	3.2.5.2.1		Estudios de Preparación de Proyectos	1035 days	Mon 13/1/20	Fri 29/12/23	\$72,000	\$0	\$72,000												
2040	3.2.5.2.1.1		SBCC_38. Elaboración del diseño del C3i y Red de Dispositivos, incluye anteproyecto y Términos de Referencia	274 days	Mon 13/1/20	Thu 28/1/21	\$72,000	\$0	\$72,000												
2041	3.2.5.2.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Mon 13/1/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0												
2042	3.2.5.2.1.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 13/1/20	Fri 17/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2043	3.2.5.2.1.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 20/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2044	3.2.5.2.1.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2045	3.2.5.2.1.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 27/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2046	3.2.5.2.1.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 28/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2047	3.2.5.2.1.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 29/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2048	3.2.5.2.1.1.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras internacionales	10 days	Thu 30/1/20	Wed 12/2/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2049	3.2.5.2.1.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 13/2/20	Thu 13/2/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2050	3.2.5.2.1.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 14/2/20	Thu 20/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2051	3.2.5.2.1.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 13/1/20	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2052	3.2.5.2.1.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 26/2/20	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2053	3.2.5.2.1.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 27/2/20	Thu 27/2/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2054	3.2.5.2.1.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 28/2/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2055	3.2.5.2.1.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 5/3/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2056	3.2.5.2.1.1.2		Etapas de Contratación	103 days	Fri 6/3/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0												
2057	3.2.5.2.1.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	10 days	Fri 6/3/20	Thu 19/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2058	3.2.5.2.1.1.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 19/3/20	Thu 19/3/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2059	3.2.5.2.1.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 20/3/20	Mon 20/4/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2060	3.2.5.2.1.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 20/4/20	Mon 20/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2061	3.2.5.2.1.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Tue 21/4/20	Mon 11/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2062	3.2.5.2.1.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2063	3.2.5.2.1.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2064	3.2.5.2.1.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 13/5/20	Wed 13/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2065	3.2.5.2.1.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 14/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2066	3.2.5.2.1.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 20/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2067	3.2.5.2.1.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 20/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

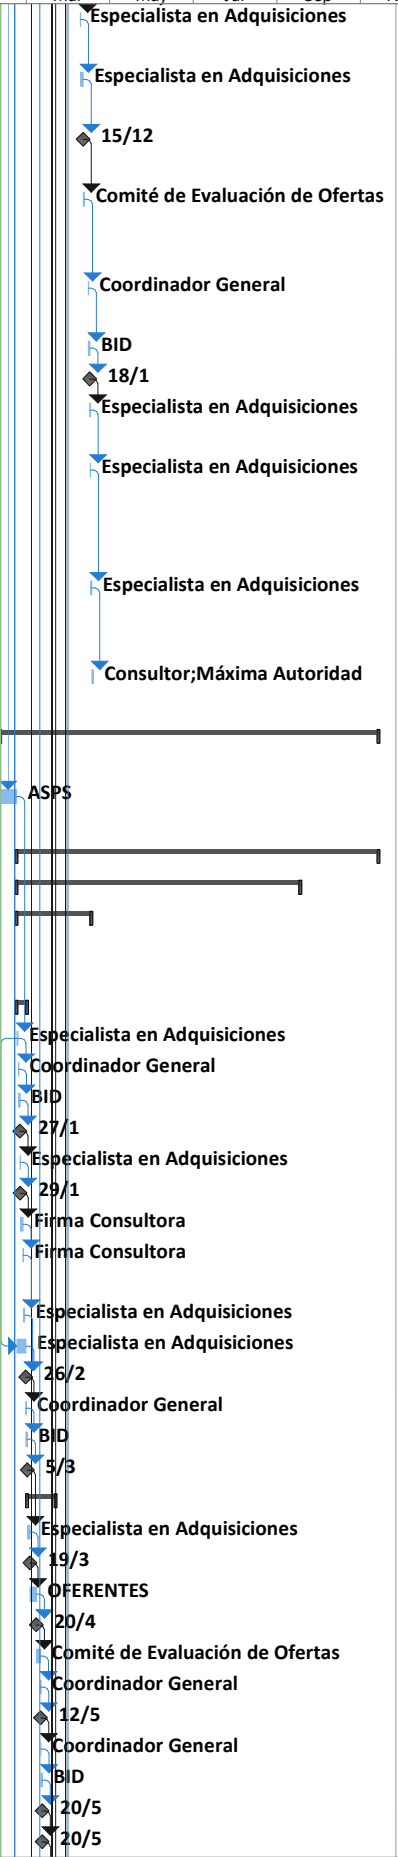

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
2068	.2.5.2.1.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 21/5/20	Wed 3/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2069	.2.5.2.1.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Thu 4/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2070	.2.5.2.1.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 10/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2071	.2.5.2.1.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2072	.2.5.2.1.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 12/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2073	.2.5.2.1.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 15/6/20	Fri 19/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2074	.2.5.2.1.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 19/6/20	Fri 19/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2075	.2.5.2.1.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 22/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2076	.2.5.2.1.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 23/6/20	Mon 29/6/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2077	.2.5.2.1.1.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Tue 30/6/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2078	.2.5.2.1.1.2.22		Contrato firmado	0 days	Mon 20/7/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co											
2079	.2.5.2.1.1.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de có	1 day	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2080	.2.5.2.1.1.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 22/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2081	.2.5.2.1.1.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 28/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2082	3.2.5.2.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Wed 29/7/20	Thu 28/1/21	\$72,000	\$0	\$72,000												
2083	3.2.5.2.1.1.3.1		Realización de actividades según TdR	132 days	Wed 29/7/20	Thu 28/1/21	\$72,000	\$0	\$72,000	Firma Consultora											
2084	3.2.5.2.1.1.3.2		Hito 1: Diseño Técnico detallado del C3i	0 days	Thu 28/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0												
2085	3.2.5.2.1.2		SCC_40. Seguimiento Técnico de la implementación del Proyecto C3i y Red de Monitoreo	761 days	Fri 29/1/21	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0												
2086	3.2.5.2.1.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Fri 29/1/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0												
2087	3.2.5.2.1.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 29/1/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2096	.2.5.2.1.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Fri 29/1/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2123	3.2.5.2.1.3		SBCC_39. Implementación del Proyecto C3i - Desarrollo de Proyecto Ejecutivos y Términos de Referencia para Red de Dispositivos	274 days	Fri 29/1/21	Wed 16/2/22	\$0	\$0	\$0												
2124	3.2.5.2.1.3.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Fri 29/1/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0												
2125	3.2.5.2.1.3.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 29/1/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2134	.2.5.2.1.3.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Fri 29/1/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2190	3.2.5.4		SCC_41. Implementación de actividades de sensibilización y alfabetización digital	626 days	Fri 29/1/21	Fri 23/6/23	\$0	\$0	\$0												
2191	3.2.5.4.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Fri 29/1/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0												
2192	3.2.5.4.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 29/1/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2201	3.2.5.4.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Fri 29/1/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2228	4		Administración, Auditoría y Evaluación	1359 days	Fri 14/2/20	Wed 30/4/25	\$887,200	\$0	\$887,200												
2229	4.1	Adm	Administración y Auditoría SCGG	1333 days	Mon 23/3/20	Wed 30/4/25	\$451,200	\$0	\$451,200												
2230	4.1.1		Equipo Coordinador del Proyecto	1320 days	Mon 23/3/20	Fri 11/4/25	\$319,200	\$0	\$319,200												
2231	4.1.1.1	CCPPD	3CV_76. Contratación del Coordinador General del Programa	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$48,000	\$0	\$48,000												
2232	4.1.1.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2233	4.1.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2234	4.1.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2235	4.1.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2236	4.1.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2237	4.1.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2238	4.1.1.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2239	4.1.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2240	4.1.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2241	4.1.1.1.2.3		Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2242	4.1.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											

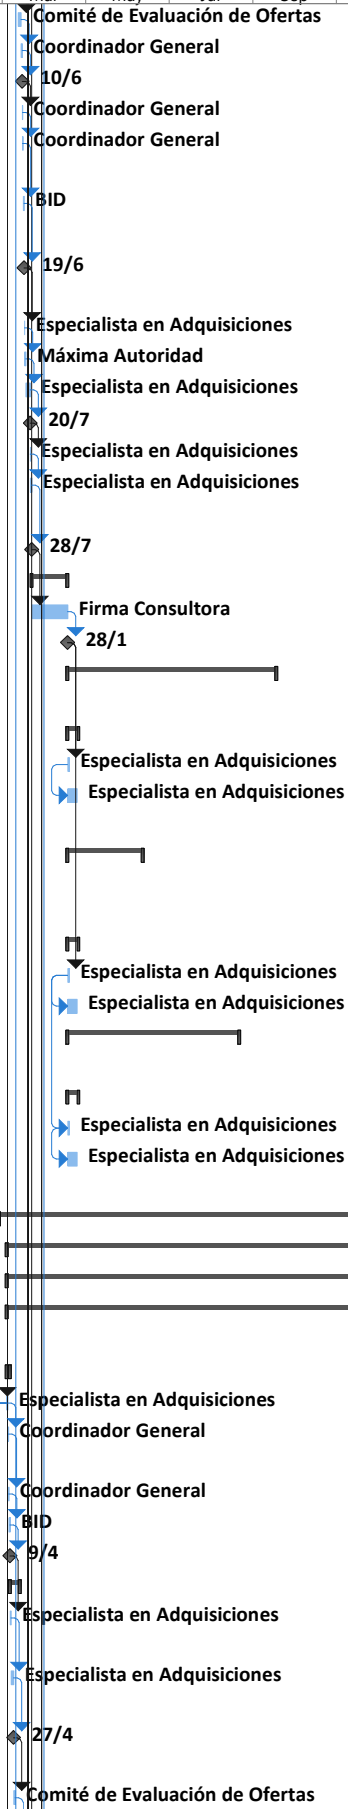

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2243	4.1.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2244	4.1.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2245	4.1.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				12/5							
2246	4.1.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2247	4.1.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2248	4.1.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2249	4.1.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad				Consultor;Máxima Autoridad							
2250	4.1.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0					29/5							
2251	4.1.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$48,000	\$0	\$48,000												
2252	4.1.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$48,000	\$0	\$48,000	Consultor											Consultor
2253	4.1.1.1.2		3CV_77. Contratación del Coordinador de Infraestructura de Conectividad	1140 days	Mon 1/6/20	Fri 11/10/24	\$36,000	\$0	\$36,000												
2254	4.1.1.1.2.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
2255	4.1.1.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2256	4.1.1.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2257	4.1.1.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2258	4.1.1.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2259	4.1.1.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				18/6							
2260	4.1.1.1.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
2261	4.1.1.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2262	4.1.1.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2263	4.1.1.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				6/7							
2264	4.1.1.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas							
2265	4.1.1.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2266	4.1.1.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2267	4.1.1.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID				21/7							
2268	4.1.1.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2269	4.1.1.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2270	4.1.1.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2271	4.1.1.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad				Consultor;Máxima Autoridad							
2272	4.1.1.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0					7/8							
2273	4.1.1.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	1090 days	Mon 10/8/20	Fri 11/10/24	\$36,000	\$0	\$36,000												
2274	4.1.1.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	1090 days	Mon 10/8/20	Fri 11/10/24	\$36,000	\$0	\$36,000	Consultor											Consultor
2275	4.1.1.1.3		3CV_78. Contratación de Apoyo técnico para el Componente 1	312 days	Mon 1/6/20	Tue 10/8/21	\$24,000	\$0	\$24,000												
2276	4.1.1.1.3.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
2277	4.1.1.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2278	4.1.1.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2279	4.1.1.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2280	4.1.1.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2281	4.1.1.1.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				18/6							
2282	4.1.1.1.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												


Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2283	4.1.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2284	4.1.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2285	4.1.1.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2286	4.1.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2287	4.1.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2288	4.1.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2289	4.1.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2290	4.1.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2291	4.1.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2292	4.1.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2293	4.1.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2294	4.1.1.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
2295	4.1.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	262 days	Mon 10/8/20	Tue 10/8/21	\$24,000	\$0	\$24,000												
2296	4.1.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	262 days	Mon 10/8/20	Tue 10/8/21	\$24,000	\$0	\$24,000	Consultor											
2297	4.1.1.4		3CV_79. Contratación del Coordinador de Economía Digital	1140 days	Mon 1/6/20	Fri 11/10/24	\$36,000	\$0	\$36,000												
2298	4.1.1.4.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
2299	4.1.1.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2300	4.1.1.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2301	4.1.1.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2302	4.1.1.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2303	4.1.1.4.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2304	4.1.1.4.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
2305	4.1.1.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2306	4.1.1.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2307	4.1.1.4.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2308	4.1.1.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2309	4.1.1.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2310	4.1.1.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2311	4.1.1.4.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2312	4.1.1.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2313	4.1.1.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2314	4.1.1.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2315	4.1.1.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2316	4.1.1.4.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
2317	4.1.1.4.3		Etapas de ejecución del contrato	1090 days	Mon 10/8/20	Fri 11/10/24	\$36,000	\$0	\$36,000												
2318	4.1.1.4.3.1		Desarrollo de los servicios	1090 days	Mon 10/8/20	Fri 11/10/24	\$36,000	\$0	\$36,000	Consultor											
2319	4.1.1.5	CCPPD	3CV_80. Contratación del Especialista en Planificación y Monitoreo	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600												
2320	4.1.1.5.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2321	4.1.1.5.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2322	4.1.1.5.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶							
2323	4.1.1.5.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶							
2324	4.1.1.5.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID				▶							
2325	4.1.1.5.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID				▶							
2326	4.1.1.5.2		Etap	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0					▶							
2327	4.1.1.5.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2328	4.1.1.5.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2329	4.1.1.5.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2330	4.1.1.5.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				▶							
2331	4.1.1.5.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶							
2332	4.1.1.5.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				▶							
2333	4.1.1.5.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				▶							
2334	4.1.1.5.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2335	4.1.1.5.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2336	4.1.1.5.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2337	4.1.1.5.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad				▶							
2338	4.1.1.5.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0					▶							
2339	4.1.1.5.3		Etap	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600					▶							
2340	4.1.1.5.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600	Consultor				▶							
2341	4.1.1.6	CCPPD	3CV_81. Contratación del Especialista Financiero	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600					▶							
2342	4.1.1.6.1		Etap	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0					▶							
2343	4.1.1.6.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2344	4.1.1.6.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶							
2345	4.1.1.6.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶							
2346	4.1.1.6.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID				▶							
2347	4.1.1.6.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID				▶							
2348	4.1.1.6.2		Etap	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0					▶							
2349	4.1.1.6.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2350	4.1.1.6.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2351	4.1.1.6.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2352	4.1.1.6.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				▶							
2353	4.1.1.6.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶							
2354	4.1.1.6.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				▶							
2355	4.1.1.6.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				▶							
2356	4.1.1.6.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2357	4.1.1.6.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							
2358	4.1.1.6.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶							

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2359	4.1.1.6.2.1.1		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2360	4.1.1.6.2.1.2		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2361	4.1.1.6.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600											
2362	4.1.1.6.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600	Consultor										
2363	4.1.1.7	CCPPD	3CV_82. Contratación del Especialista Adquisiciones	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600											
2364	4.1.1.7.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0											
2365	4.1.1.7.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2366	4.1.1.7.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2367	4.1.1.7.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2368	4.1.1.7.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2369	4.1.1.7.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2370	4.1.1.7.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2371	4.1.1.7.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2372	4.1.1.7.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2373	4.1.1.7.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2374	4.1.1.7.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2375	4.1.1.7.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2376	4.1.1.7.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2377	4.1.1.7.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2378	4.1.1.7.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2379	4.1.1.7.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2380	4.1.1.7.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2381	4.1.1.7.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2382	4.1.1.7.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2383	4.1.1.7.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600											
2384	4.1.1.7.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$33,600	\$0	\$33,600	Consultor										
2385	4.1.1.8		3CV_83. Contratación del Administrador	1270 days	Mon 1/6/20	Fri 11/4/25	\$26,400	\$0	\$26,400											
2386	4.1.1.8.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
2387	4.1.1.8.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2388	4.1.1.8.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2389	4.1.1.8.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2390	4.1.1.8.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2391	4.1.1.8.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2392	4.1.1.8.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
2393	4.1.1.8.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2394	4.1.1.8.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2395	4.1.1.8.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2396	4.1.1.8.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2397	4.1.1.8.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2398	4.1.1.8.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2399	4.1.1.8.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										

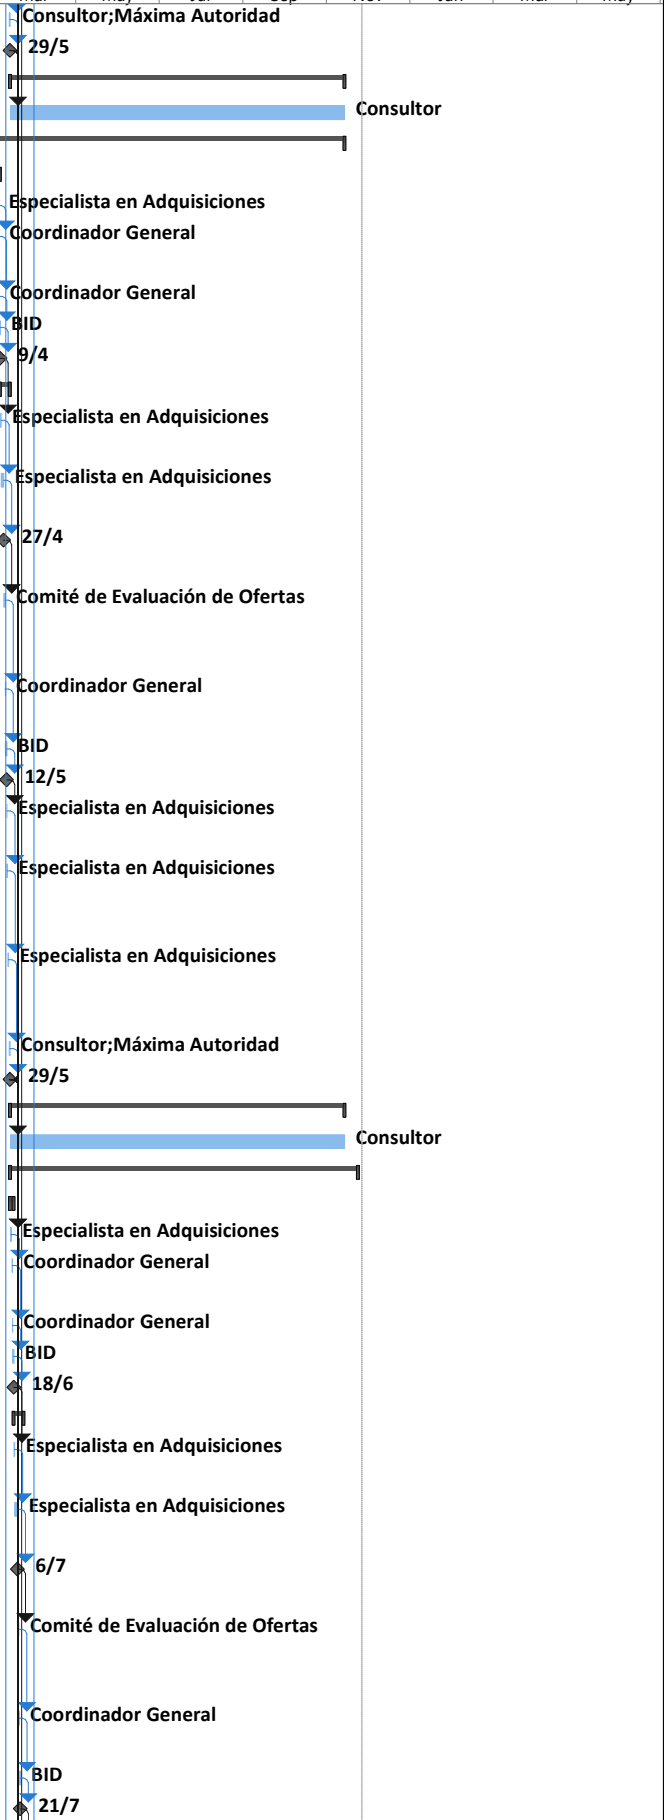

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	3rd Quarter Mar	3rd Quarter May	1st Quarter Jul	1st Quarter Sep	3rd Quarter Nov	3rd Quarter Jan	3rd Quarter Mar	1st Quarter May
2400	4.1.1.8.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2401	4.1.1.8.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2402	4.1.1.8.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2403	4.1.1.8.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2404	4.1.1.8.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
2405	4.1.1.8.3		Etapla de ejecución del contrato	1220 days	Mon 10/8/20	Fri 11/4/25	\$26,400	\$0	\$26,400											
2406	4.1.1.8.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 10/8/20	Fri 11/4/25	\$26,400	\$0	\$26,400	Consultor										
2407	4.1.1.9		3CV_84. Contratación del Apoyo fiduciario	1270 days	Mon 1/6/20	Fri 11/4/25	\$48,000	\$0	\$48,000											
2408	4.1.1.9.1		Etapla previa	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
2409	4.1.1.9.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2410	4.1.1.9.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2411	4.1.1.9.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2412	4.1.1.9.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2413	4.1.1.9.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2414	4.1.1.9.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
2415	4.1.1.9.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2416	4.1.1.9.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2417	4.1.1.9.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2418	4.1.1.9.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2419	4.1.1.9.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2420	4.1.1.9.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2421	4.1.1.9.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2422	4.1.1.9.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2423	4.1.1.9.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2424	4.1.1.9.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2425	4.1.1.9.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2426	4.1.1.9.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
2427	4.1.1.9.3		Etapla de ejecución del contrato	1220 days	Mon 10/8/20	Fri 11/4/25	\$48,000	\$0	\$48,000											
2428	4.1.1.9.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 10/8/20	Fri 11/4/25	\$48,000	\$0	\$48,000	Consultor										
2429	4.1.2		Gastos administrativos y logísticos	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$55,800	\$0	\$55,800											
2430	4.1.2.1		Servicios básicos	1208 days	Wed 17/6/20	Fri 31/1/25	\$14,400	\$0	\$14,400											
2431	4.1.2.2		LPN_19. Servicios de conexión a internet para las oficinas de la UEP de la SCGG	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$6,000	\$0	\$6,000											
2432	4.1.2.2.1		Etapla previa	28 days	Mon 1/6/20	Wed 8/7/20	\$0	\$0	\$0											
2433	4.1.2.2.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	Mon 1/6/20	Tue 2/6/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica										
2434	4.1.2.2.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	15 days	Wed 3/6/20	Tue 23/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2435	4.1.2.2.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 24/6/20	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2436	4.1.2.2.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Wed 1/7/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2437	4.1.2.2.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 2/7/20	Wed 8/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2438	4.1.2.2.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 8/7/20	Wed 8/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2439	4.1.2.2.2		Proceso de Contratación	70 days	Thu 9/7/20	Wed 14/10/20	\$0	\$0	\$0											
2440	4.1.2.2.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Thu 9/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2441	4.1.2.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de ocntrataciones				15/7							
2442	4.1.2.2.2.3		Periodo de preparación de ofertas	20 days	Thu 16/7/20	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2443	4.1.2.2.2.4		Plazo de previsión para adendas	5 days	Thu 13/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2444	4.1.2.2.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Wed 19/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				19/8							
2445	4.1.2.2.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	10 days	Thu 20/8/20	Wed 2/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2446	4.1.2.2.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 days	Thu 3/9/20	Fri 4/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2447	4.1.2.2.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Fri 4/9/20	Fri 4/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				4/9							
2448	4.1.2.2.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Mon 7/9/20	Mon 7/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2449	4.1.2.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 8/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2450	4.1.2.2.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	BID				14/9							
2451	4.1.2.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 15/9/20	Tue 15/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2452	4.1.2.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Wed 16/9/20	Fri 18/9/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2453	4.1.2.2.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 18/9/20	Fri 18/9/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				18/9							
2454	4.1.2.2.2.15		Elaboración del borrador del contrato	2 days	Mon 21/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2455	4.1.2.2.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	10 days	Wed 23/9/20	Tue 6/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2456	4.1.2.2.2.17		Contrato firmado	0 days	Tue 6/10/20	Tue 6/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				6/10							
2457	4.1.2.2.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código F	1 day	Wed 7/10/20	Wed 7/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2458	4.1.2.2.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Thu 8/10/20	Wed 14/10/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
2459	4.1.2.2.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 14/10/20	Wed 14/10/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Minist				14/10							
2460	4.1.2.2.3		Ejecución del contrato	1122 days	Thu 15/10/20	Fri 31/1/25	\$6,000	\$0	\$6,000												
2461	4.1.2.2.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	1122 days	Thu 15/10/20	Fri 31/1/25	\$6,000	\$0	\$6,000	Empresa contratada											
2462	4.1.2.3		Servicios informáticos (compra de espacio en la nube)	1122 days	Thu 15/10/20	Fri 31/1/25	\$1,800	\$0	\$1,800	Proveedor											
2463	4.1.2.4		CM_11. Adquisición de Papelería para la UEP	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$3,600	\$0	\$3,600												
2464	4.1.2.4.1		Etapas de contratación	10 days	Mon 1/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0												
2465	4.1.2.4.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2466	4.1.2.4.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 8/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2467	4.1.2.4.2		Ejecución del contrato	1210 days	Mon 15/6/20	Fri 31/1/25	\$3,600	\$0	\$3,600												
2468	4.1.2.4.2.1		Provisión de mobiliario	1210 days	Mon 15/6/20	Fri 31/1/25	\$3,600	\$0	\$3,600	Proveedor											
2469	4.1.2.5		CM_12. Adquisición de equipamiento informático para la UCGP	76 days	Mon 1/6/20	Mon 14/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000												
2470	4.1.2.5.1		Etapas de contratación	10 days	Mon 1/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0												
2471	4.1.2.5.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2472	4.1.2.5.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 8/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2473	4.1.2.5.2		Ejecución del contrato	66 days	Mon 15/6/20	Mon 14/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000												
2474	4.1.2.5.2.1		Provisión de mobiliario	66 days	Mon 15/6/20	Mon 14/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000	Proveedor											
2475	4.1.2.6		LP_15. Adquisición de mobiliario para la UCGP	136 days	Mon 1/6/20	Mon 7/12/20	\$12,000	\$0	\$12,000												
2476	4.1.2.6.1		Etapas previas	22 days	Mon 1/6/20	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0												
2477	4.1.2.6.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	Mon 1/6/20	Tue 2/6/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
2478	4.1.2.6.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	15 days	Wed 3/6/20	Tue 23/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2479	4.1.2.6.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 24/6/20	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2480	4.1.2.6.1.4		DDL elaborados	0 days	Tue 30/6/20	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				30/6							
2481	4.1.2.6.2		Proceso de Contratación	48 days	Wed 1/7/20	Fri 4/9/20	\$0	\$0	\$0												
2482	4.1.2.6.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	3 days	Wed 1/7/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2483	4.1.2.6.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 3/7/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de ocntrataciones				3/7							
2484	4.1.2.6.2.3		Periodo de preparación de ofertas	14 days	Mon 6/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2485	4.1.2.6.2.4		Plazo de previsión para adendas	3 days	Fri 24/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2486	4.1.2.6.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Tue 28/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				28/7							
2487	4.1.2.6.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Wed 29/7/20	Tue 4/8/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2488	4.1.2.6.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 days	Wed 5/8/20	Thu 6/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2489	4.1.2.6.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 6/8/20	Thu 6/8/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				6/8							
2490	4.1.2.6.2.9		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2491	4.1.2.6.2.10		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Mon 10/8/20	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2492	4.1.2.6.2.11		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 12/8/20	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				12/8							
2493	4.1.2.6.2.12		Elaboración del borrador del contrato	2 days	Thu 13/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2494	4.1.2.6.2.13		Tramitación de la firma del Contrato	10 days	Mon 17/8/20	Fri 28/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2495	4.1.2.6.2.14		Contrato firmado	0 days	Fri 28/8/20	Fri 28/8/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				28/8							
2496	4.1.2.6.2.15		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Mon 31/8/20	Fri 4/9/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2497	4.1.2.6.2.16		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 4/9/20	Fri 4/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Minist				4/9							
2498	4.1.2.6.3		Ejecución del contrato	66 days	Mon 7/9/20	Mon 7/12/20	\$12,000	\$0	\$12,000												
2499	4.1.2.6.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	66 days	Mon 7/9/20	Mon 7/12/20	\$12,000	\$0	\$12,000	Empresa											
2501	4.1.3		Otros gastos	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$46,200	\$0	\$46,200												
2502	4.1.4		Auditoría	1283 days	Mon 1/6/20	Wed 30/4/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2503	4.1.4.1		SCC_42. Servicios de auditoría externa para la UEP-SCGG	1283 days	Mon 1/6/20	Wed 30/4/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2504	4.1.4.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 1/6/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0												
2505	4.1.4.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2506	4.1.4.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2507	4.1.4.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2508	4.1.4.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0												
2509	4.1.4.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2510	4.1.4.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2511	4.1.4.1.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 18/6/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2512	4.1.4.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 2/7/20	Thu 2/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2513	4.1.4.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 3/7/20	Thu 9/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2514	4.1.4.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/6/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2515	4.1.4.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2516	4.1.4.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 16/7/20	Thu 16/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2517	4.1.4.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 17/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2518	4.1.4.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2519	4.1.4.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 24/7/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0												
2520	4.1.4.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 24/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2521	4.1.4.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 30/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2522	4.1.4.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 31/7/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2523	4.1.4.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 31/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2524	4.1.4.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2525	4.1.4.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 15/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2526	4.1.4.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 17/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2527	4.1.4.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 18/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2528	4.1.4.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2529	4.1.4.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2530	4.1.4.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2531	4.1.4.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2532	4.1.4.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 1/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2533	4.1.4.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2534	4.1.4.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 6/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2535	4.1.4.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 12/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co											
2536	4.1.4.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 13/10/20	Tue 13/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2537	4.1.4.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 14/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato											
2538	4.1.4.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2539	4.1.4.1.3		Ejecución del contrato	1181 days	Wed 21/10/20	Wed 30/4/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2540	4.1.4.1.3.1		Realización de actividades según TdR	1181 days	Wed 21/10/20	Wed 30/4/25	\$30,000	\$0	\$30,000	Firma Consultora											
2541	4.2	Adm	Administración y Auditoría SEFIN	1160 days	Mon 23/3/20	Fri 30/8/24	\$118,000	\$0	\$118,000												
2542	4.2.1		Equipo Coordinador del Proyecto	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$108,000	\$0	\$108,000												
2543	4.2.1.1		3CV_85. Contratación del Especialista de Adquisiciones - SEFIN	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$30,000	\$0	\$30,000												

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2544	4.2.1.1.1		Etapla previa	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0											
2545	4.2.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2546	4.2.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2547	4.2.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2548	4.2.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2549	4.2.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2550	4.2.1.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2551	4.2.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2552	4.2.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2553	4.2.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2554	4.2.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2555	4.2.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2556	4.2.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2557	4.2.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2558	4.2.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2559	4.2.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2560	4.2.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2561	4.2.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2562	4.2.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2563	4.2.1.1.3		Etapla de ejecución del contrato	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$30,000	\$0	\$30,000											
2564	4.2.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor										
2565	4.2.1.2		3CV_86. Contratación del Especialista Financiero - SEFIN	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$30,000	\$0	\$30,000											
2566	4.2.1.2.1		Etapla previa	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0											
2567	4.2.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2568	4.2.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2569	4.2.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2570	4.2.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2571	4.2.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2572	4.2.1.2.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2573	4.2.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2574	4.2.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2575	4.2.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2576	4.2.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2577	4.2.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2578	4.2.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2579	4.2.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2580	4.2.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2581	4.2.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2582	4.2.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2583	4.2.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2584	4.2.1.2.2.12		<i>Contrato firmado</i>	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2585	4.2.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$30,000	\$0	\$30,000												
2586	4.2.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor											
2587	4.2.1.3		3CV_87. Contratación del Esp. Planificación y Monitoreo - SEFIN	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$24,000	\$0	\$24,000												
2588	4.2.1.3.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2589	4.2.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2590	4.2.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2591	4.2.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2592	4.2.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2593	4.2.1.3.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2594	4.2.1.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2595	4.2.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2596	4.2.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2597	4.2.1.3.2.3		<i>Acta de cierre de recepción de postulaciones elaborada</i>	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2598	4.2.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2599	4.2.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2600	4.2.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2601	4.2.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2602	4.2.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2603	4.2.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2604	4.2.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2605	4.2.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2606	4.2.1.3.2.12		<i>Contrato firmado</i>	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2607	4.2.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$24,000	\$0	\$24,000												
2608	4.2.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$24,000	\$0	\$24,000	Consultor											
2609	4.2.1.4		3CV_88. Especialista en Aseguramiento de la Calidad Técnica	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$24,000	\$0	\$24,000												
2610	4.2.1.4.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2611	4.2.1.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2612	4.2.1.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2613	4.2.1.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2614	4.2.1.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2615	4.2.1.4.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2616	4.2.1.4.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2617	4.2.1.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2618	4.2.1.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2619	4.2.1.4.2.3		<i>Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones</i>	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2620	4.2.1.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2621	4.2.1.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2622	4.2.1.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2623	4.2.1.4.2.7		No Objeción a la seleccón de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				12/5							
2624	4.2.1.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2625	4.2.1.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2626	4.2.1.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2627	4.2.1.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad				Consultor;Máxima Autoridad							
2628	4.2.1.4.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0					29/5							
2629	4.2.1.4.3		Etapas de ejecución del contrato	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$24,000	\$0	\$24,000												
2630	4.2.1.4.3.1		Desarrollo de los servicios	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$24,000	\$0	\$24,000	Consultor				Consultor							
2631	4.2.2		Auditoría	1110 days	Mon 1/6/20	Fri 30/8/24	\$10,000	\$0	\$10,000												
2632	4.2.2.1		SCC_43. Servicios de auditoría externa para la SEFIN	1110 days	Mon 1/6/20	Fri 30/8/24	\$10,000	\$0	\$10,000												
2633	4.2.2.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 1/6/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0												
2634	4.2.2.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2635	4.2.2.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2636	4.2.2.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2637	4.2.2.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0					15/6							
2638	4.2.2.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2639	4.2.2.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones				17/6							
2640	4.2.2.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 18/6/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora				Firma Consultora							
2641	4.2.2.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 2/7/20	Thu 2/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora				Firma Consultora							
2642	4.2.2.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 3/7/20	Thu 9/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2643	4.2.2.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/6/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2644	4.2.2.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				15/7							
2645	4.2.2.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 16/7/20	Thu 16/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2646	4.2.2.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 17/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2647	4.2.2.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID				23/7							
2648	4.2.2.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 24/7/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0												
2649	4.2.2.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 24/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2650	4.2.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 30/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones				30/7							
2651	4.2.2.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 31/7/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES				OFERENTES							
2652	4.2.2.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 31/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				31/8							
2653	4.2.2.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas							
2654	4.2.2.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 15/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2655	4.2.2.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 17/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				17/9							
2656	4.2.2.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 18/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2657	4.2.2.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2658	4.2.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2659	4.2.2.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID				29/9							
2660	4.2.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2661	4.2.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 1/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				Máxima Autoridad							
2662	4.2.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				5/10							
2663	4.2.2.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 6/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2664	4.2.2.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 12/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co				12/10							

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202


ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2665	4.2.2.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 13/10/20	Tue 13/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2666	4.2.2.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 14/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato											
2667	4.2.2.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2668	4.2.2.1.3		Ejecución del contrato	1008 days	Wed 21/10/20	Fri 30/8/24	\$10,000	\$0	\$10,000												
2669	4.2.2.1.3.1		Realización de actividades según TdR	1008 days	Wed 21/10/20	Fri 30/8/24	\$10,000	\$0	\$10,000	Firma Consultora											
2670	4.3	Adm	Administración y Auditoría ASPS	1359 days	Fri 14/2/20	Wed 30/4/25	\$218,000	\$0	\$218,000												
2671	4.3.1		Equipo Coordinador del Proyecto	1296 days	Fri 14/2/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2672	4.3.1.1		Designación del Gerente de Competitividad como Coordinador del Proyecto	1 day	Fri 14/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0												
2673	4.3.1.2		3CV_89. Contratación del Especialista de Adquisiciones	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2674	4.3.1.2.1		Etapas previa	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2675	4.3.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2676	4.3.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2677	4.3.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2678	4.3.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2679	4.3.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2680	4.3.1.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2681	4.3.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2682	4.3.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2683	4.3.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2684	4.3.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2685	4.3.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2686	4.3.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2687	4.3.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2688	4.3.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2689	4.3.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2690	4.3.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2691	4.3.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2692	4.3.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2693	4.3.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2694	4.3.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor											
2695	4.3.1.3		3CV_90. Contratación del Especialista Financiero	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2696	4.3.1.3.1		Etapas previa	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2697	4.3.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2698	4.3.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2699	4.3.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2700	4.3.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2701	4.3.1.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2702	4.3.1.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2703	4.3.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2704	4.3.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2705	4.3.1.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				27/4							
2706	4.3.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2707	4.3.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2708	4.3.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2709	4.3.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2710	4.3.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2711	4.3.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2712	4.3.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2713	4.3.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2714	4.3.1.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2715	4.3.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2716	4.3.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor											
2761	4.3.1.6		3CV_93. Contratación del Especialista de Planificación y Monitoreo	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2762	4.3.1.6.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2763	4.3.1.6.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2764	4.3.1.6.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2765	4.3.1.6.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2766	4.3.1.6.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2767	4.3.1.6.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2768	4.3.1.6.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2769	4.3.1.6.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2770	4.3.1.6.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2771	4.3.1.6.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2772	4.3.1.6.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2773	4.3.1.6.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2774	4.3.1.6.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2775	4.3.1.6.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2776	4.3.1.6.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2777	4.3.1.6.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2778	4.3.1.6.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2779	4.3.1.6.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2780	4.3.1.6.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2781	4.3.1.6.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2782	4.3.1.6.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor											
2783	4.3.1.7		3CV_94. Contratación del Especialista Economía Digital	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000												
2784	4.3.1.7.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2785	4.3.1.7.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2786	4.3.1.7.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2787	4.3.1.7.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											





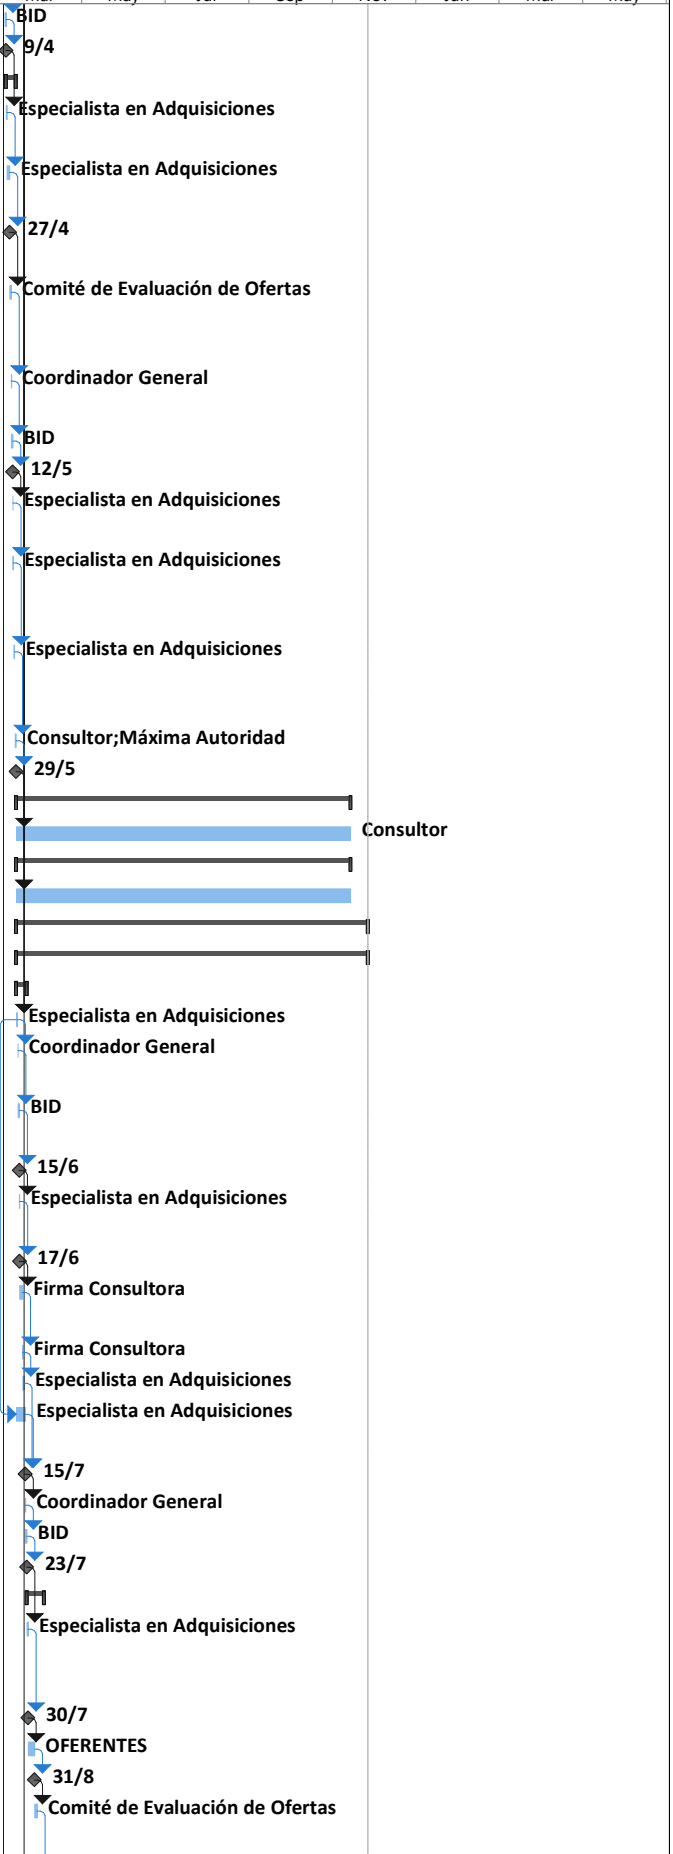













Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2788	4.3.1.7.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2789	4.3.1.7.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2790	4.3.1.7.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2791	4.3.1.7.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2792	4.3.1.7.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2793	4.3.1.7.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2794	4.3.1.7.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2795	4.3.1.7.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2796	4.3.1.7.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2797	4.3.1.7.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2798	4.3.1.7.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2799	4.3.1.7.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2800	4.3.1.7.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2801	4.3.1.7.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2802	4.3.1.7.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2803	4.3.1.7.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000											
2804	4.3.1.7.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor										
2827	4.3.2		Gastos administrativos y logísticos	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$48,000	\$0	\$48,000											
2828	4.3.2.1		Gastos Administrativos	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$48,000	\$0	\$48,000											
2829	4.3.3		Auditoría	1283 days	Mon 1/6/20	Wed 30/4/25	\$20,000	\$0	\$20,000											
2830	4.3.3.1		SCC_44. Servicios de auditoría externa para la ASPS	1283 days	Mon 1/6/20	Wed 30/4/25	\$20,000	\$0	\$20,000											
2831	4.3.3.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 1/6/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0											
2832	4.3.3.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2833	4.3.3.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2834	4.3.3.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2835	4.3.3.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0											
2836	4.3.3.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2837	4.3.3.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
2838	4.3.3.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 18/6/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
2839	4.3.3.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 2/7/20	Thu 2/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
2840	4.3.3.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 3/7/20	Thu 9/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2841	4.3.3.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/6/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2842	4.3.3.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2843	4.3.3.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 16/7/20	Thu 16/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2844	4.3.3.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 17/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2845	4.3.3.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2846	4.3.3.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 24/7/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0											
2847	4.3.3.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 24/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2848	4.3.3.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 30/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
2849	4.3.3.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 31/7/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
2850	4.3.3.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 31/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2851	4.3.3.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										



Plan Operativo Año 1 del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	Contrap. (Munic.) Año 1	TOTAL Año 1	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
2852	4.3.3.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 15/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2853	4.3.3.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 17/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				17/9							
2854	4.3.3.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 18/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2855	4.3.3.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2856	4.3.3.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2857	4.3.3.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID				29/9							
2858	4.3.3.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2859	4.3.3.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 1/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				Máxima Autoridad							
2860	4.3.3.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				5/10							
2861	4.3.3.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 6/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2862	4.3.3.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 12/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co				12/10							
2863	4.3.3.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 13/10/20	Tue 13/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2864	4.3.3.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 14/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato				Administrador de contrato							
2865	4.3.3.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				20/10							
2866	4.3.3.1.3		Ejecución del contrato	1181 days	Wed 21/10/20	Wed 30/4/25	\$20,000	\$0	\$20,000												
2867	4.3.3.1.3.1		Realización de actividades según TdR	1181 days	Wed 21/10/20	Wed 30/4/25	\$20,000	\$0	\$20,000	Firma Consultora											
2868	4.4	Adm	Evaluación del Programa	1196 days	Mon 1/6/20	Mon 30/12/24	\$100,000	\$0	\$100,000												
2983	4.4.4		Levantamiento de línea de base de evaluación de impacto y asignación aleatoria de centros educativos de tratamiento	132 days	Mon 1/6/20	Tue 1/12/20	\$100,000	\$0	\$100,000	Firma Consultora				Firma Consultora							
2984	5		Gestión de Riesgos	1460 days	Mon 1/7/19	Fri 31/1/25	\$0	\$0	\$0												
2986	5.2	GRP - Act. #1.8	Se fortalecerá la coordinación entre las áreas técnicas y fiduciarias de las unidades ejecutoras. Para las compras más complejas se contratarán asesorías para que acompañen el proceso.	1010 days	Fri 14/2/20	Thu 28/12/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador de cada unidad ejecutora				Coordinador de cada unidad ejecutora							
2988	5.4	GRP - Act. #1.14	Se velará porque los honorarios tengan un nivel competitivo. Los organismos ejucutor y coejecutores realizarán búsquedas tempranas de potenciales candidatos para la conformación de ternas o designación.	394 days	Mon 1/7/19	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	DPTMGD;Gerencia de Competitividad de la ASPS y Subsecretaría de Finanzas y				DPTMGD;Gerencia de Competitividad de la ASPS y Subsecretaría de							
2989	5.5	GRP - Act. #1.16	Apoyo a la DPTMGD por medio de una asistencia técnica, en la etapa de cumplimiento de condiciones previas, para definir posiciones y perfiles, a ser validados por el BID, seleccionar al equipo de la UCGP y dar cumplimiento a otras condiciones previas	220 days	Fri 14/2/20	Thu 17/12/20	\$0	\$0	\$0	BID;DPTMGD				BID;DPTMGD							
2990	5.6	GRP - Act. #1.17	Creación formal de las UEP en cada entidad, asignando todas las competencias requeridas para la ejecución del Programa; desarrollando manuales operativos y de procedimientos que regulen el funcionamiento	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0	BID;DPTMGD				BID;DPTMGD							
2991	5.7	GRP - Act. #1.18	Diseñar convenios e instrumentos que definan los roles, las responsabilidades, mecanismos de coordinación y protocolos de gestión principales entre la UCGP y las entidades beneficiarias del programa	230 days	Fri 14/2/20	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	BID;DPTMGD				BID;DPTMGD							

Proyecto: HO-L1202_POA Año 1 Fecha: Tue 22/10/19	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	
